

夢洲関連部会及びワーキングにおける R 6 年度の取り組みについて

令和 6 年 6 月 19 日
大阪市建設局

夢洲関連部会及びワーキングの取組みについて（R6年2月以降）

■埋設調整部会

○取組状況

	第20回	第21回	第22回
日時	R6. 3. 6	R6. 4. 19	R6. 6. 4

○取組内容

- ・ 埋設管路の離隔詳細協議など

■工程調整部会

○取組状況

	第24回	第25回	第26回
日時	R6. 3. 6	R6. 4. 19	R6. 6. 4

○取組内容

- ・ 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整
- ・ 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況

	第40回	第41回	第42回	第43回
日時	R6. 2. 27	R6. 3. 26	R6. 4. 23	R6. 5. 28


○取組内容

- ・ 安全推進協議会の実施(労働基準監督署による現地視察、講義)
- ・ 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
- ・ 工事車両運行時のルール共有など

○各工事の進捗状況


- 道路工事に先行して実施した本体埋設管路工事については、令和6年5月末で完了
- 令和6年度は、観光外周道路内で鉄道施設やIR事業用地に必要な引き込み管路工事を9月末までに完了し、車道舗装を11月より開始する予定
- 万博会場の準備や工期終盤における工事車両の増加に対応するため、令和6年9月末完成予定の(仮称)夢洲北高架橋について、更なる工程の前倒しの検討を行い、令和6年7月末完成を目指す
- インフラ施設の整備については、令和6年12月末完成予定であるが、工事業者間の工程調整等を行いつつ、安全に配慮して進めることで、1日も早い完成を目指していく

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

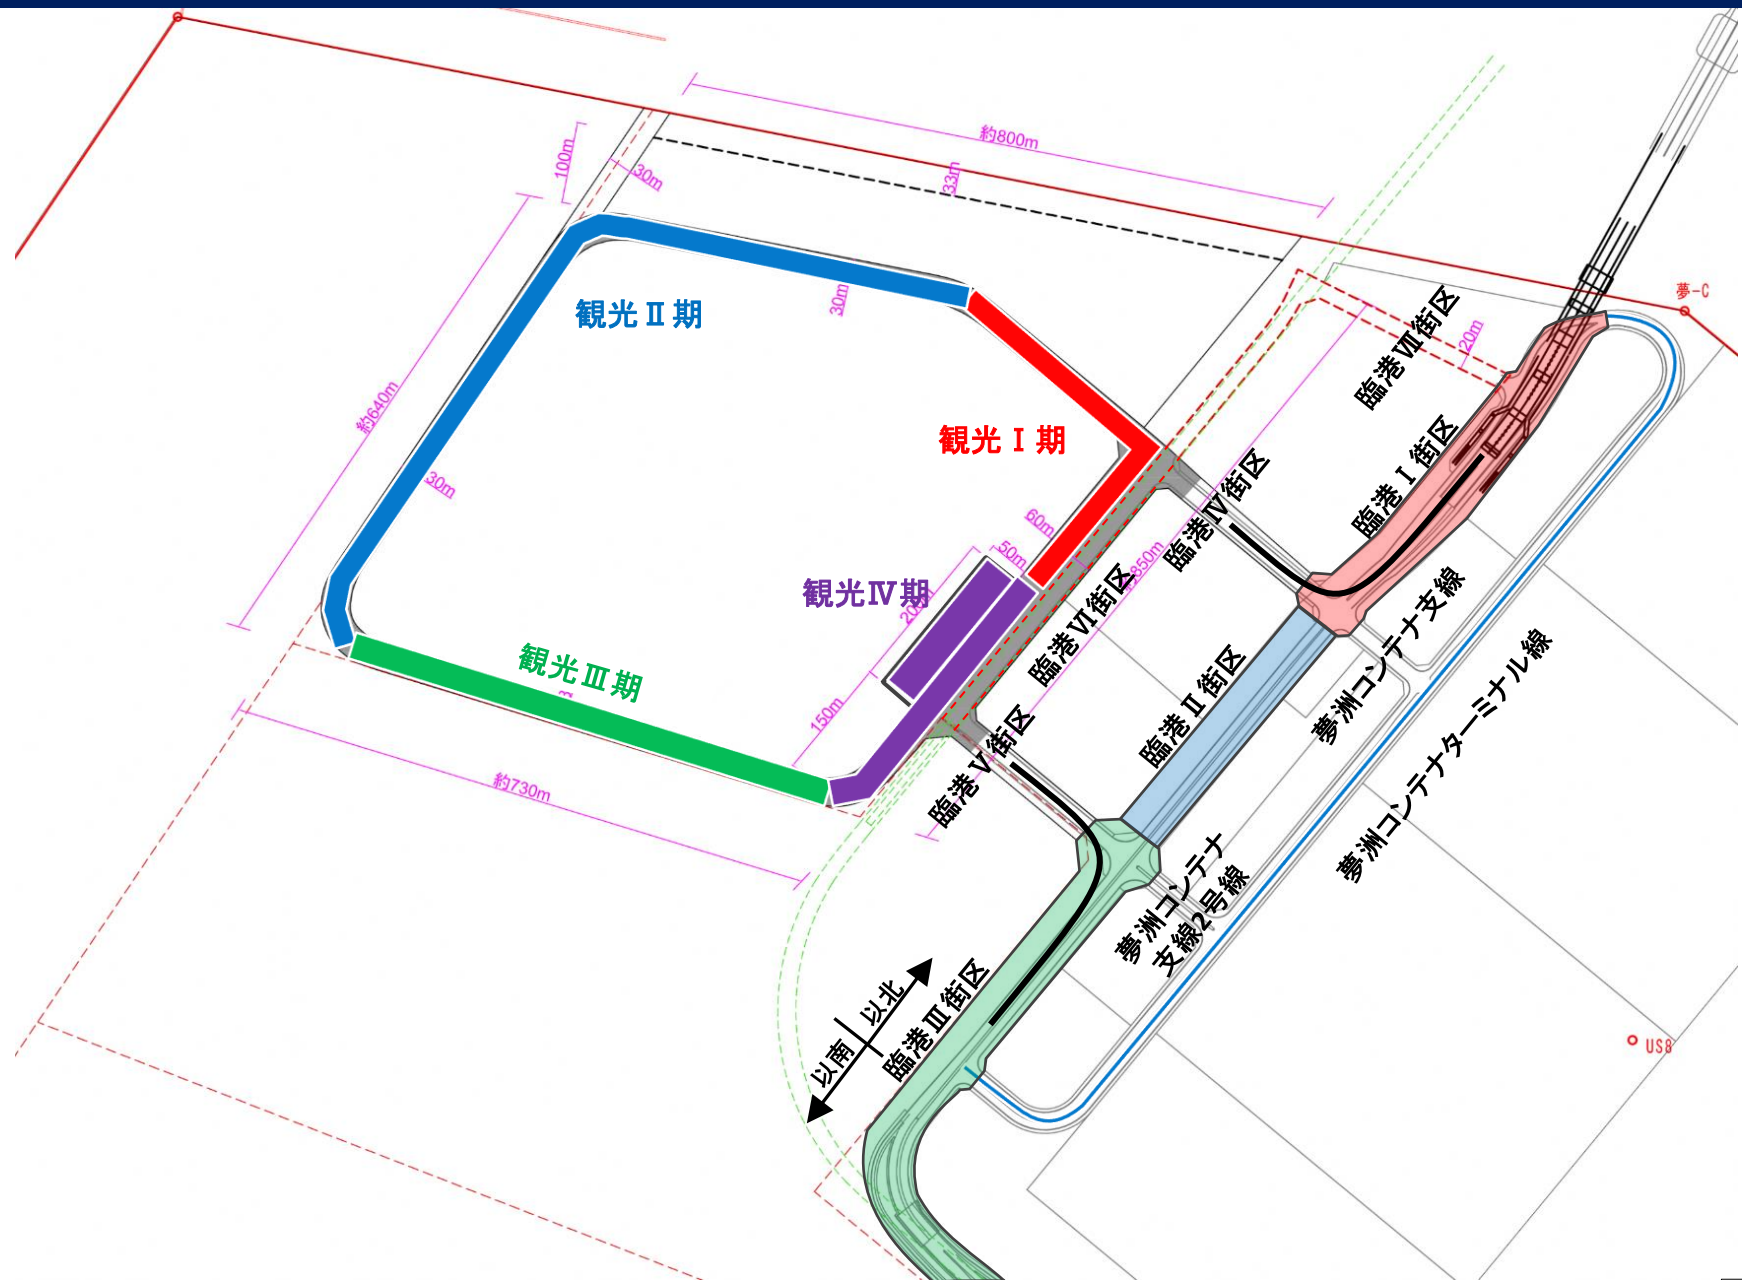


※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

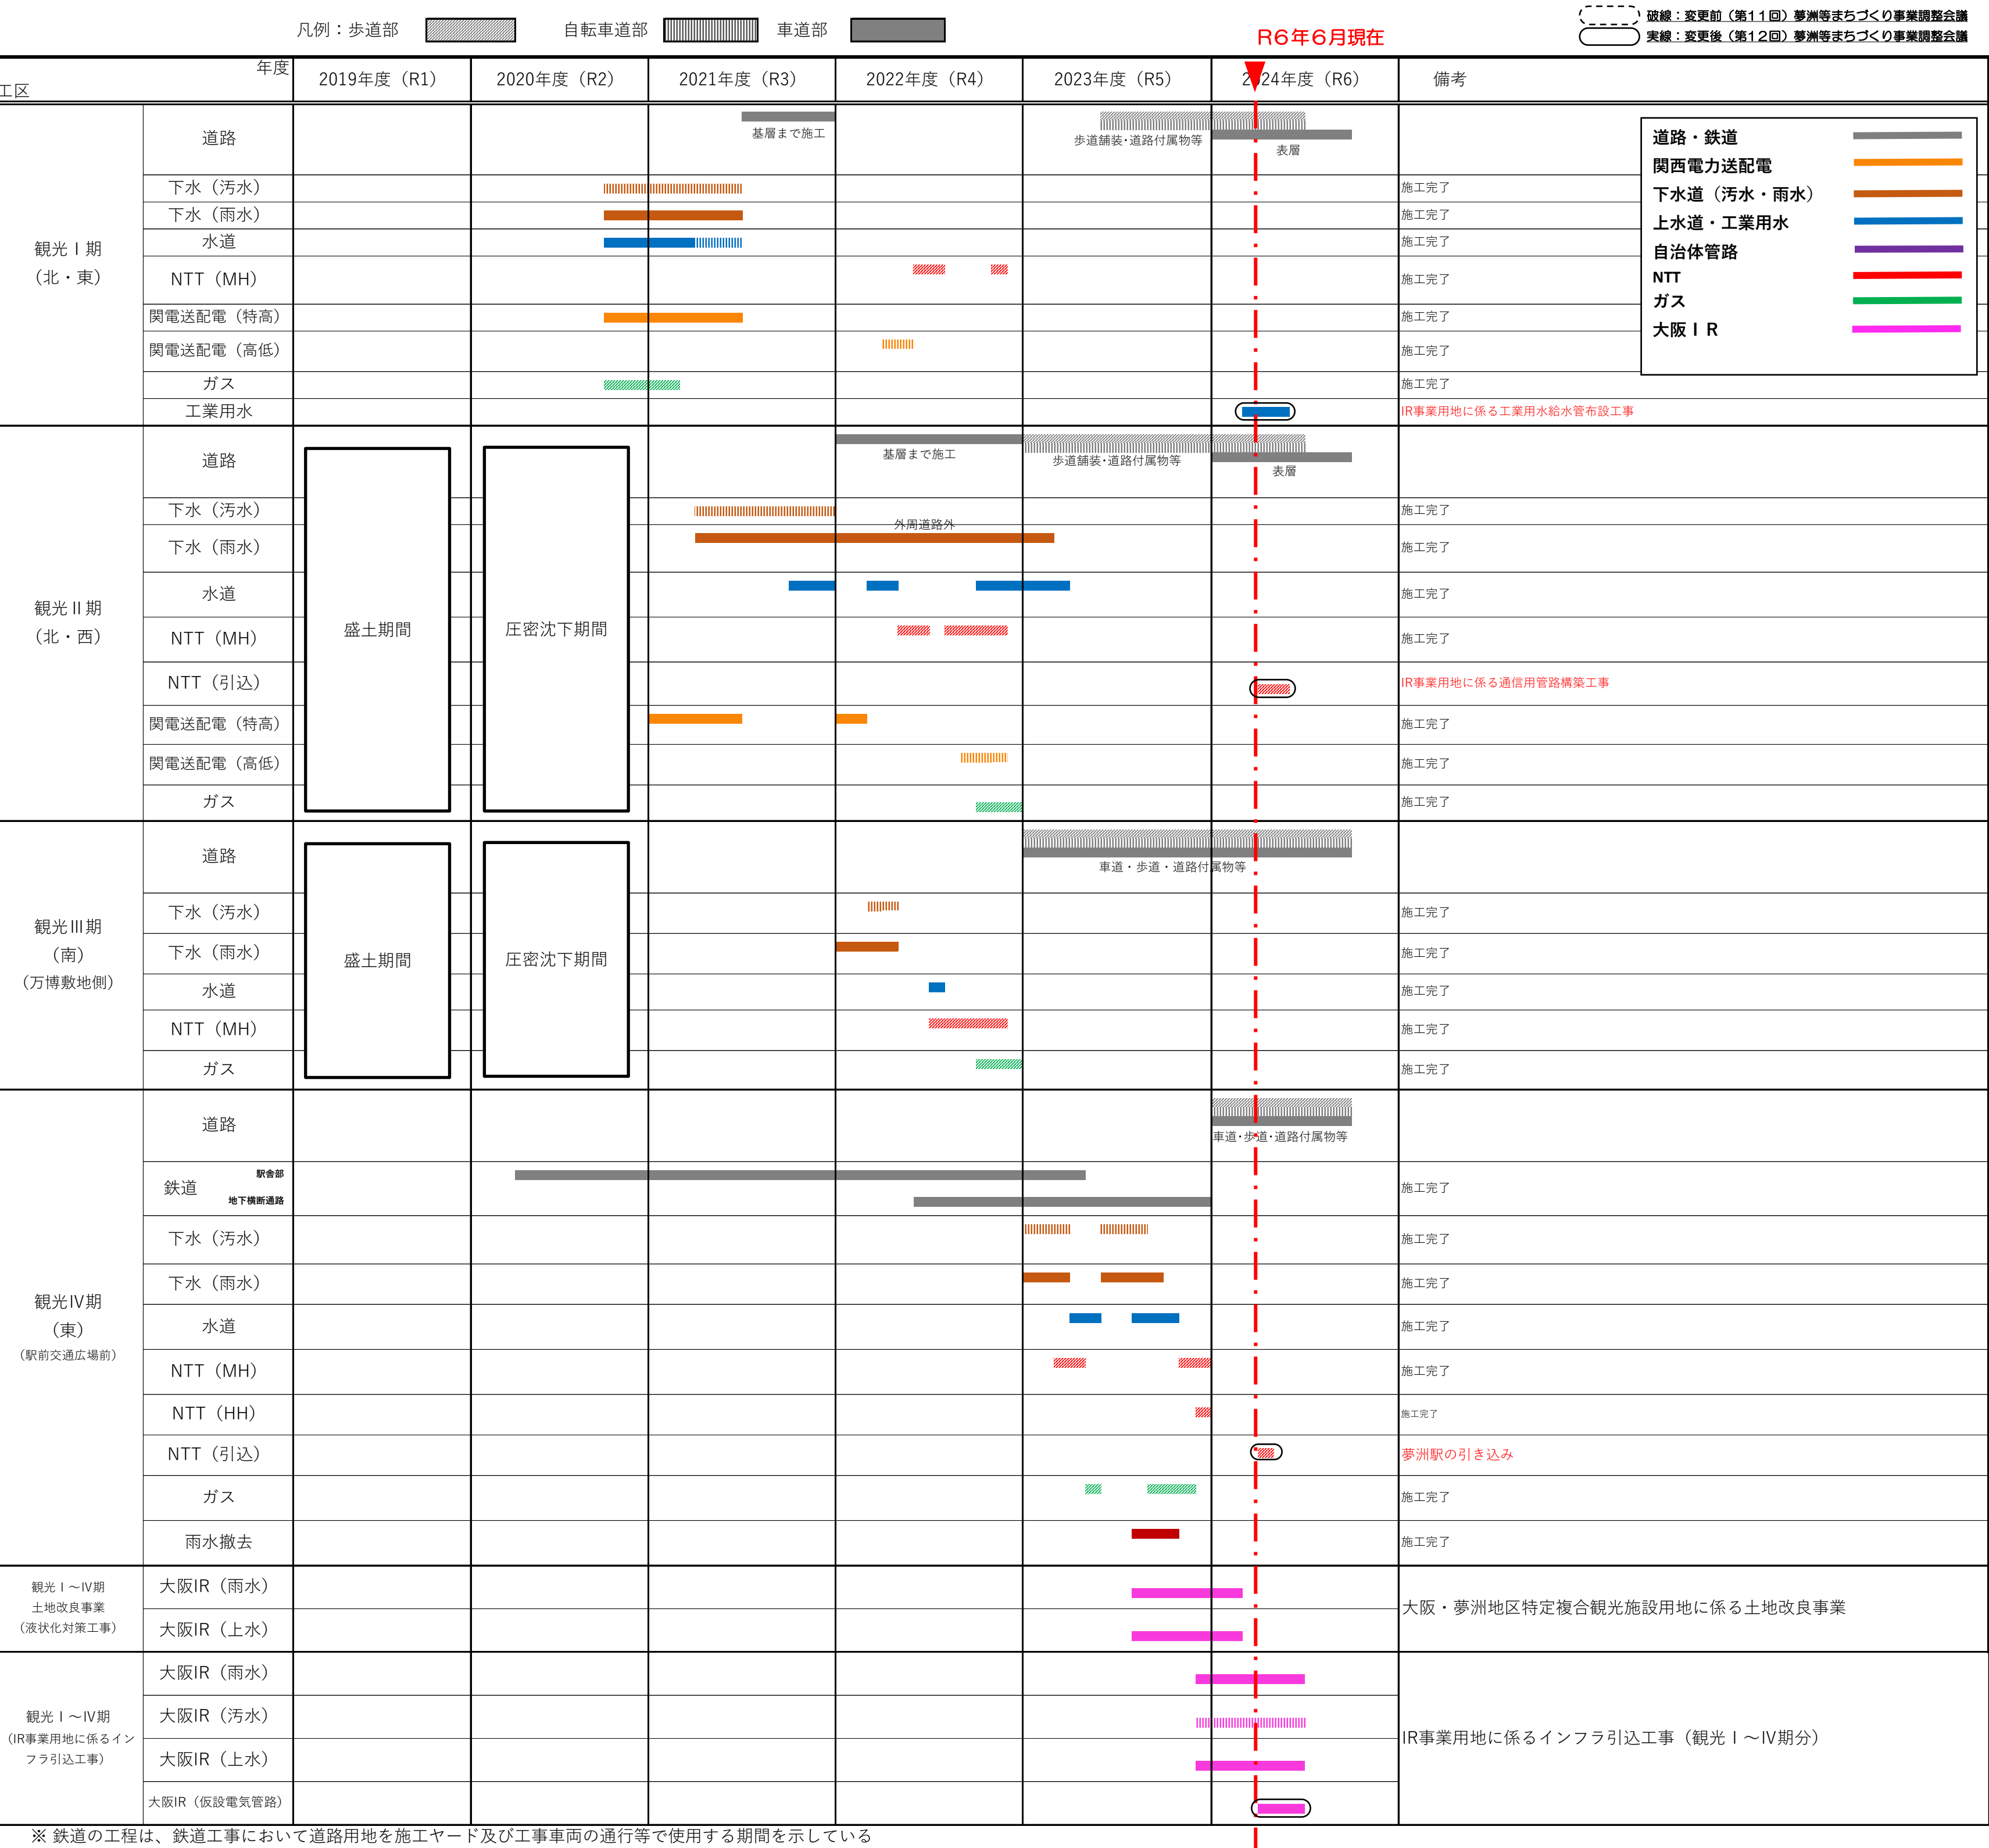


※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

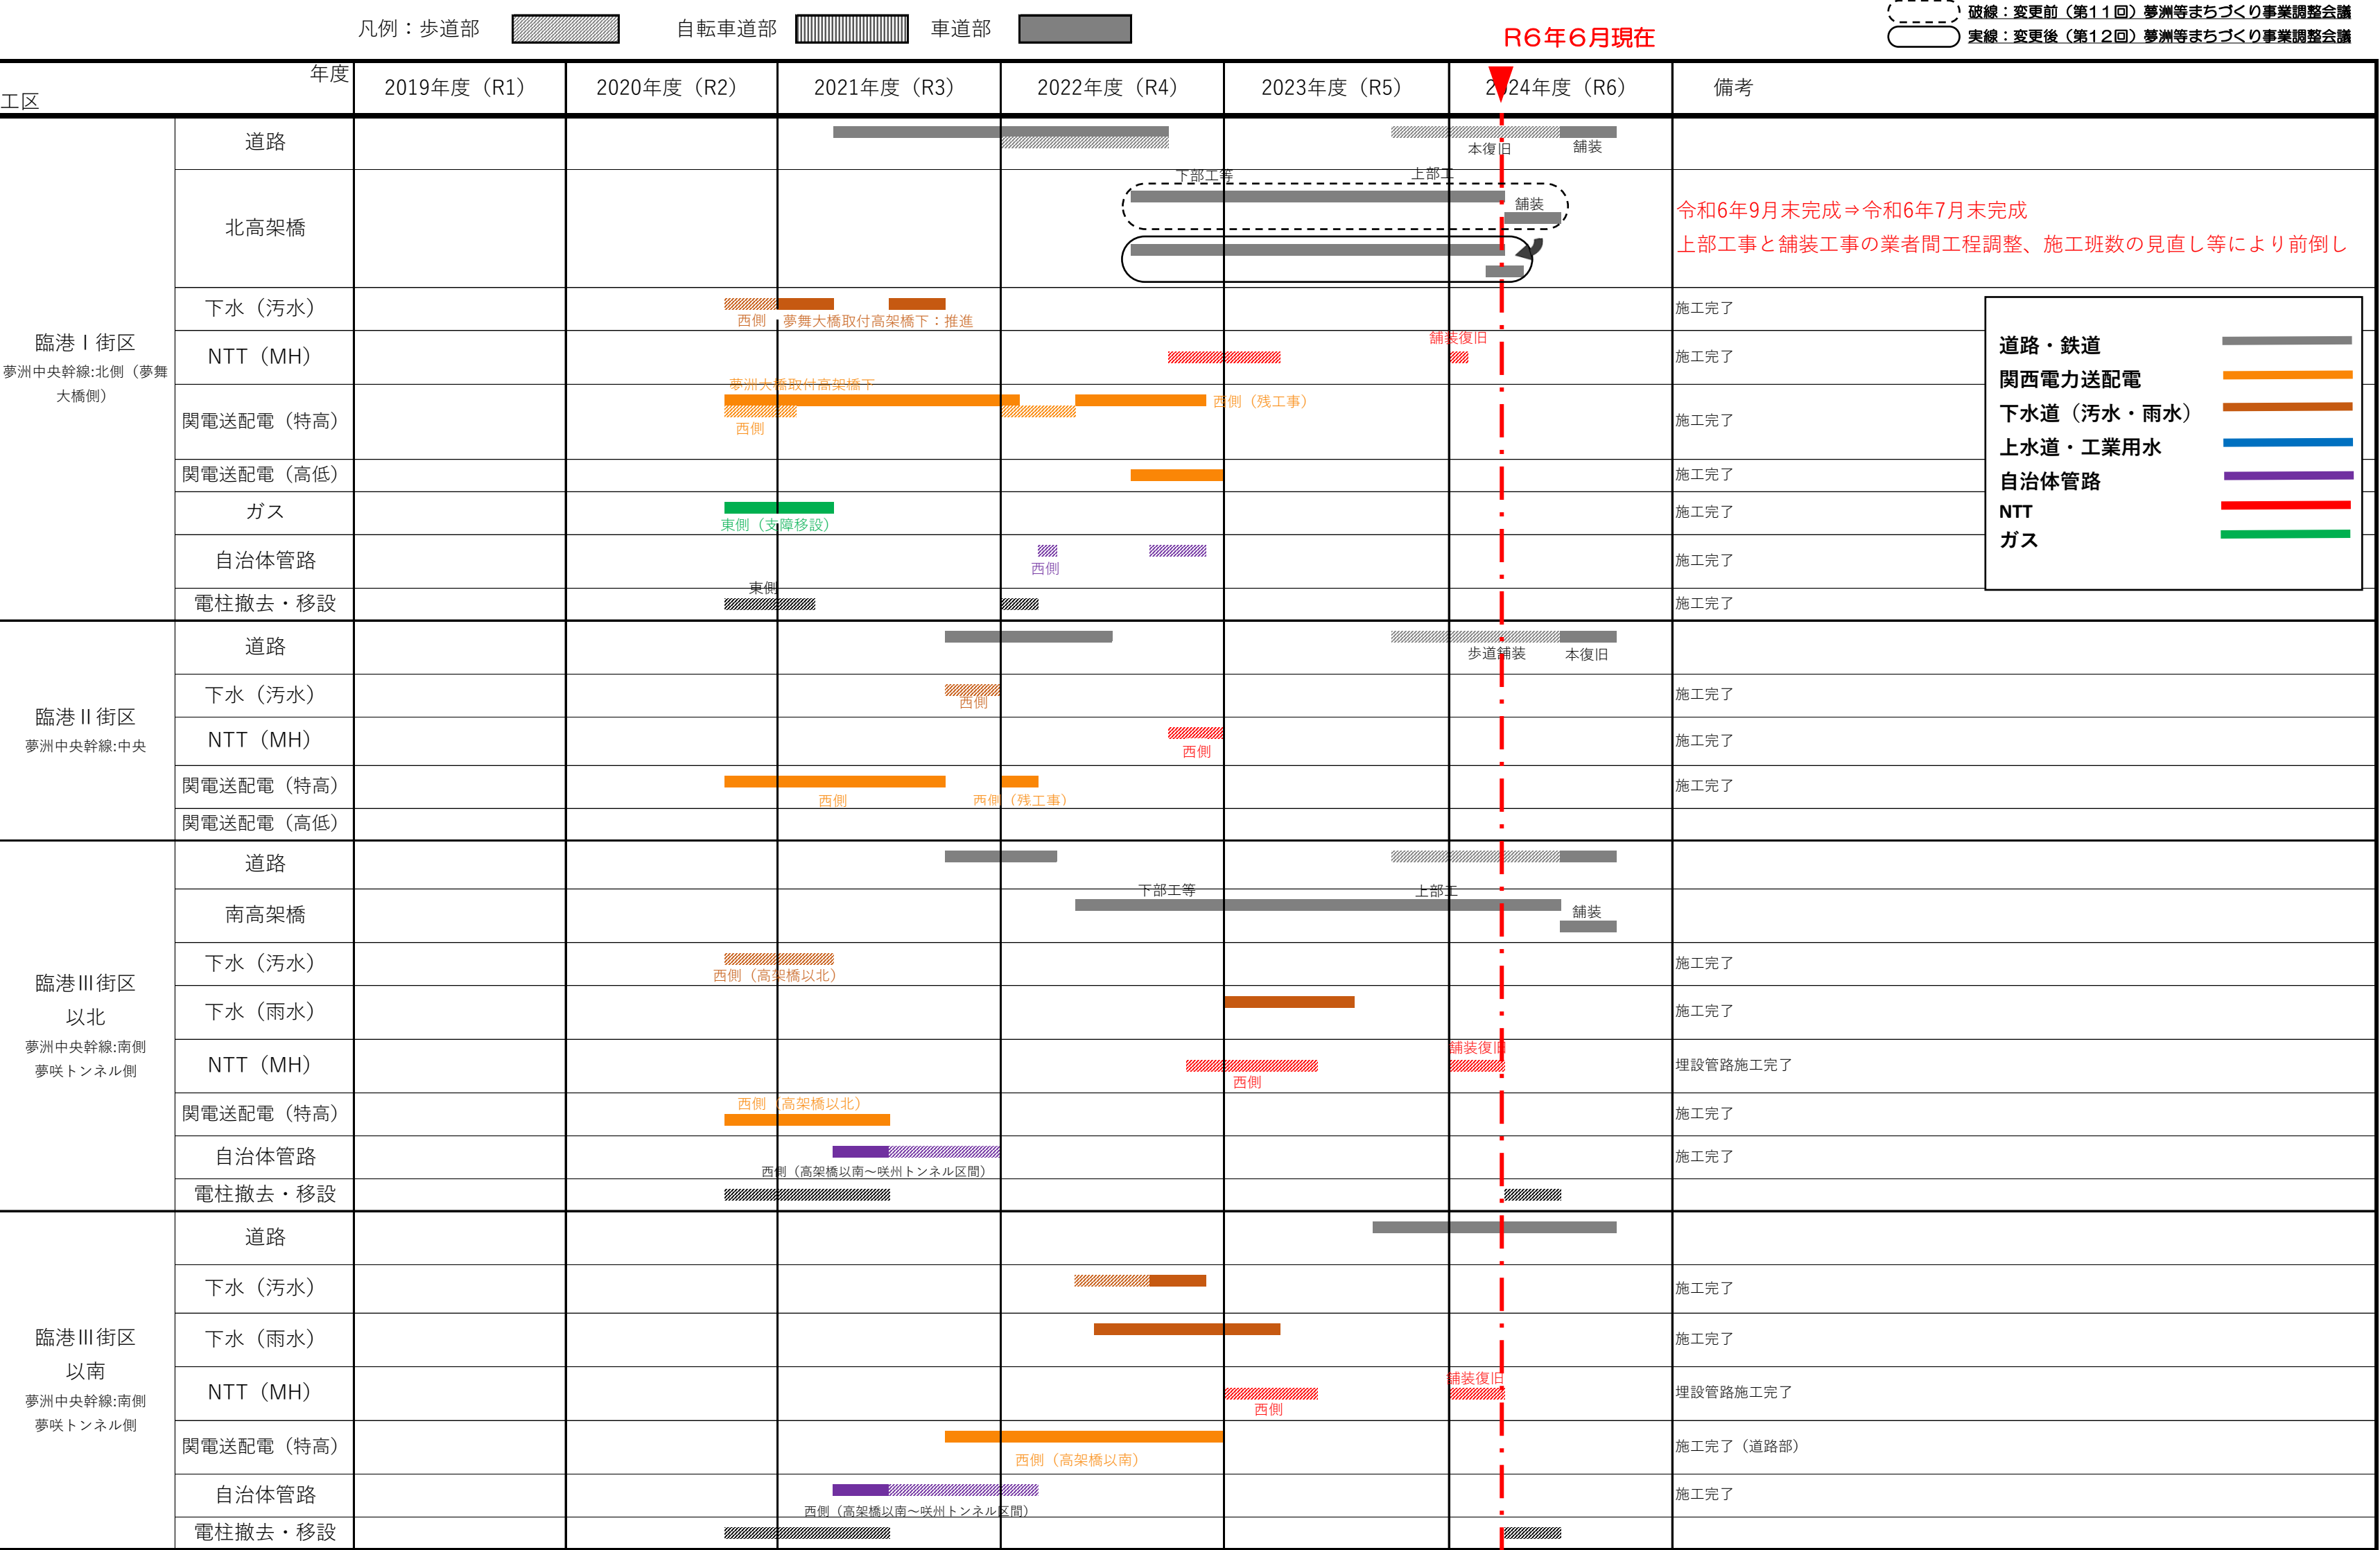


夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

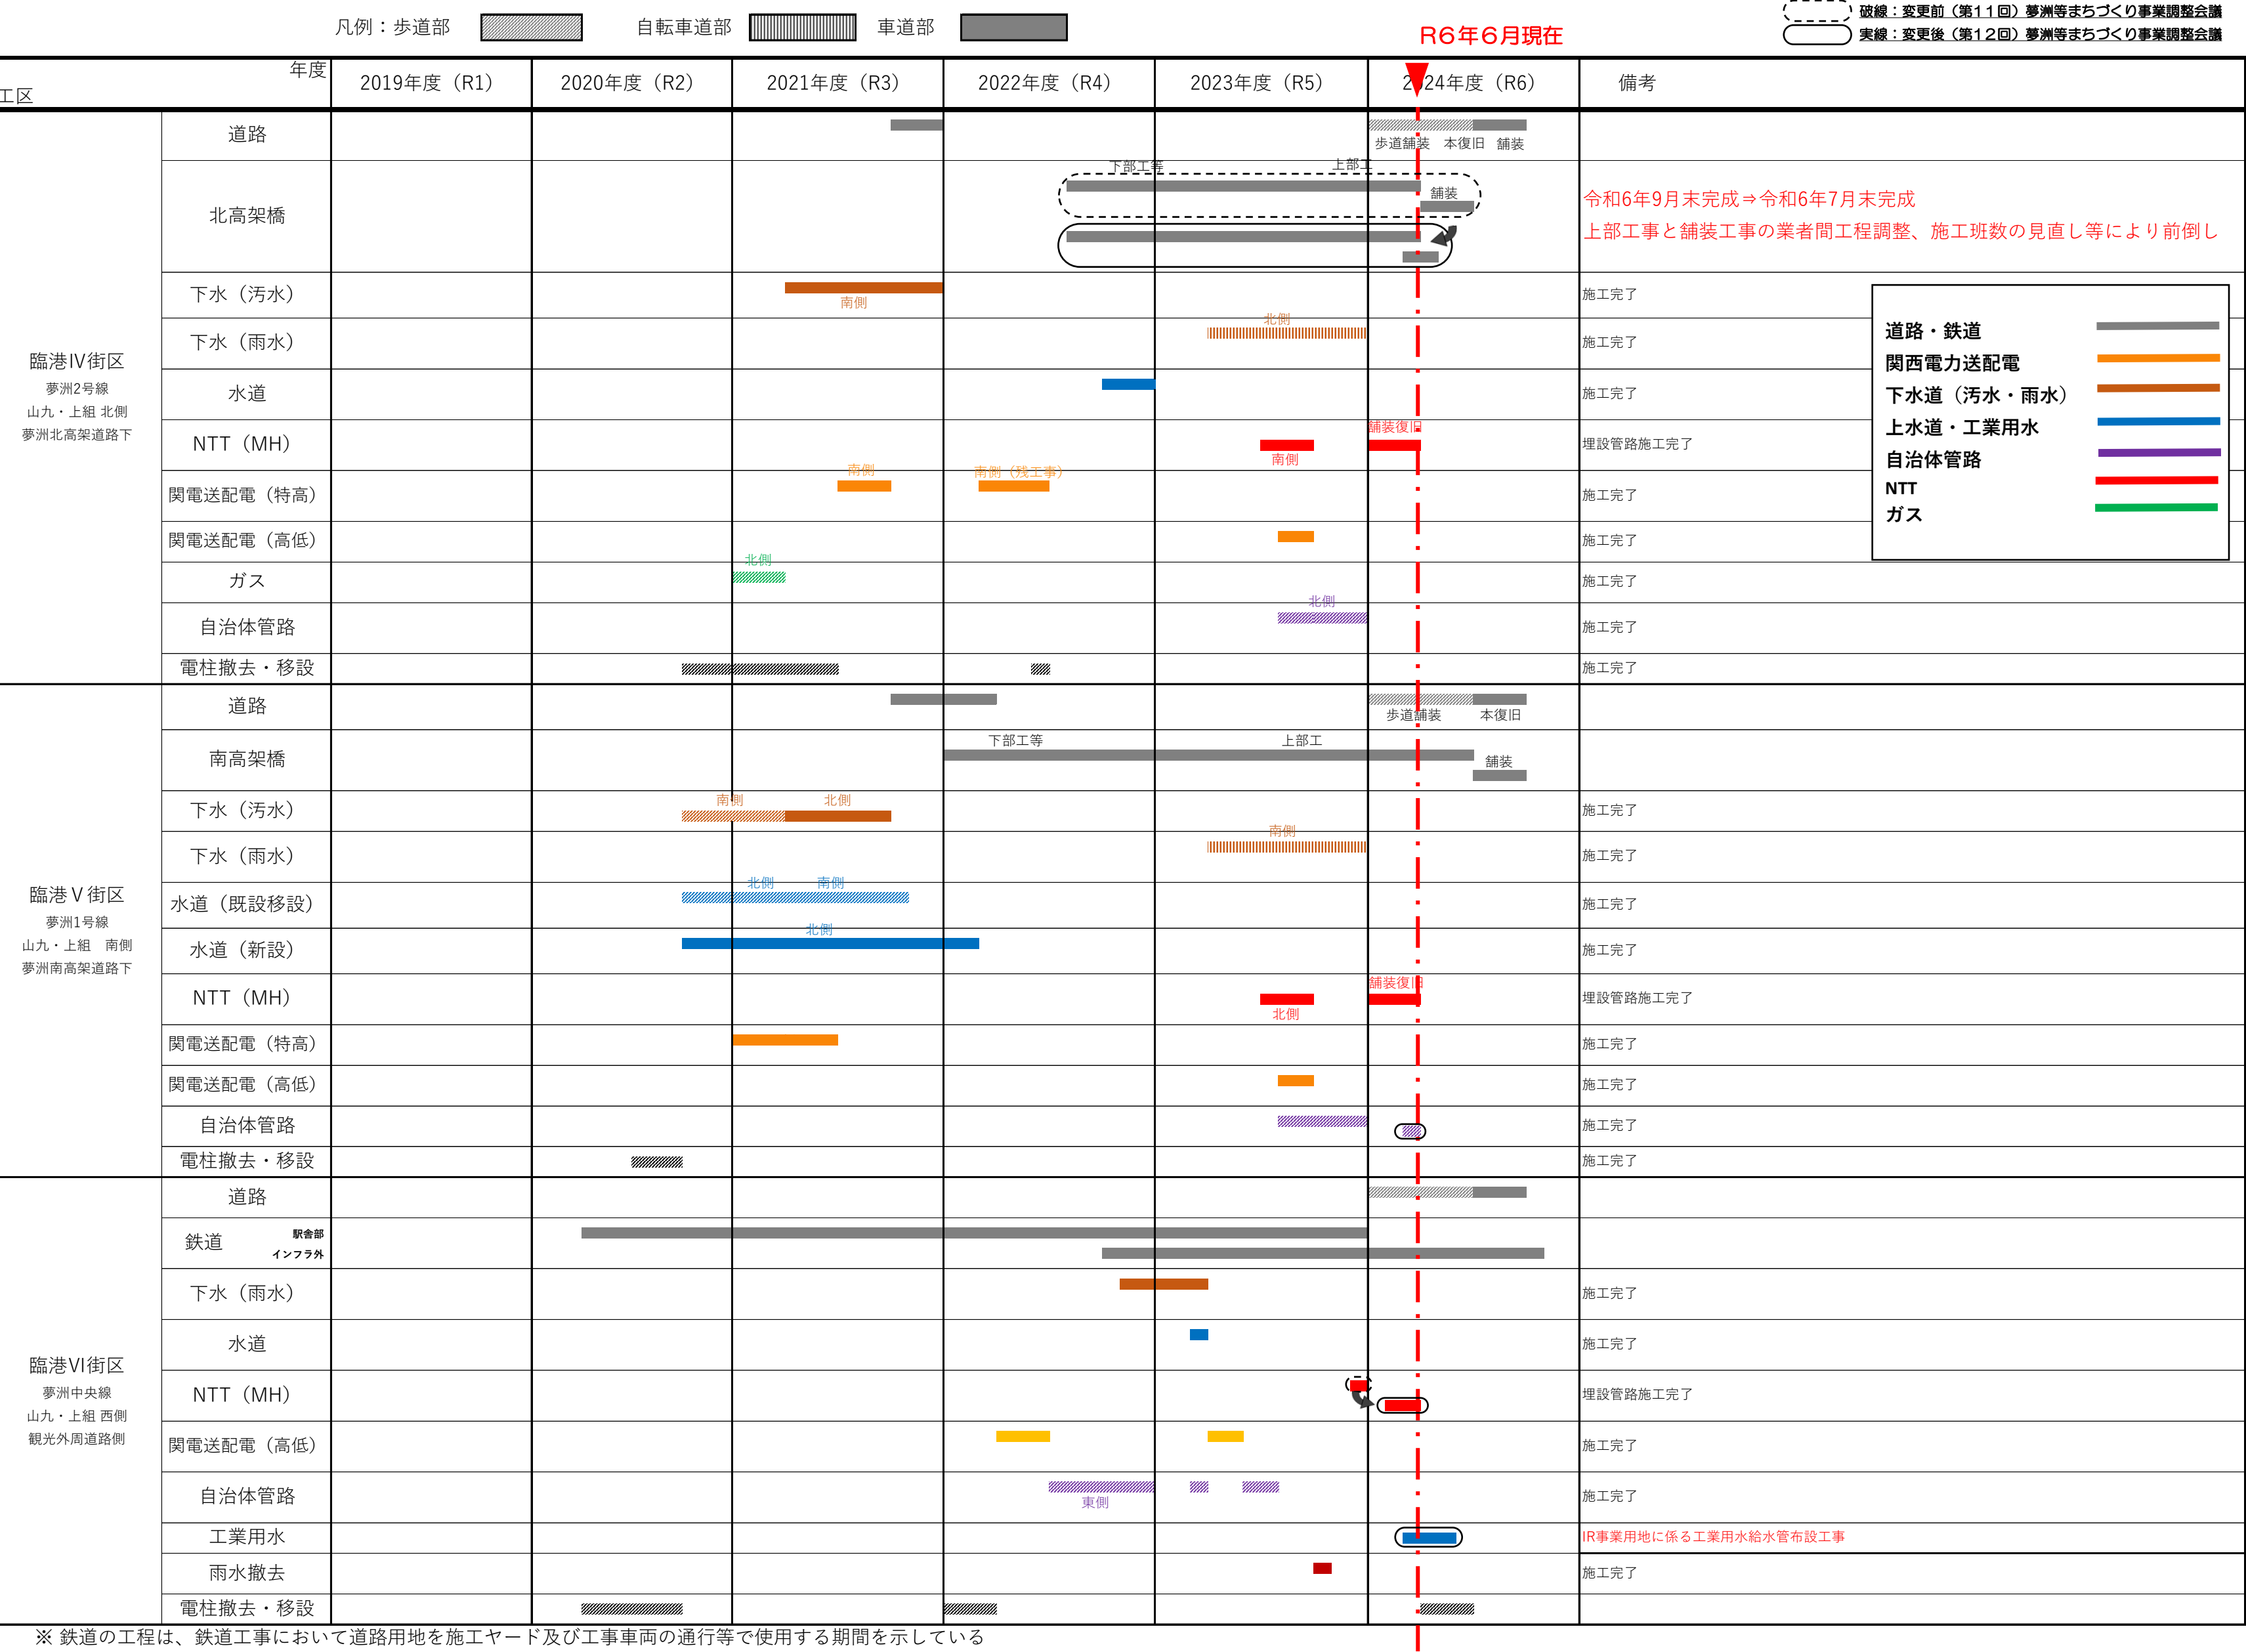


※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

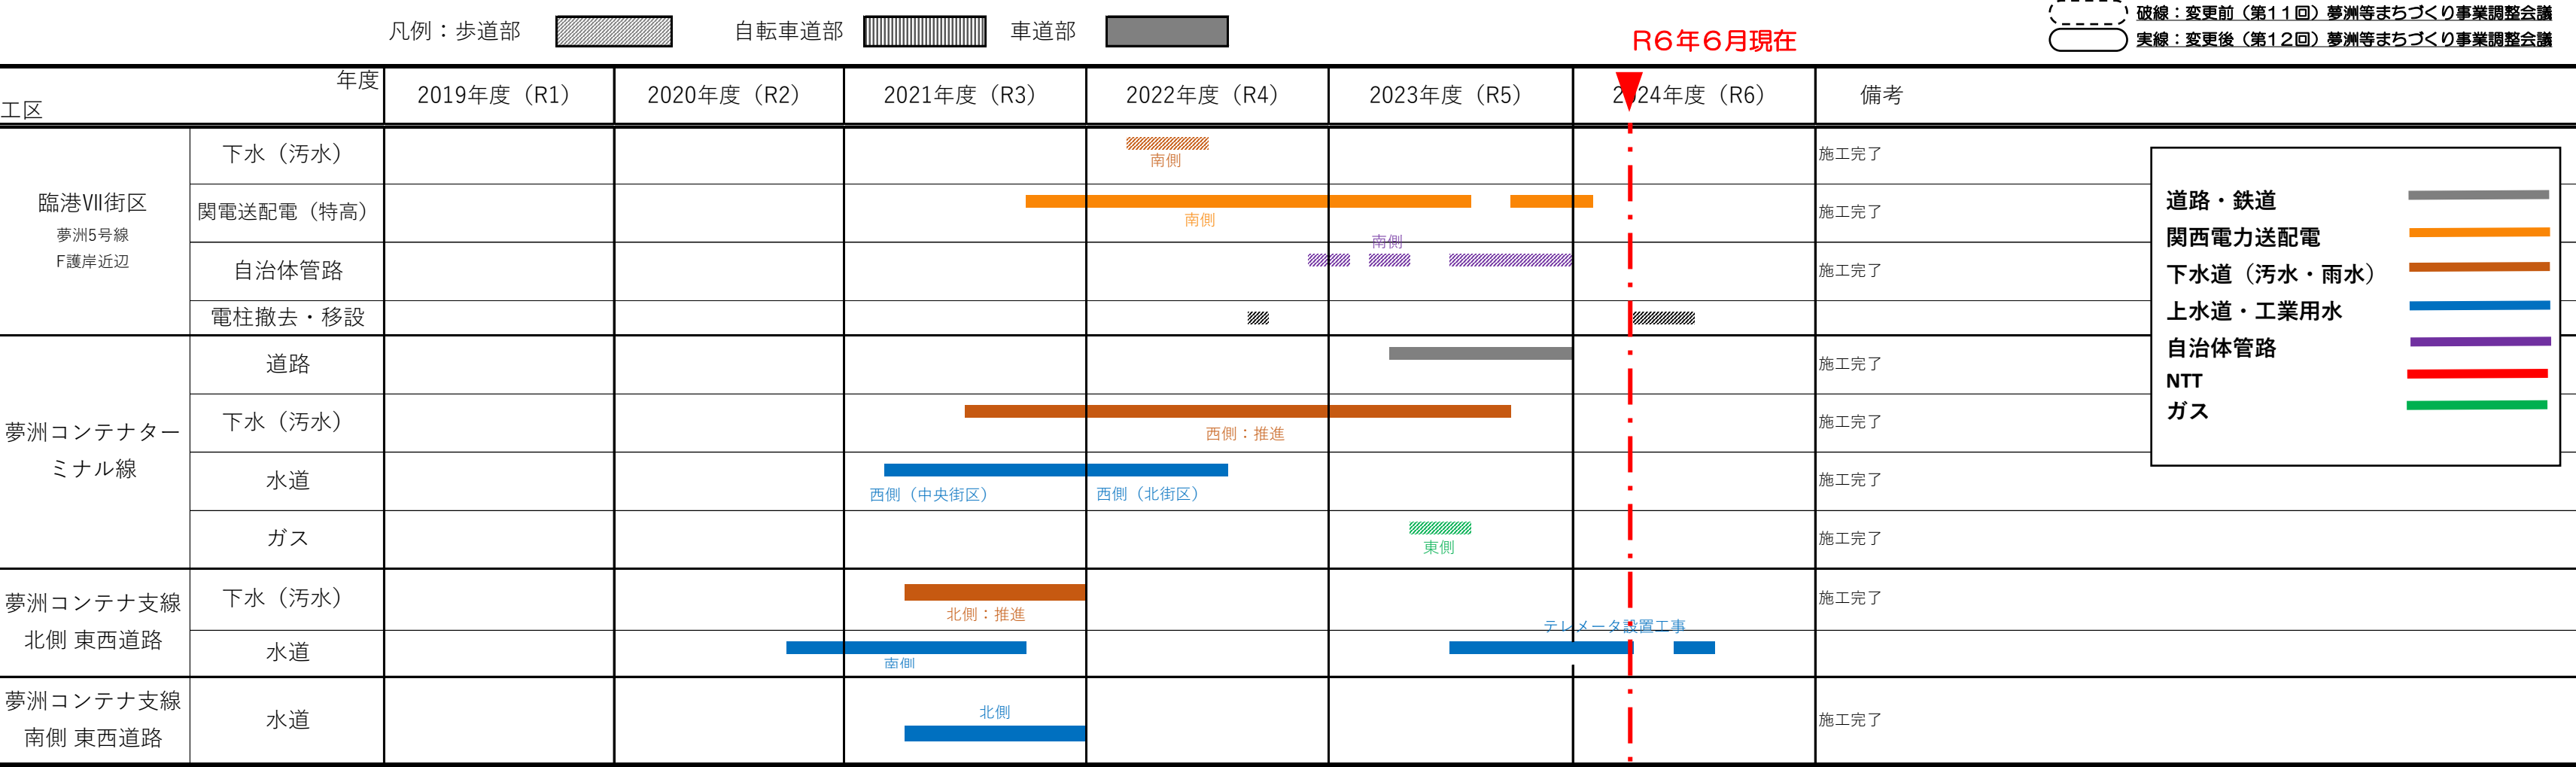

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事） ～整備箇所図～

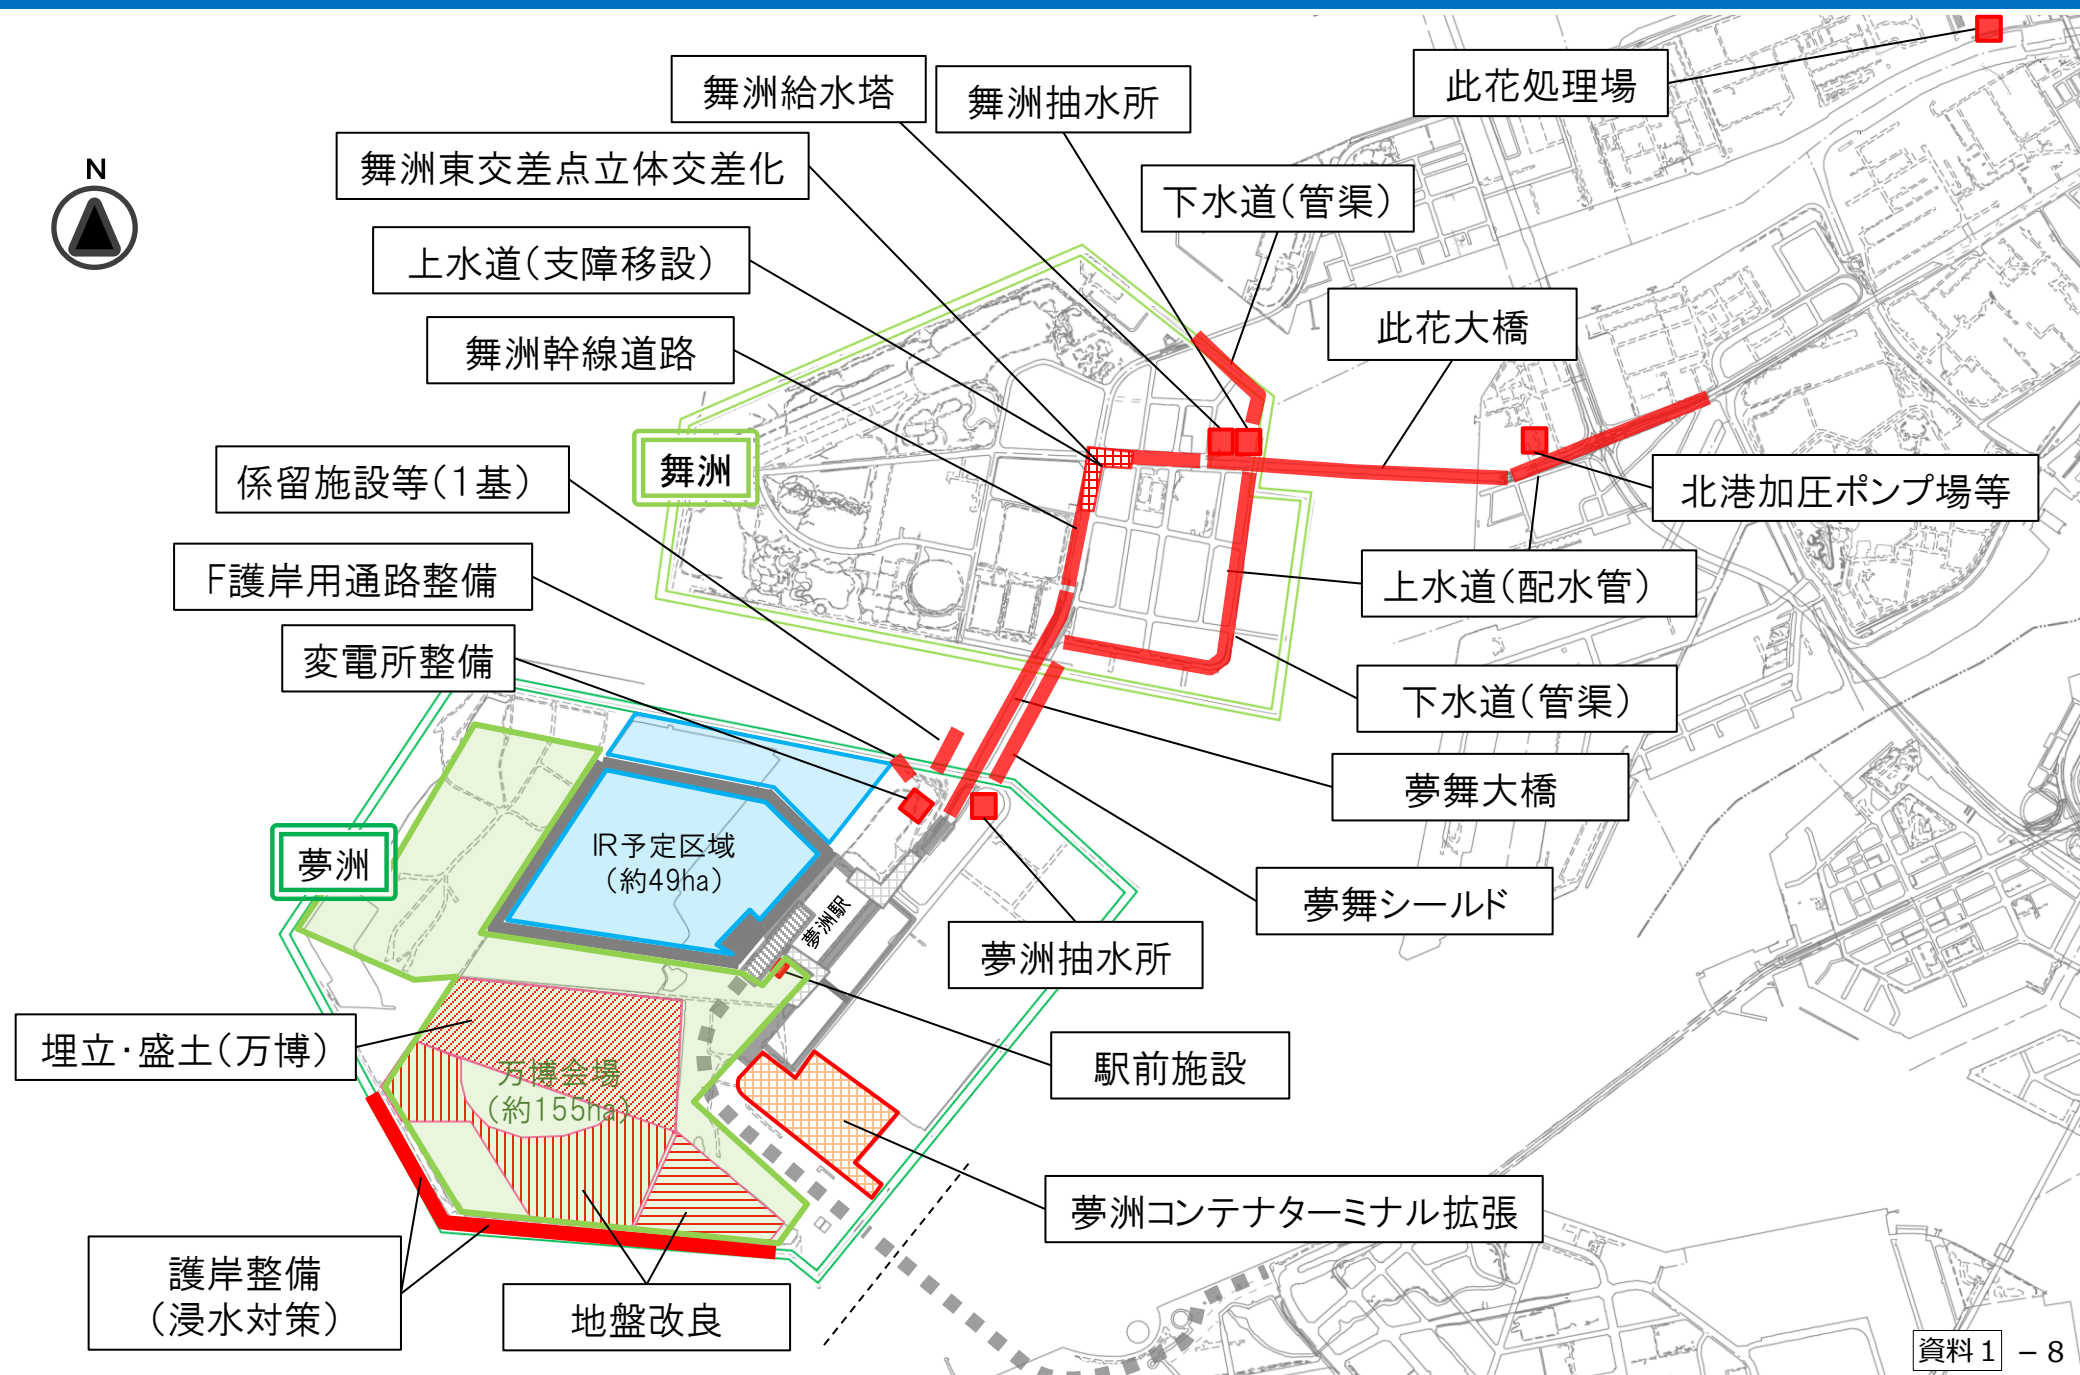

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

(---) 破線：変更前（第11回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考		
工区										
夢洲地区	夢洲抽水所		道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道						場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定	
	駅前施設								2024年12月末までに工事完了 R6年1月以降に開業に向けた検査	
	係留施設	浮棧橋			浮棧橋			待合所		
		波除堤								
	F護岸工事用通路								施工完了	
	浸水対策（G・H護岸）								施工完了	
	埋立・盛土 （万博）	盛土							施工完了	
		地盤改良	南西							施工完了
			南東							施工完了
	夢洲コンテナターミナル拡張								施工完了	
変電所整備								R6年度当初より電力供給開始。なお、万博開催時には、緊急時等の対応として、2系統で供給できるよう整備するもの		
舞洲地区	此花大橋	道路改良							施工完了	
	舞洲幹線道路									
	舞洲東 交差点 立体交差化	立体交差化								
		水道（支障移設）								施工完了
	夢舞大橋									
	舞洲11・14・ 16・18号線	舗装工事							舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないよう通行時間帯などを調整し施工するため、万博開催に影響なし	
		水道工事								施工完了
		下水道管渠 （舞洲立坑～舞洲抽水所）								施工完了
	舞洲地区 排水管（ドレン）設置工事								施工完了	
	舞洲給水塔 追加塩素注入設備改良工事								水道局単独工事であり、万博開催期間の給水に影響なし	
	下水道管渠 （舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）								施工完了	
	舞洲抽水所								場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定	

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

R6年6月現在

破線：変更前（第11回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区			年度	2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考	
夢舞 シールド	水道		道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道 NTT（通信ケーブル）							施工完了	
	下水（汚水）					準備工				12月1日から供給	施工完了
	関電送配電（特高）							管路取付（夢洲立坑）	立金物取付 ケーブル布設		施工完了
	関電送配電（高低圧）								ケーブル布設		施工完了
	NTT（通信ケーブル）								ケーブル布設		施工完了
その他	此花処理場									場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定	
	水道	配水管								施工完了	
		北港加圧 ポンプ場等									水道局単独工事であり、万博開催期間の給水に影響なし

2024年6月時点

令和4年7月14日 右左折2車線化済

令和4年7月14日 6車線化済

令和4年3月末 浮棧橋設置済

令和2年度より施工中

IR施設整備

令和3年度より施工中

日本国際博覧会会場整備

令和4年10月より基盤整備・管路(給水・汚水・電気など)工事開始

令和5年3月末施工完了

令和6年5月末施工完了

令和4年10月29日 6車線化済

令和4年8月4日 6車線化済

令和3年度より施工中

令和5年2月より工事着手

令和3年度より施工中


令和5年5月24日 シールド到達

夢洲関連工事進捗状況

2024年6月時点

【1,2】埋立・盛土(IR・万博) 済

令和4年4月完了

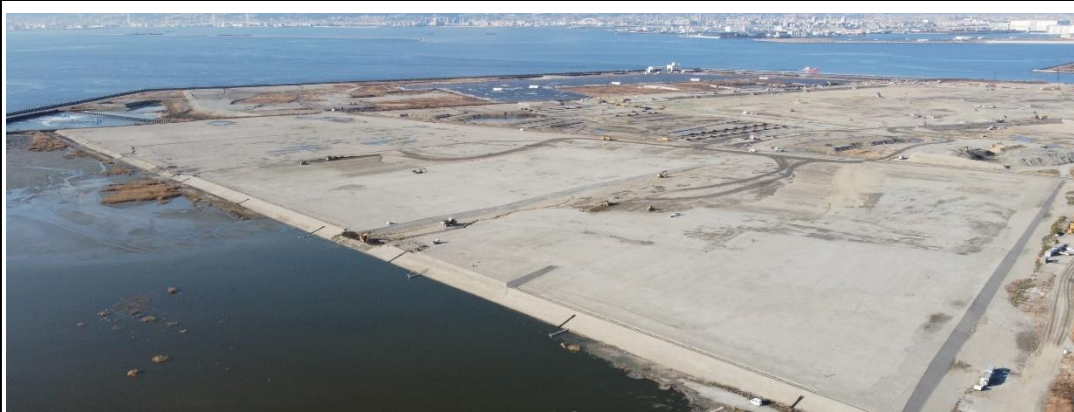

【3】地盤改良 済

令和6年5月末施工完了



南東部: 令和5年2月完了



南西部: 令和6年5月完了

【4】浸水対策 済

令和5年3月末施工完了



【5】観光外周道路

令和3年度～施工中



設計データ



【6】夢洲北・南高架橋(2橋)

令和3年度～施工中

南高架橋



北高架橋



【7～9】上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度～施工中



夢洲抽水所施工状況



電気管路敷設状況

【10】 鉄道(南ルート)

令和2年度～施工中



【11】 駅前施設

令和4年度～施工中



【12】 夢洲幹線道路

令和3年度～施工中




【13】 舞洲幹線道路(4車線→6車線) 済

令和4年7月14日完了



【14】 舞洲東交差点立体交差化

令和4年度～施工中

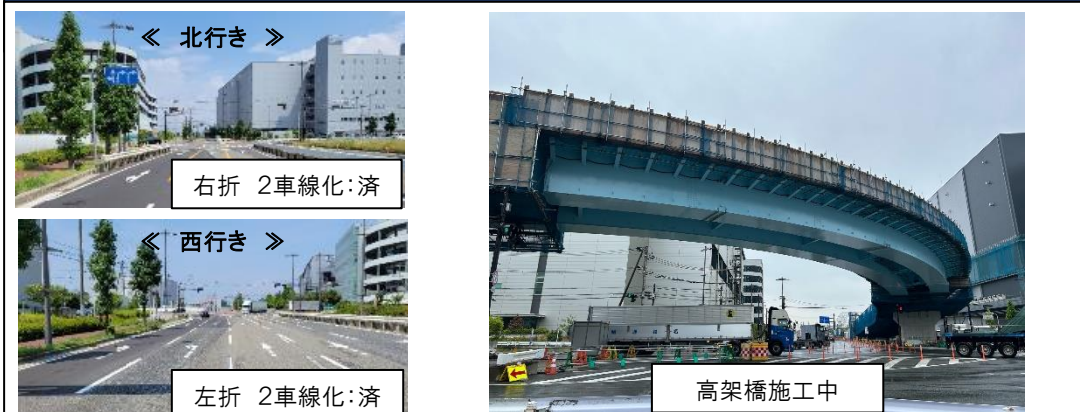

【15】 此花大橋(4車線→6車線) 済

令和4年10月29日完了



【16】 夢舞大橋(4車線→6車線) 済

令和4年8月4日完了



施工前(2車線)



施工後(3車線)

【17】 係留施設等

令和4年3月浮棧橋完成、波除堤施工中

