

夢洲関連部会及びワーキングにおける R 6 年度取り組みについて

令和 6 年12月20日
大阪市建設局

夢洲関連部会及びワーキングの取組みについて（R 6 年 6 月以降）

■埋設調整部会

○取組状況

	第23回	第24回
日時	R6. 8. 8	R6. 9. 19

○取組内容

- ・ 埋設管路の離隔詳細協議など

■工程調整部会

○取組状況

	第27回	第28回	第29回
日時	R6. 8. 8	R6. 9. 19	R6. 11. 12

○取組内容

- ・ 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整
- ・ 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況

	第44回	第45回	第46回	第47回	第48回	第49回
日時	R6. 6. 25	R6. 7. 23	R6. 8. 27	R6. 9. 24	R6. 10. 22	R6. 11. 26


○取組内容

- ・ 安全推進協議会の実施
（労働基準監督署による現地視察、講義）
- ・ 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
- ・ 工事車両運行時のルール共有など

【各工事の進捗状況】


- 道路工事及び本体埋設管路工事について、令和6年12月末をもって概ね完了
- 円滑な工事車両の通行確保の対策として、夢洲北高架橋並びに夢洲南高架橋の完成を前倒しさせ、工事車両専用通路として暫定活用
- 令和7年1月以降の工事としては、変電所やポンプ場の場内工事や、無電柱化に伴う既存柱の抜柱工事が残っているが、万博のために必要となる工事は、すでに完了しており、3月末には、全て完了する予定。
- 万博関係者等の通勤車両の削減等に寄与するため、夢洲駅は令和7年1月19日の開業を目指し、試運転等の開業準備を実施

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

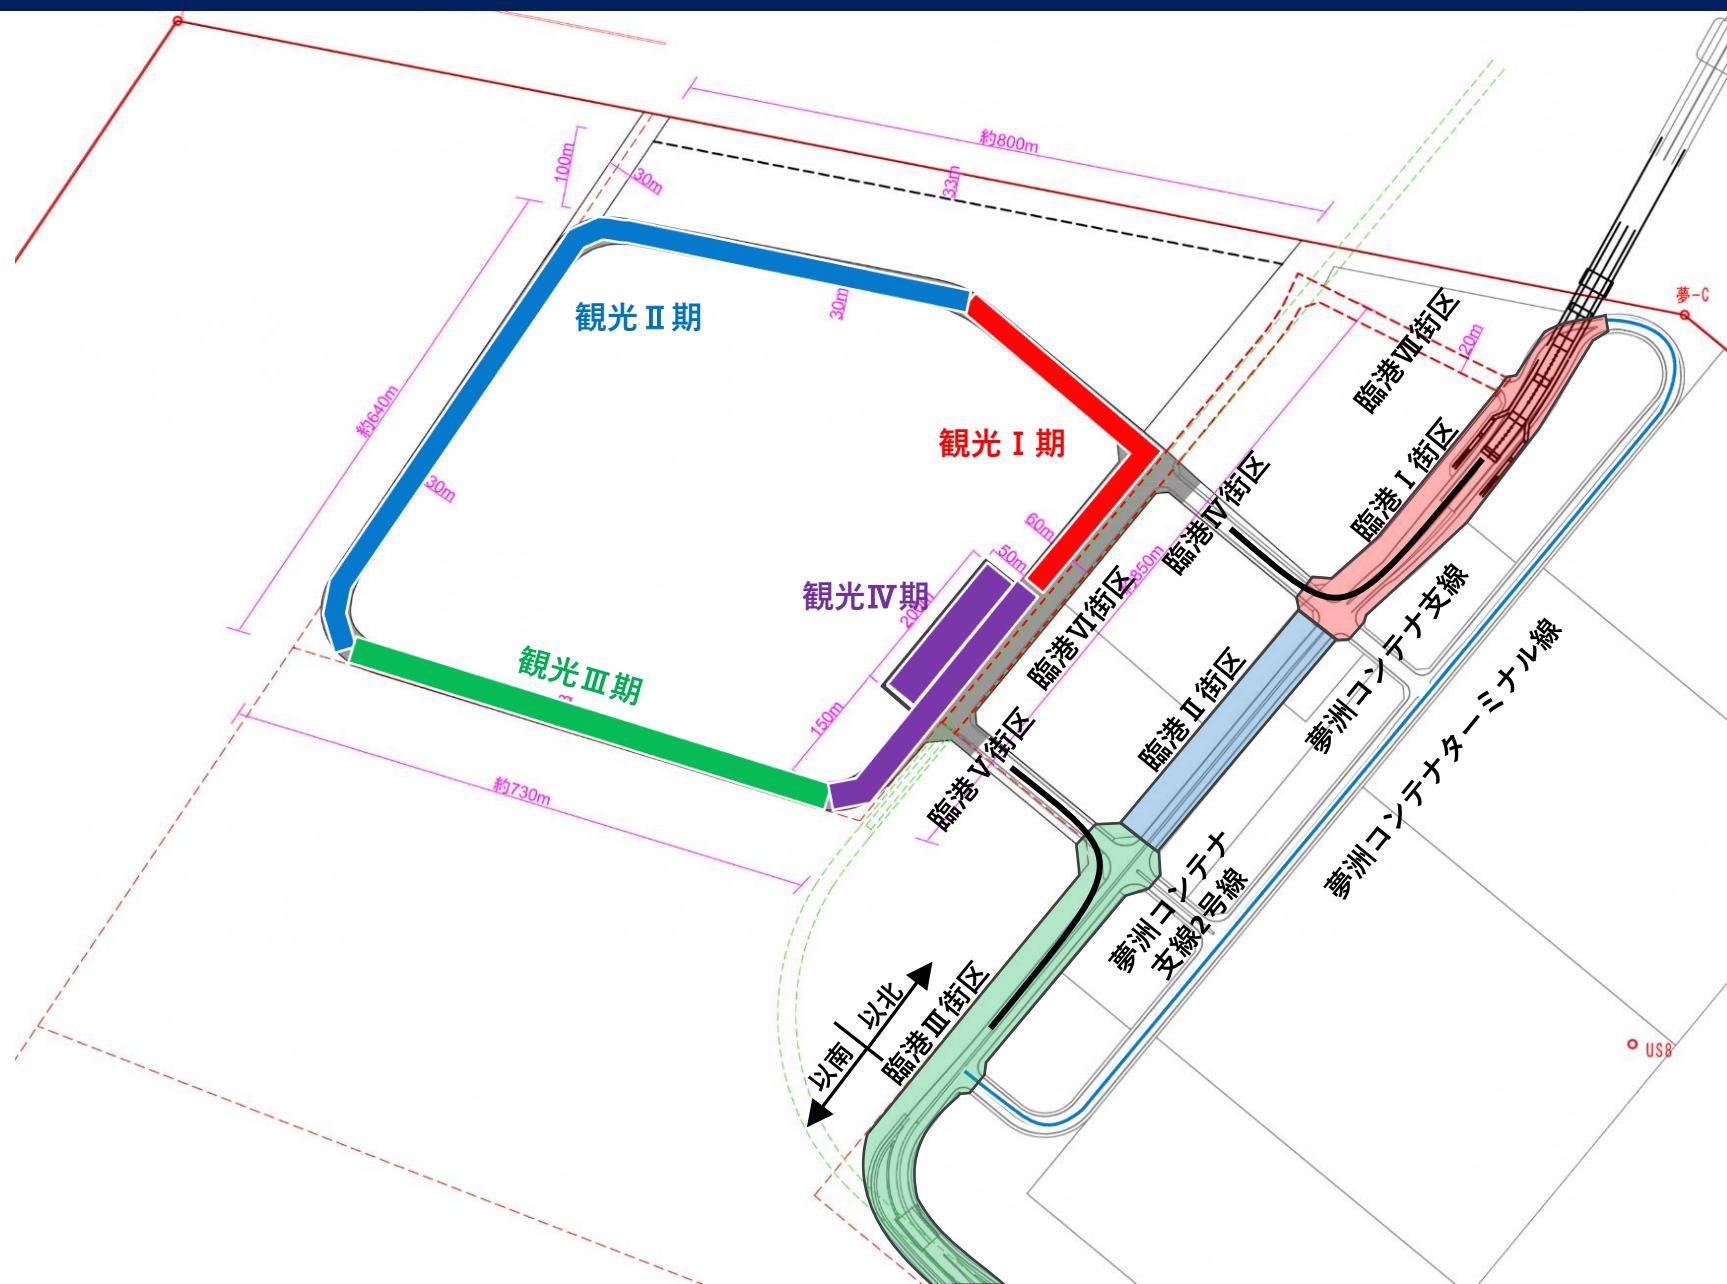


※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

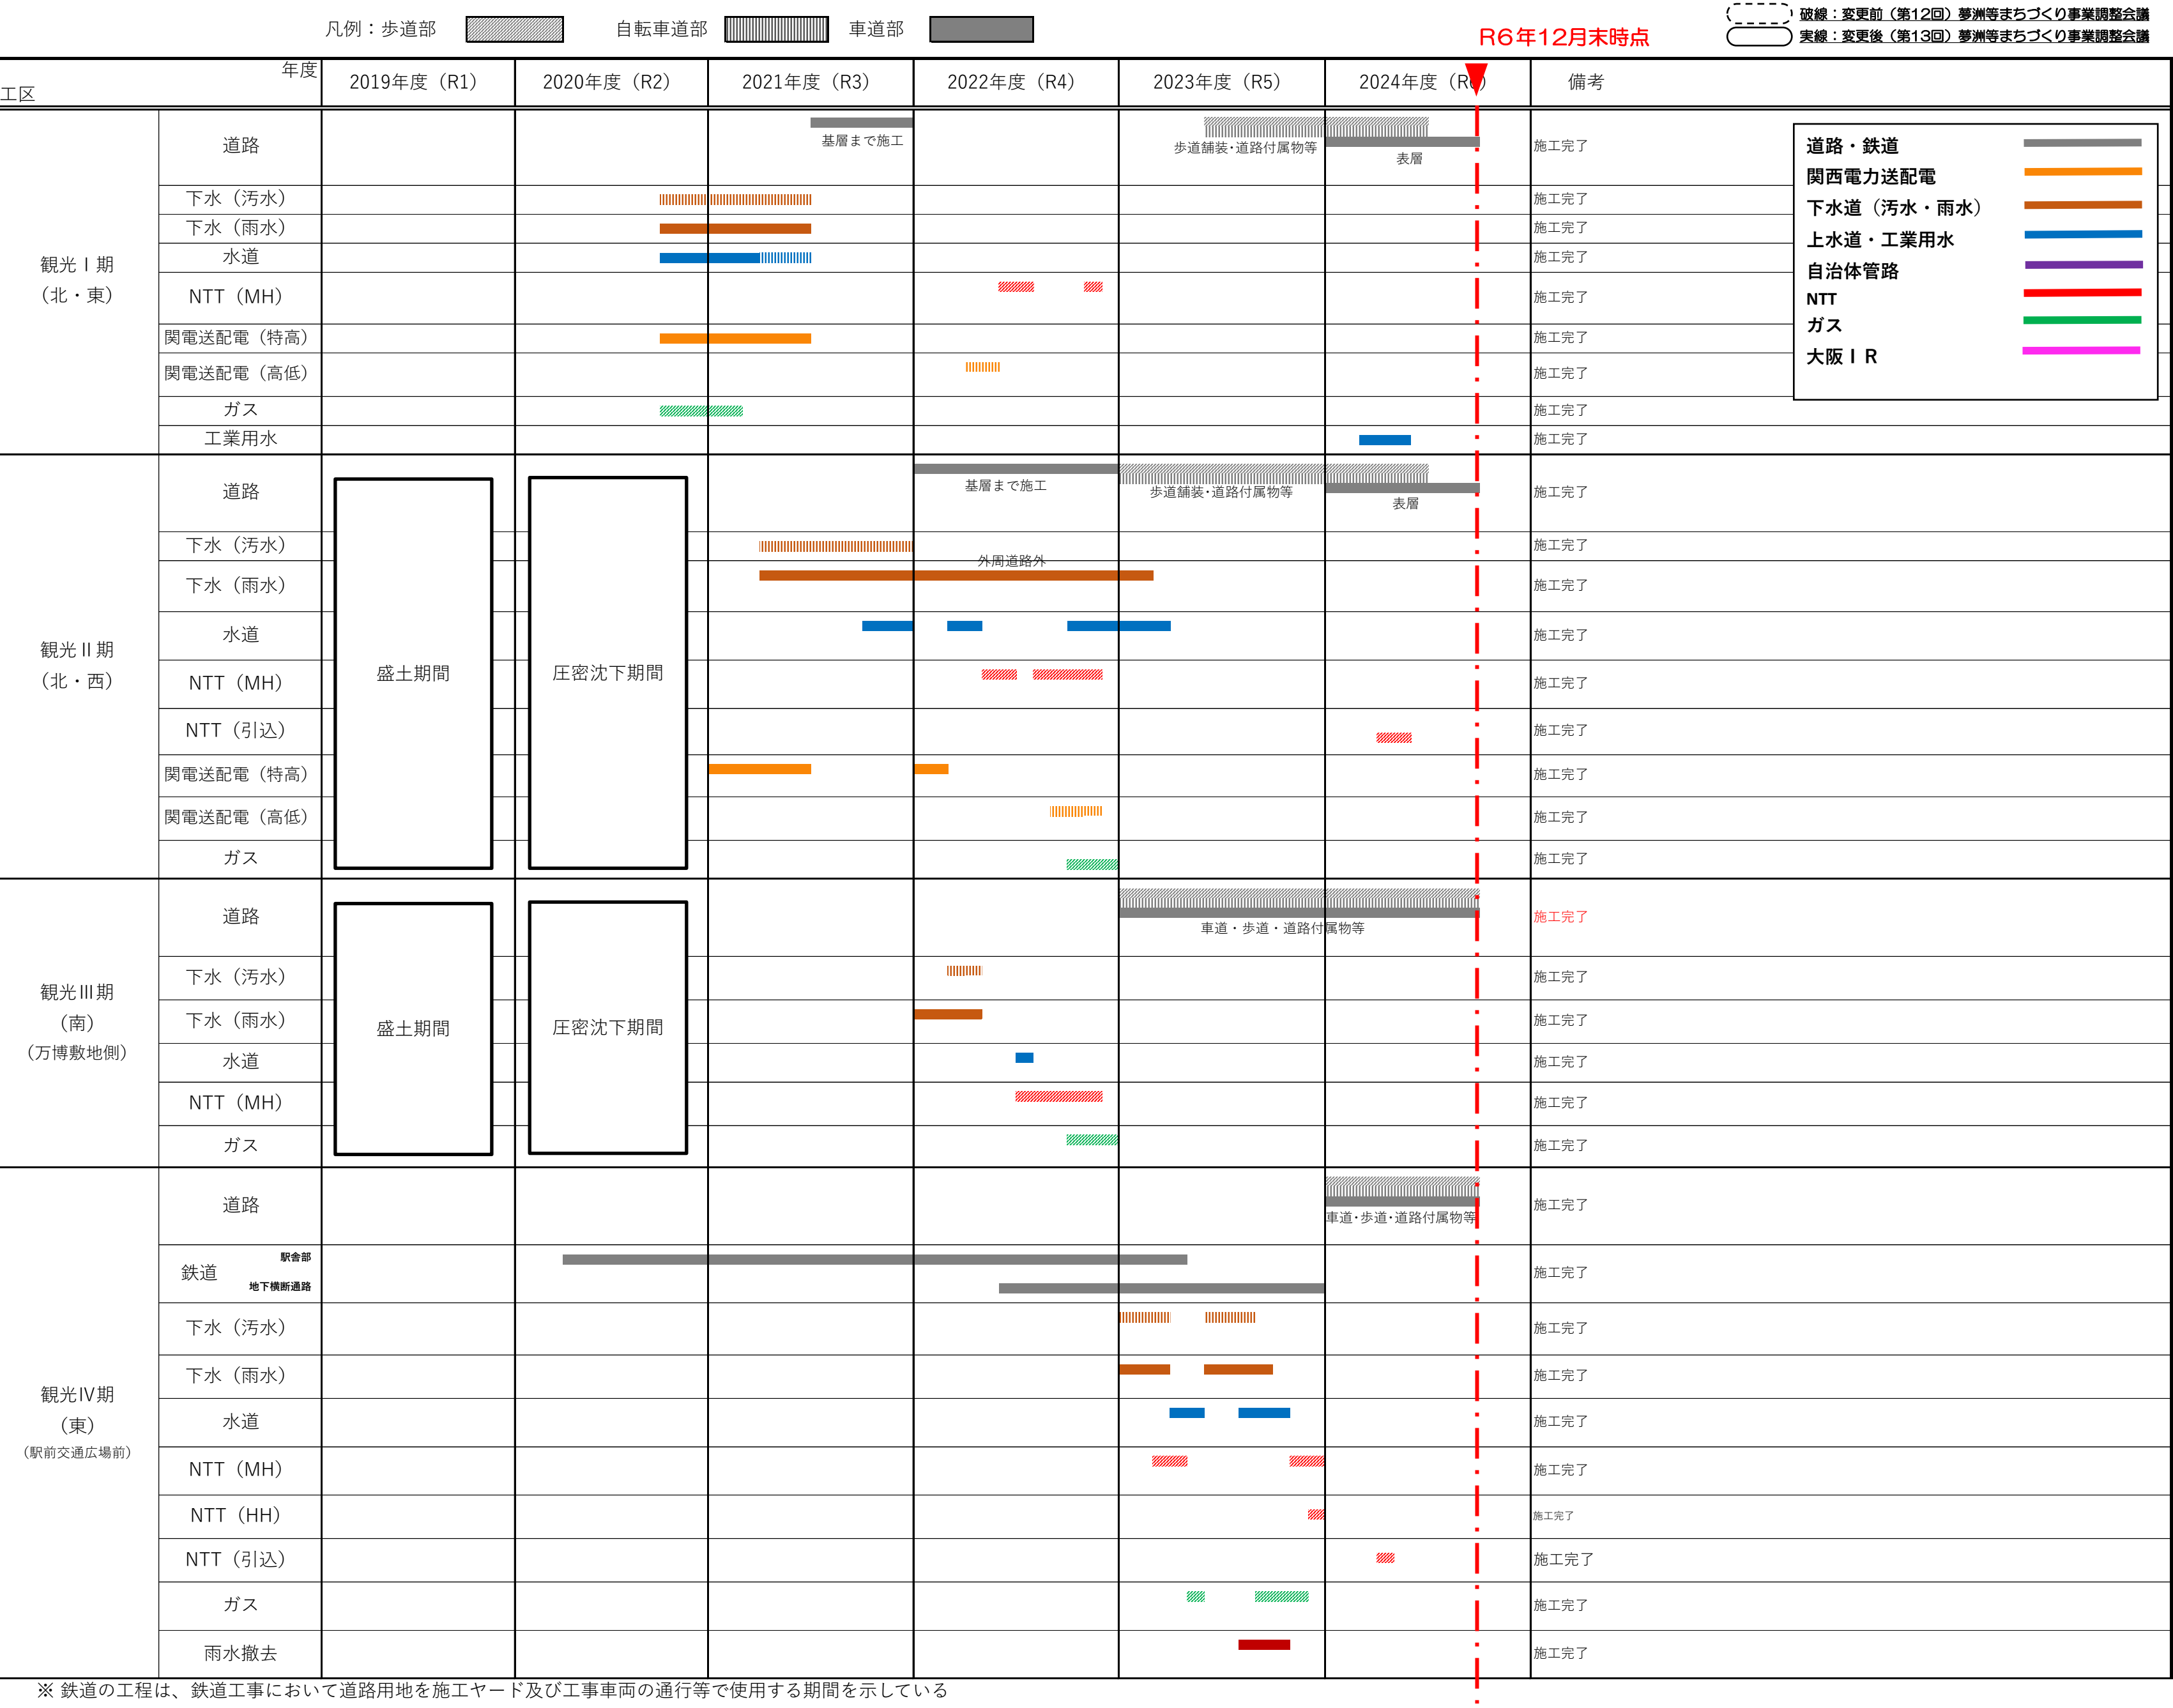

※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

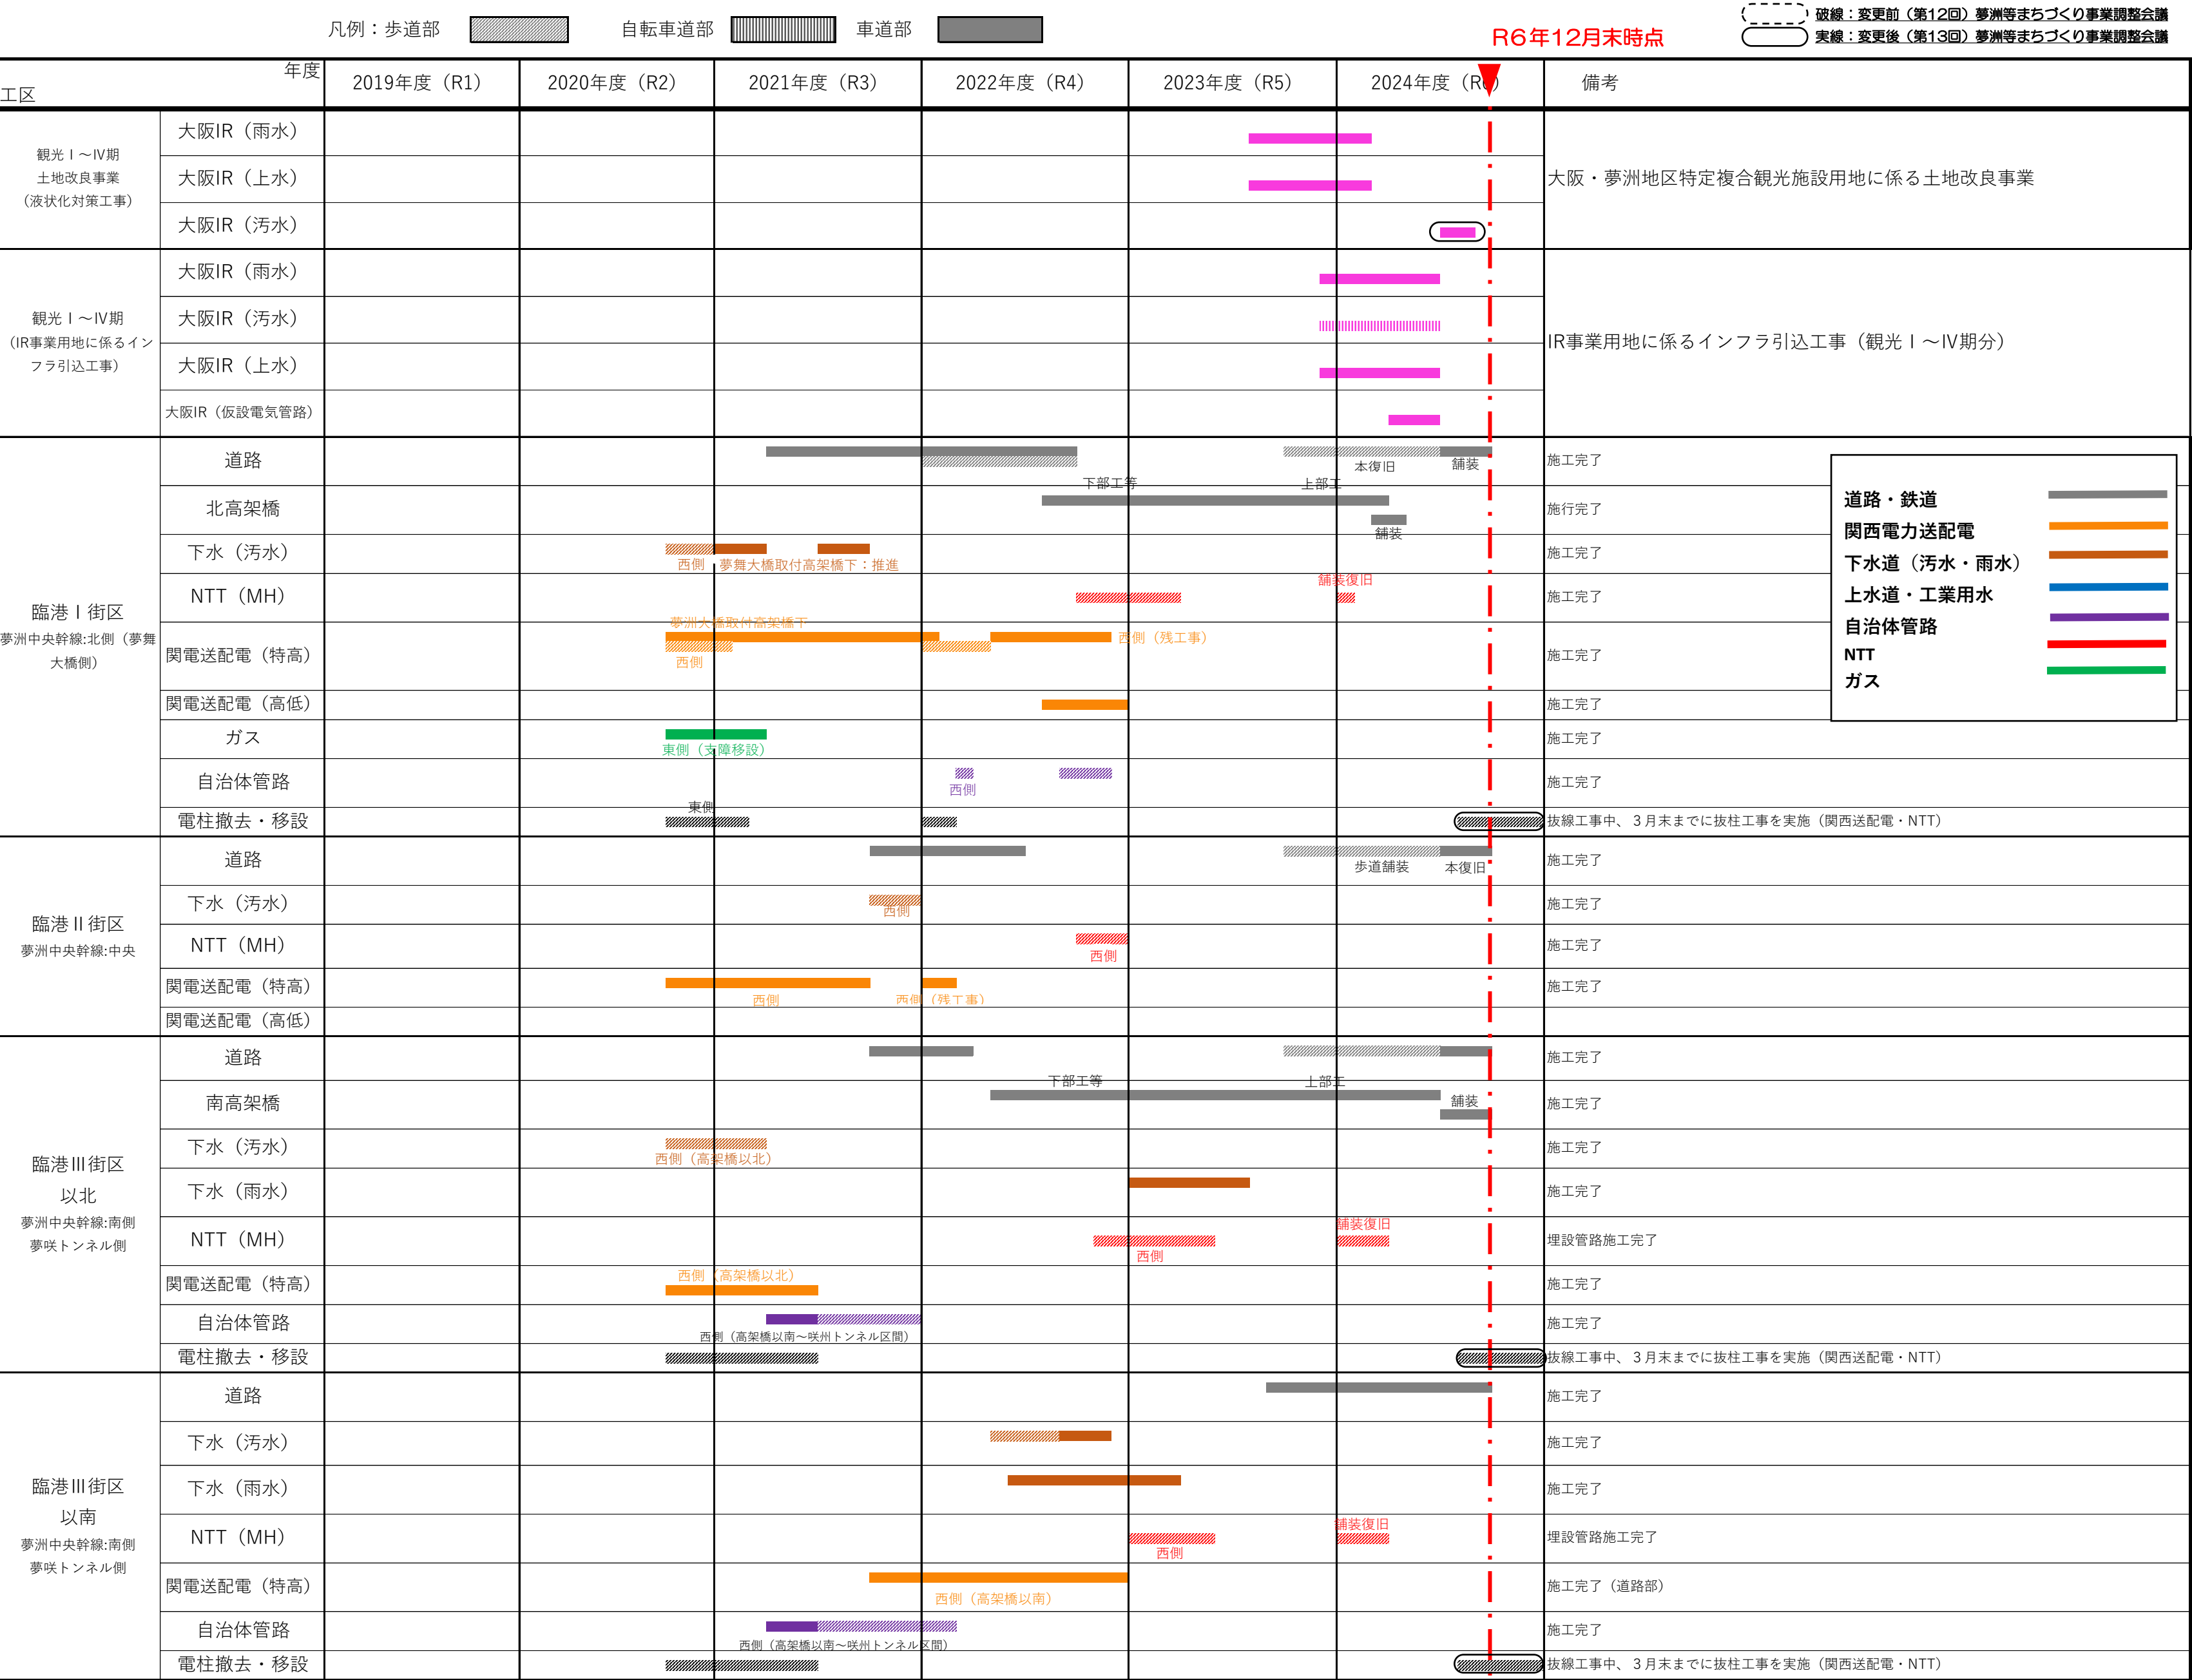

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部


R6年12月末時点

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議


年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
工区 臨港Ⅳ街区 夢洲2号線 山九・上組 北側 夢洲北高架道路下	道路						歩道舗装 本復旧 舗装	施工完了
	北高架橋				下部工等	上部工	舗装	施行完了
	下水（汚水）			南側				施工完了
	下水（雨水）					北側		施工完了
	水道							施工完了
	NTT（MH）					南側	舗装復旧	施工完了
	関電送配電（特高）			南側	南側（残工事）			施工完了
	関電送配電（高低）			北側				施工完了
	ガス			北側				施工完了
	自治体管路					北側		施工完了
	電柱撤去・移設							
臨港Ⅴ街区 夢洲1号線 山九・上組 南側 夢洲南高架道路下	道路						歩道舗装 本復旧	施工完了
	南高架橋				下部工等	上部工	舗装	施工完了
	下水（汚水）		南側 北側			南側		施工完了
	下水（雨水）					南側		施工完了
	水道（既設移設）		北側 南側					施工完了
	水道（新設）		北側					施工完了
	NTT（MH）					北側	舗装復旧	施工完了
	関電送配電（特高）							施工完了
	関電送配電（高低）							施工完了
	自治体管路							施工完了
	電柱撤去・移設							
臨港Ⅵ街区 夢洲中央線 山九・上組 西側 観光外周道路側	道路							施工完了
	鉄道 駅舎部 インフラ外							施工完了 ※駅開業予定日の1月19日までは開業に向けた準備を実施
	下水（雨水）							施工完了
	水道							施工完了
	NTT（MH）							施工完了
	関電送配電（高低）							施工完了
	自治体管路				東側			施工完了
	工業用水							施工完了
	雨水撤去							施工完了
	電柱撤去・移設							抜線工事中、3月末までに抜柱工事を実施（関西送配電・NTT）

※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

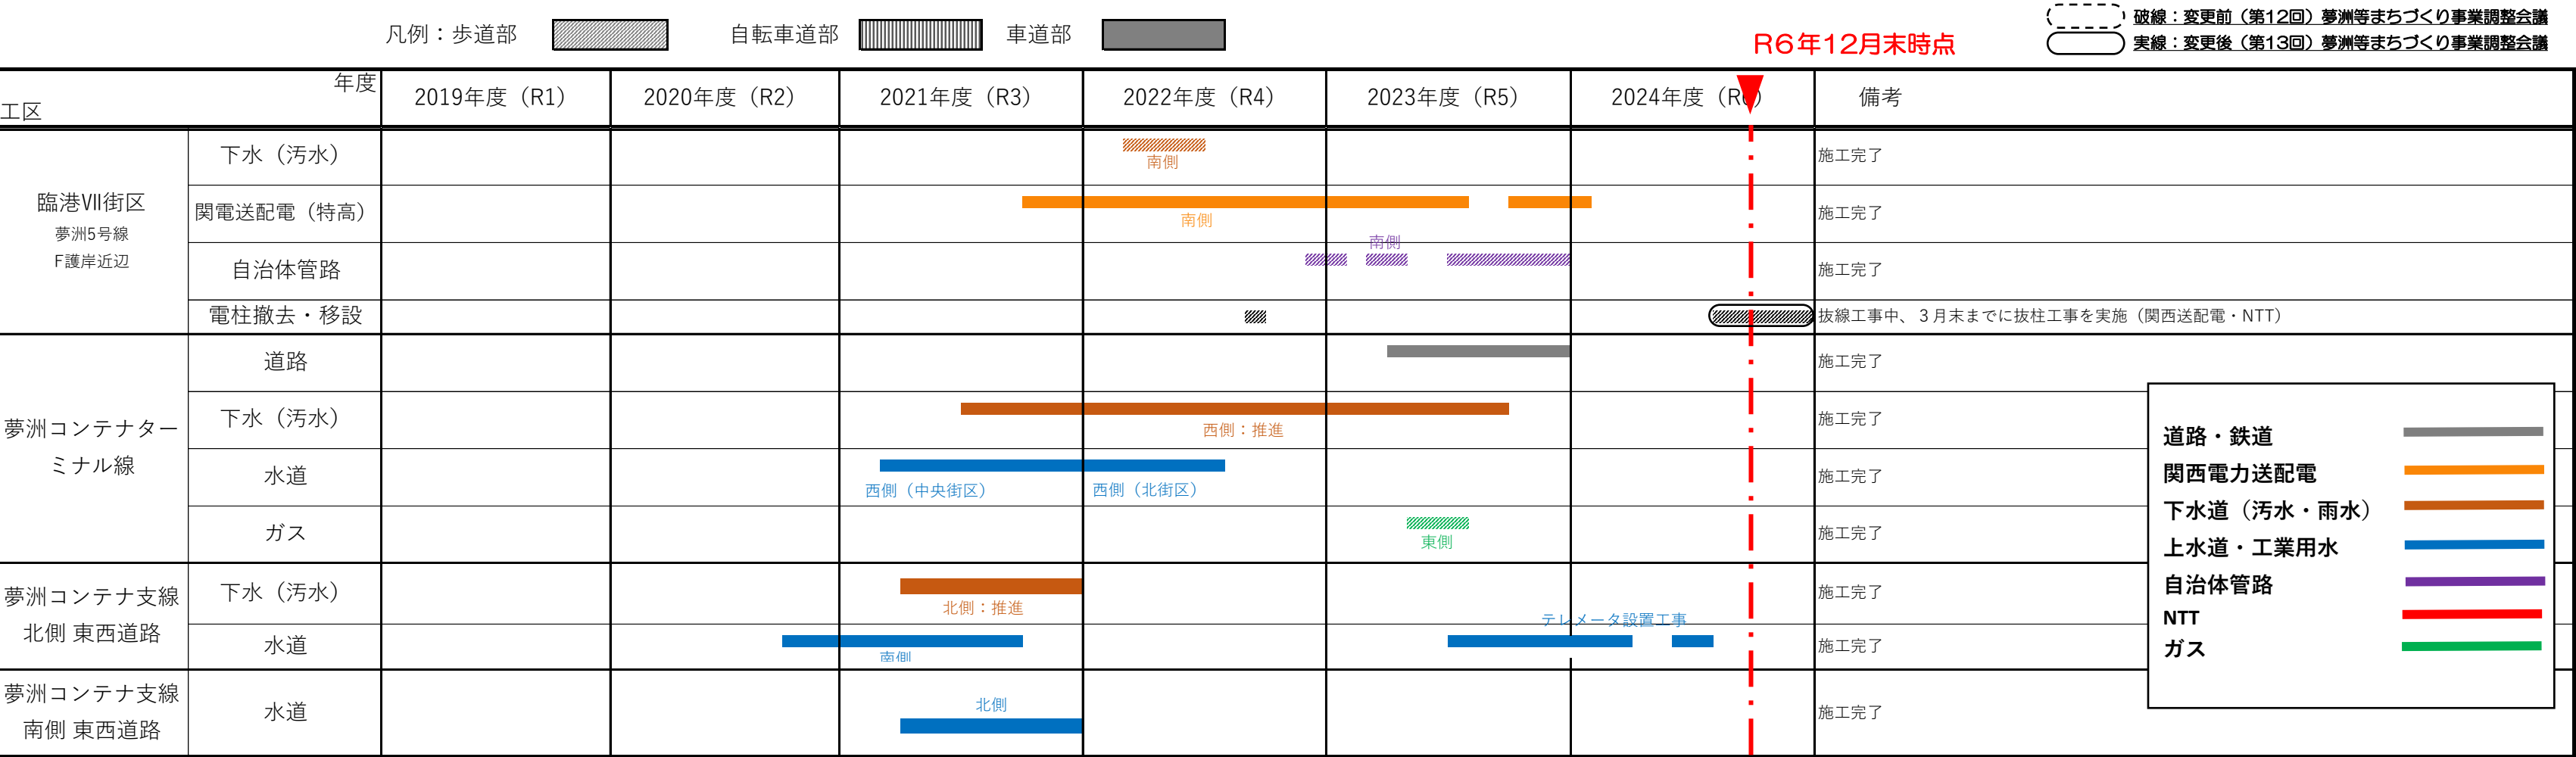

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事） ～整備箇所図～

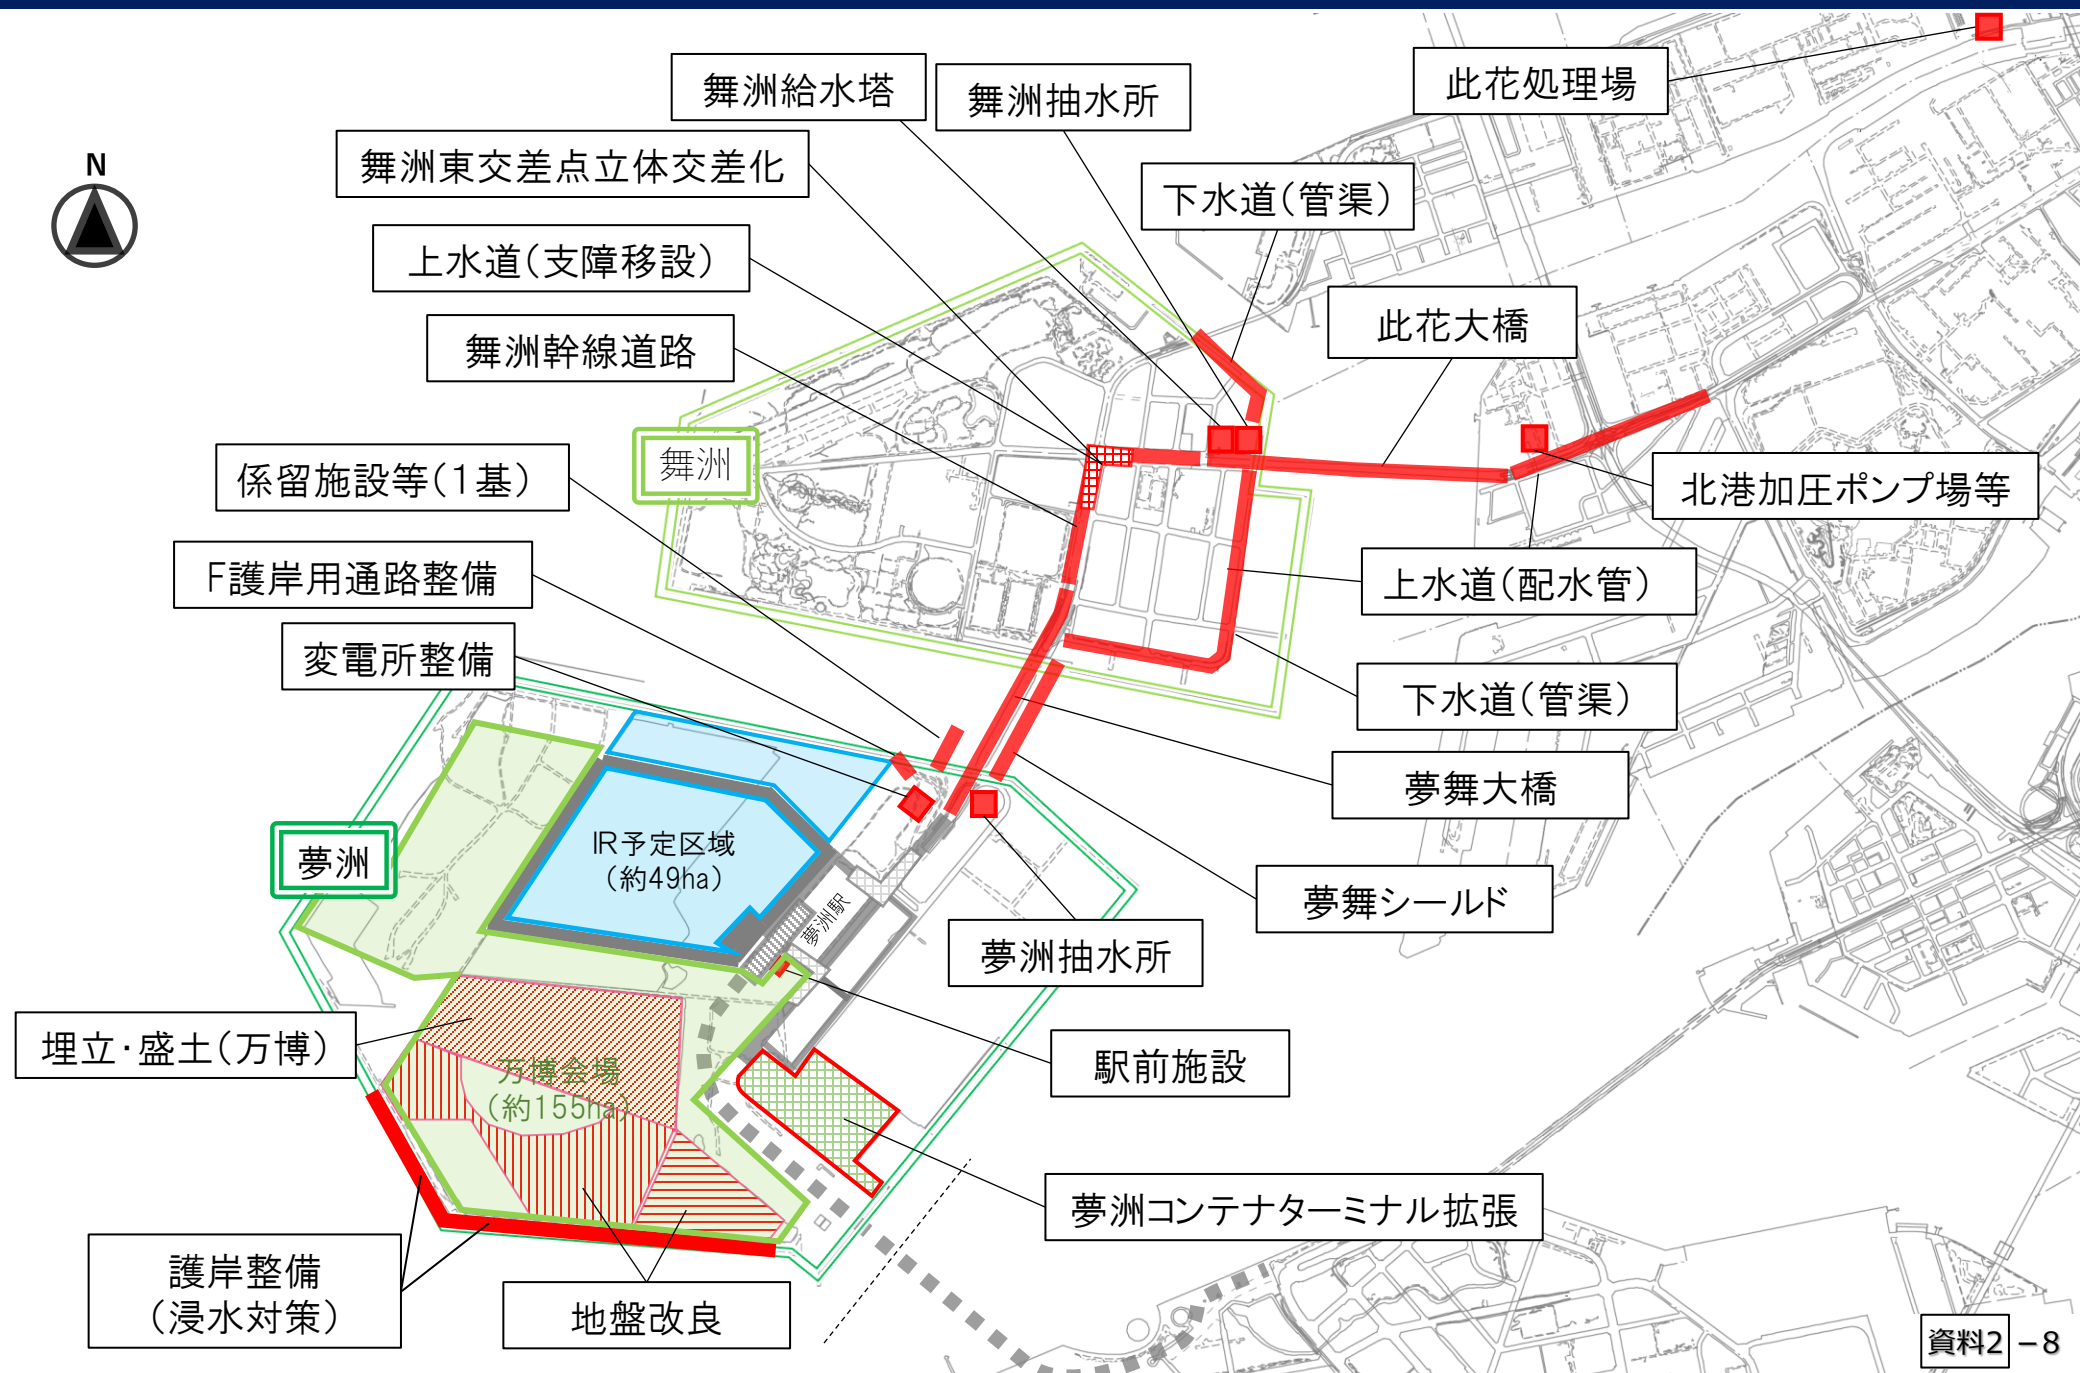

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議

R6年12月末時点

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考	
工区									
夢洲地区	夢洲抽水所		道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道					施工完了	
	駅前施設							施工完了 ※駅開業予定日の1月19日までは開業に向けた準備を実施	
	係留施設	浮棧橋			浮棧橋		待合所	施工完了	
		波除堤						施工完了	
	F護岸工事用通路							施工完了	
	浸水対策（G・H護岸）							施工完了	
	埋立・盛土 （万博）	盛土						施工完了	
		地盤改良	南西						施工完了
			南東						施工完了
	夢洲コンテナターミナル拡張							施工完了	
変電所整備								敷地内工事であり、夢洲関連工事の交通に支障なし	
舞洲地区	此花大橋	道路改良						施工完了	
	舞洲幹線道路					右左折2車線化	本復旧 舗装	施工完了	
	舞洲東 交差点 立体交差化	立体交差化					下部工	施工完了	
							上部工 橋面舗装		
		水道（支障移設）				下部工に伴う支障移設			施工完了
	夢舞大橋						歩道補修	施工完了	
	舞洲11・14・ 16・18号線	舗装工事						舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないよう通行時間帯などを調整し施工するため、万博開催に影響なし	
		水道工事							施工完了
		下水道管渠 （舞洲立坑～舞洲抽水所）							施工完了
	舞洲地区 排水管（ドレン）設置工事								施工完了
	舞洲給水塔 追加塩素注入設備改良工事								敷地内工事であり、夢洲関連工事の交通に支障なし
	下水道管渠 （舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）								施工完了
舞洲抽水所								施工完了	


夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

R6年12月末時点

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区			年度	2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
夢舞 シールド	水道									施工完了
	下水（汚水）									施工完了
	関電送配電（特高）									施工完了
	関電送配電（高低圧）									施工完了
	NTT（通信ケーブル）									施工完了
その他	此花処理場									施工完了
	水道	配水管								施工完了
		北港加圧 ポンプ場等								敷地内工事であり、夢洲関連工事の交通に支障なし

夢洲関連事業の工事進捗について

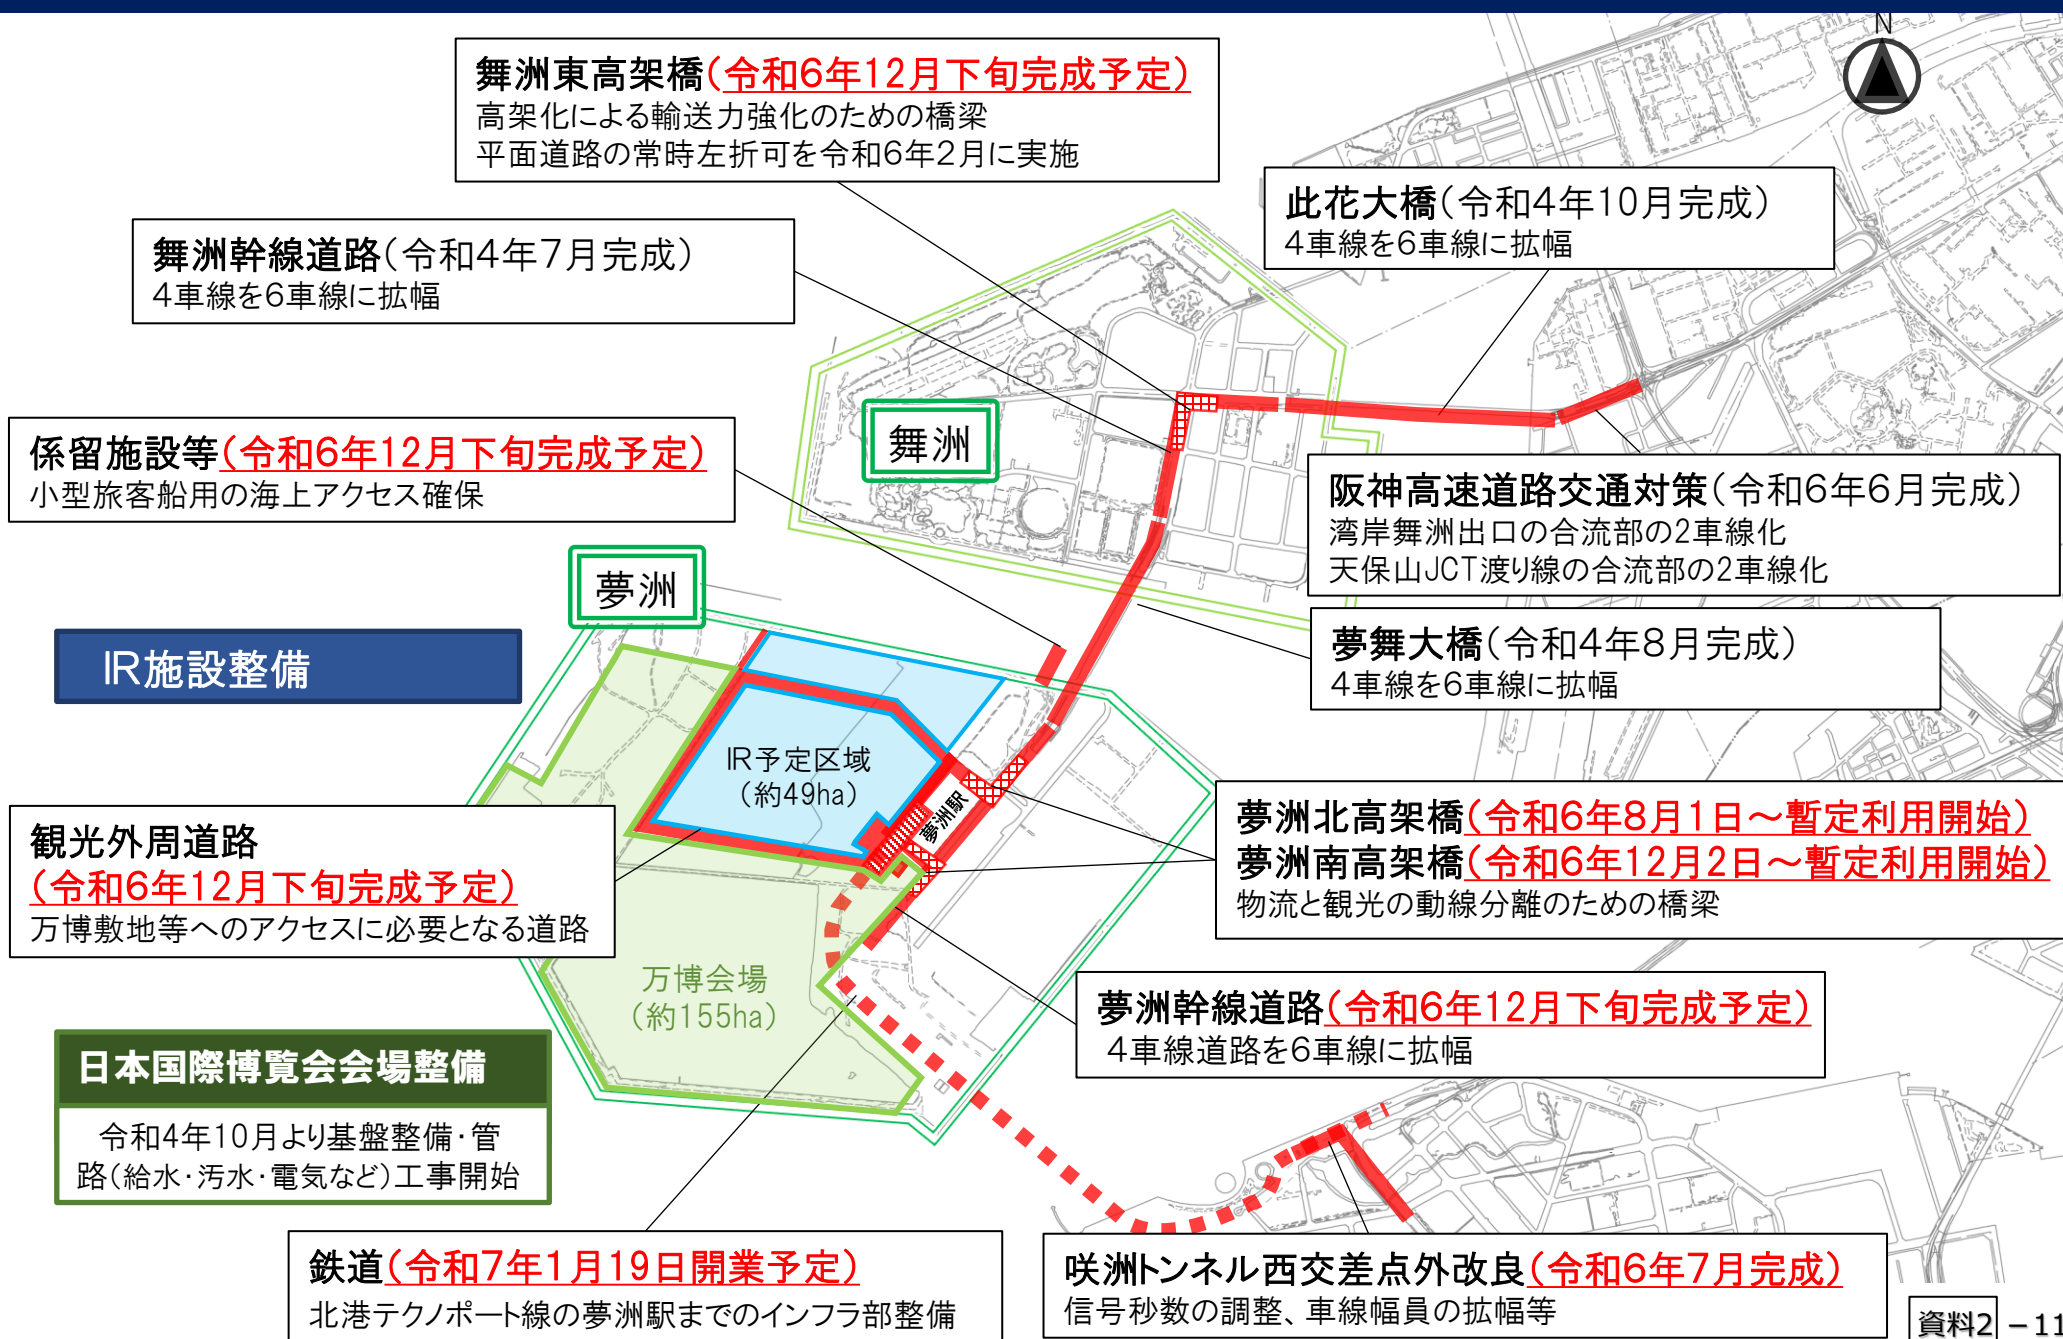

交通インフラ整備の進捗状況【舞洲】



(仮称) 舞洲東高架橋
右折2車線
(夢舞大橋→此花大橋)
■令和6年12月下旬完成予定



施工後（3車線）

此花大橋
(4車線⇒6車線)
■令和4年10月供用済

此花大橋



舞洲東
交差点

舞洲幹線道路
(4車線⇒6車線)
■令和4年7月供用済



施工後（直進3車線）

平面左折常時左折可
(此花大橋→夢舞大橋)
■令和6年2月供用済




施工後（左折2車線化）

至：夢舞大橋

交通インフラ整備の進捗状況【夢洲】

鉄道（夢洲駅）

■令和7年1月19日 開業予定



観光外周道路

■令和6年12月下旬完成予定



係留施設等

■令和6年12月下旬完成予定



万博会場

IR事業用地

夢洲駅

（仮称）夢洲南高架橋

■令和6年12月2日より暫定利用



（仮称）夢洲北高架橋

■令和6年8月1日より暫定利用



夢舞大橋

（4車線⇒6車線）

■令和4年8月供用済



施工後（3車線）

夢洲コンテナ
ターミナル

凡例

万博交通

一般交通

舞洲方面 →
