

夢洲関連部会及びワーキングにおける R4年度の取組み(議事)

令和5年3月23日
大阪市建設局

夢洲関連部会及びワーキングの取組みについて（R4年度11月以降）

■埋設調整部会

○取組状況

	第15回
日時	R5. 3. 15

○取組内容

- ・ 鉄道施設への引込管路の調整
- ・ 埋設管路の離隔詳細協議など

■工程調整部会

○取組状況

	第18回	第19回
日時	R5. 1. 19	R5. 3. 15

○取組内容

- ・ 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整【資料1】
- ・ 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について【資料3】

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況

	第26回	第27回	第28回
日時	R4. 12. 20	R5. 1. 24	R5. 2. 28

○取組内容

- ・ 安全推進協議会の実施（西野田労働基準監督署による現地視察、講義）
- ・ 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
- ・ 工事車両運行時のルールの共有など

夢洲関連事業の計画工程について

○各工事の進捗状況


- 施工現場間での工程調整に伴い、計画工程に若干の変更が生じているものの、概ね計画工程どおり工事が進捗
- 万博開催に向けた準備を見据え、関係するインフラ施設の整備工事については、令和6年12月末までに完了することを確認

○令和5年度における工事輻輳箇所の工程管理


- 地下鉄駅工事現場付近における埋設管路工事においては、地下鉄工事が完了した区間から各事業者が順次、期間内に工事を完了させる必要があることから、これまで以上に工程の管理を徹底していく。

【工程管理の取組み】

- ・1週間ごとの進捗状況確認（現在、月1回）
- ・別途工程管理、進捗状況表の作成、各事業者への共有

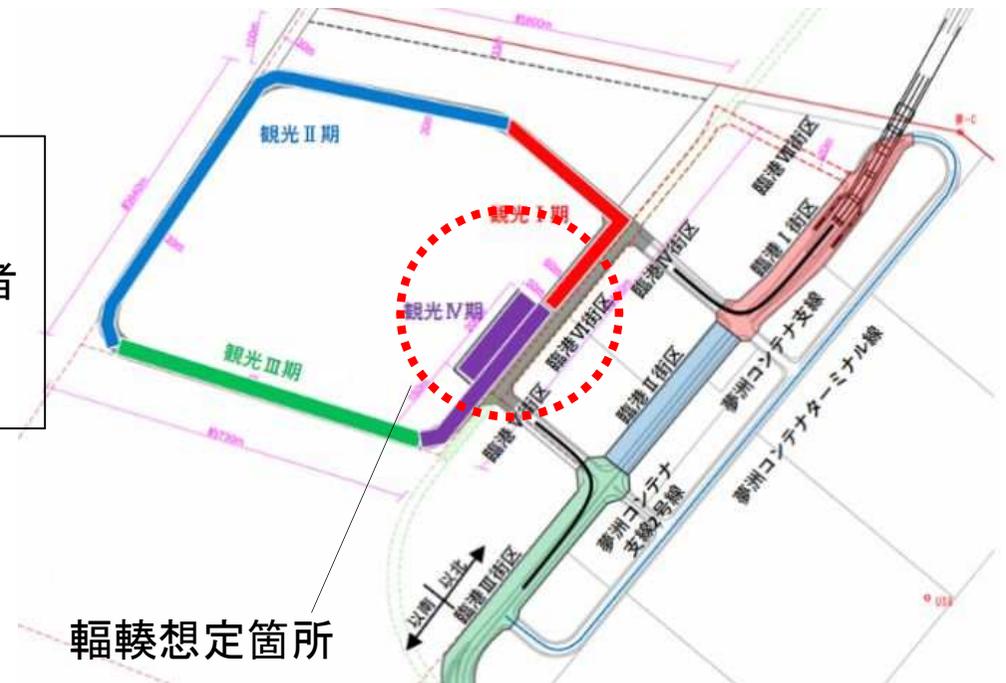

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

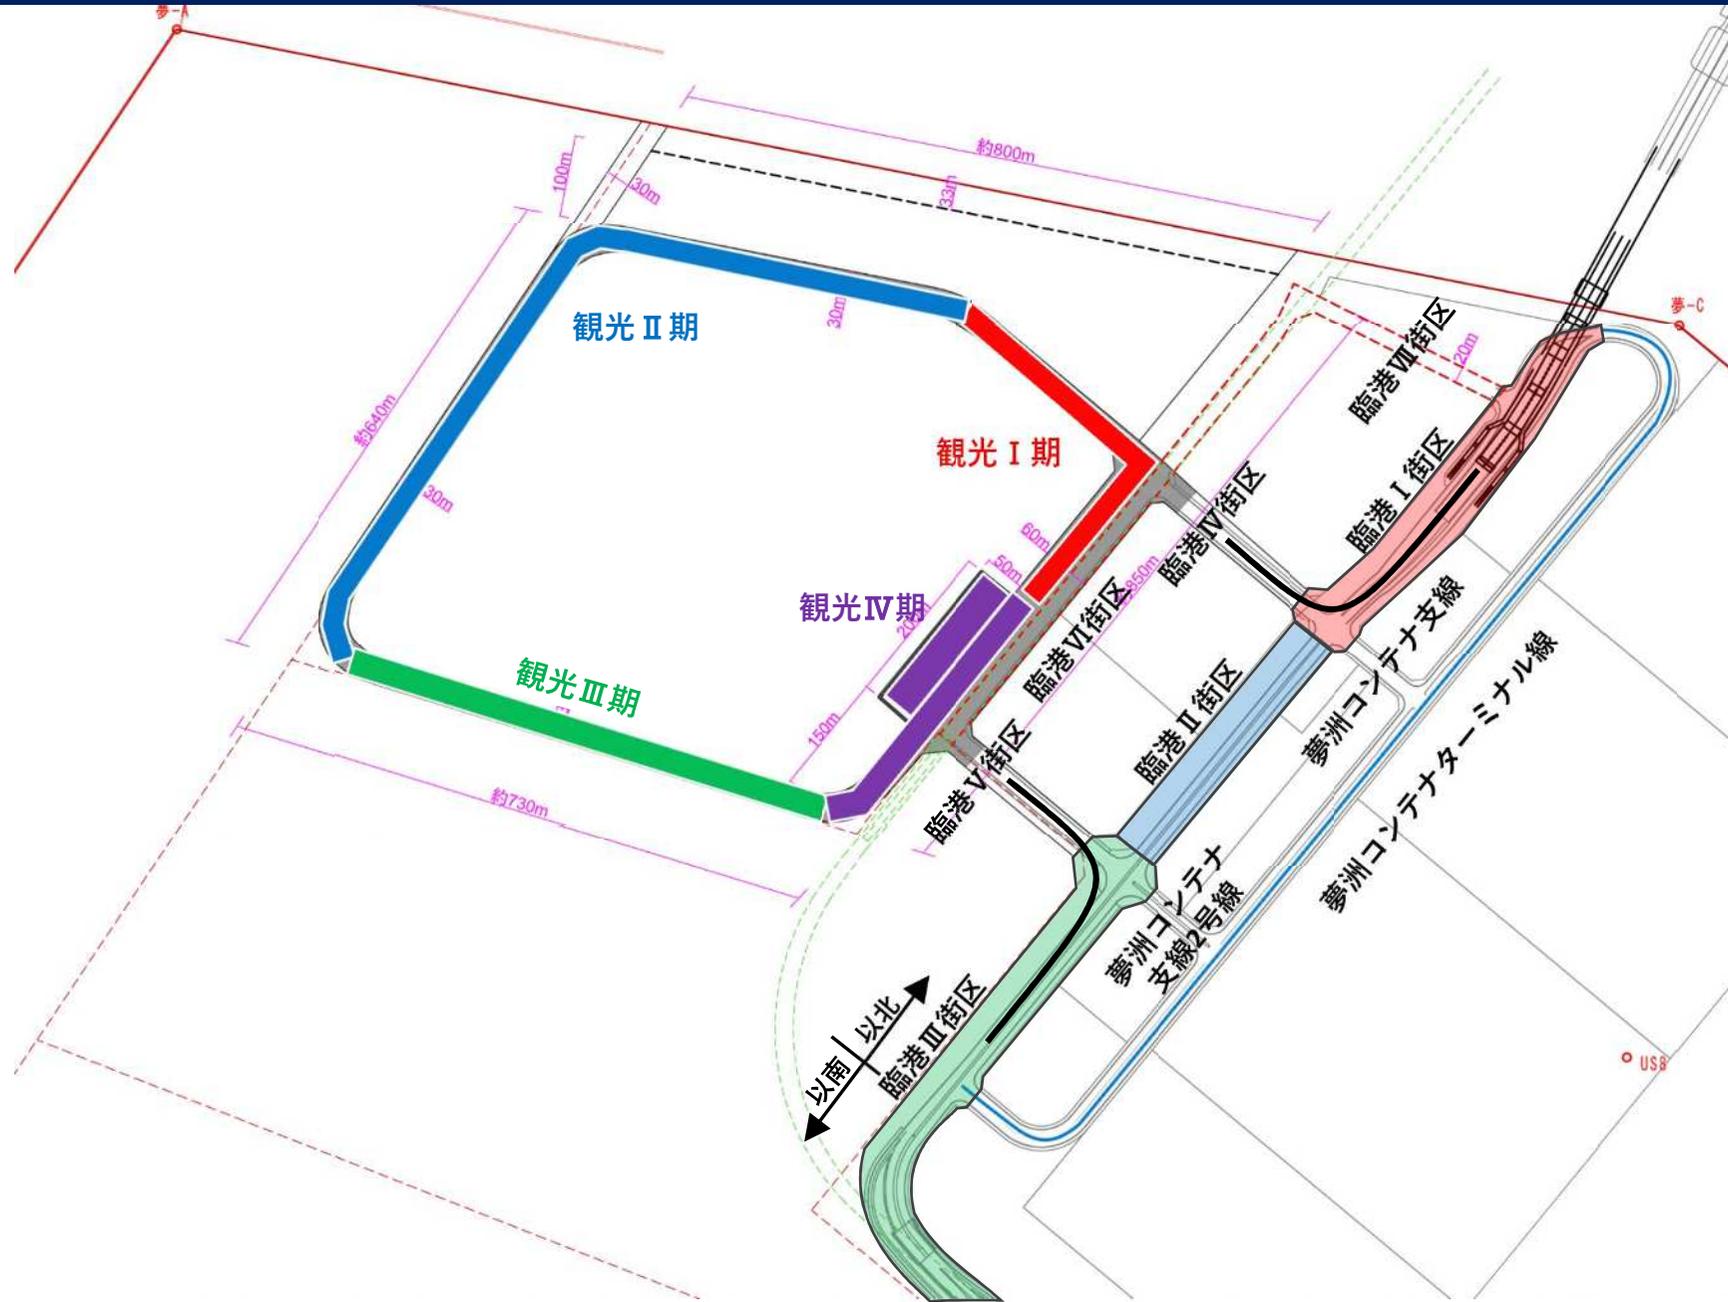

資料 1
— 3

※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年3月現在

破線：変更前（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
観光Ⅰ期 (北・東)	道路			基層まで施工		歩道舗装・道路付属物等	表層	
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)							施工完了
	水道							施工完了
	NTT (MH)							施工完了
	関電送配電(特高)							施工完了
	関電送配電(高低)							施工完了
	ガス							施工完了
観光Ⅱ期 (北・西)	道路				基層まで施工	歩道舗装・道路付属物等	表層	
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)					外周道路外		想定外の出水対応により工程遅延
	水道	盛土期間	圧密沈下期間					上記より工程遅延
	NTT (MH)							施工完了
	関電送配電(特高)							施工完了
	関電送配電(高低)							施工完了
	ガス							3月施工完了
観光Ⅲ期 (南) (万博敷地側)	道路					車道・歩道・道路付属物等		
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)							施工完了
	水道							施工完了
	NTT (MH)							施工完了
ガス							3月施工完了	
観光Ⅳ期 (東) (駅前交通広場前)	道路						車道・歩道・道路付属物等	
	鉄道 駅舎部 地下横断通路							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							
	水道							
	NTT (MH)							
ガス								

道路・鉄道
 関西電力送配電
 下水道(汚水・雨水)
 上水道
 自治体管路
 NTT
 ガス

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年3月現在

破線：変更前（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議
 実線：変更後（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港I街区 夢洲中央幹線:北側(夢舞大橋側)	道路							
	高架橋				下部工等	上部工		
	下水(汚水)			西側 夢舞大橋取付高架橋下:推進				施工完了
	NTT (MH)			夢洲大橋取付高架橋下				
	関電送配電(特高)			西側		西側(残工事)		施工完了
	関電送配電(高低)							3月施工完了
	ガス			東側(支障移設)				施工完了
	自治体管路				西側			3月施工完了
	電柱撤去・移設			東側				施工完了
臨港II街区 夢洲中央幹線:中央	道路						歩道舗装 本復旧	
	下水(汚水)			西側				施工完了
	NTT (MH)					西側		施工完了
	関電送配電(特高)			西側	西側(残工事)			施工完了
臨港III街区 以北 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路							
	高架橋				下部工等	上部工		
	下水(汚水)			西側(高架橋以北)				施工完了
	下水(雨水)							博覧会協会の会場整備工事との調整により、施工順序を変更
	NTT (MH)					西側		
	関電送配電(特高)			西側(高架橋以北)				施工完了
	自治体管路			西側(高架橋以南～咲州トンネル区間)				施工完了
電柱撤去・移設								
臨港III街区 以南 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路							
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)							博覧会協会の会場整備工事との調整により、施工順序を変更
	NTT (MH)					西側		
	関電送配電(特高)				西側(高架橋以南)			施工完了(道路部)
	自治体管路			西側(高架橋以南～咲州トンネル区間)				施工完了
	電柱撤去・移設							

道路・鉄道
 関西電力送配電
 下水道(汚水・雨水)
 上水道
 自治体管路
 NTT
 ガス

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年3月現在

破線：変更前（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港IV街区 夢洲2号線 山九・上組 北側 夢洲北高架道路下	道路						歩道舗装 本復旧	
	高架橋				下部工等	上部工		
	下水（污水）			南側				施工完了
	下水（雨水）					北側		
	水道							施工完了
	NTT (MH)				南側 (残工事)	南側		
	関電送配電 (特高)							施工完了
	関電送配電 (高低)							
	ガス			北側				施工完了
	自治体管路						北側	
	電柱撤去・移設							施工完了
臨港V街区 夢洲1号線 山九・上組 南側 夢洲南高架道路下	道路						歩道舗装 本復旧	
	高架橋				下部工等	上部工		
	下水（污水）			南側 北側				施工完了
	下水（雨水）					南側		
	水道（既設移設）			北側 南側				施工完了
	水道（新設）			北側				テレメータ設置については、調整中。
	NTT (MH)					北側		
	関電送配電 (特高)							施工完了
	関電送配電 (高低)							
	自治体管路							
	電柱撤去・移設							施工完了
臨港VI街区 夢洲中央線 山九・上組 西側 観光外周道路側	道路							
	鉄道 <small>駅舎部 インフラ外</small>							2024年度(R6)のインフラ外工事は、駅舎内部における建築・設備工事であり、道路上での作業はなし
	下水（雨水）							
	水道							
	NTT (MH)							
	関電送配電 (高低)							
	自治体管路							
	電柱撤去・移設							

道路・鉄道
関西電力送配電
下水道（污水・雨水）
上水道
自治体管路
NTT
ガス

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～


凡例：歩道部  自転車道部  車道部 

R5年3月現在

 破線：変更前（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議
 実線：変更後（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港VII街区 夢洲5号線 F護岸近辺	下水（汚水）				 南側			施工完了
	関電送配電（特高）			 南側				
	自治体管路					 南側		
	電柱撤去・移設							
夢洲コンテナターミナル線	道路							
	下水（汚水）			 西側（中央街区）	 西側（北街区）			施工完了
	水道							
夢洲コンテナ支線 北側 東西道路	下水（汚水）			 北側：推進				施工完了
	水道		 南側					施工完了
夢洲コンテナ支線 南側 東西道路	水道			 北側				施工完了

道路・鉄道	
関西電力送配電	
下水道（汚水・雨水）	
上水道	
自治体管路	
NTT	
ガス	

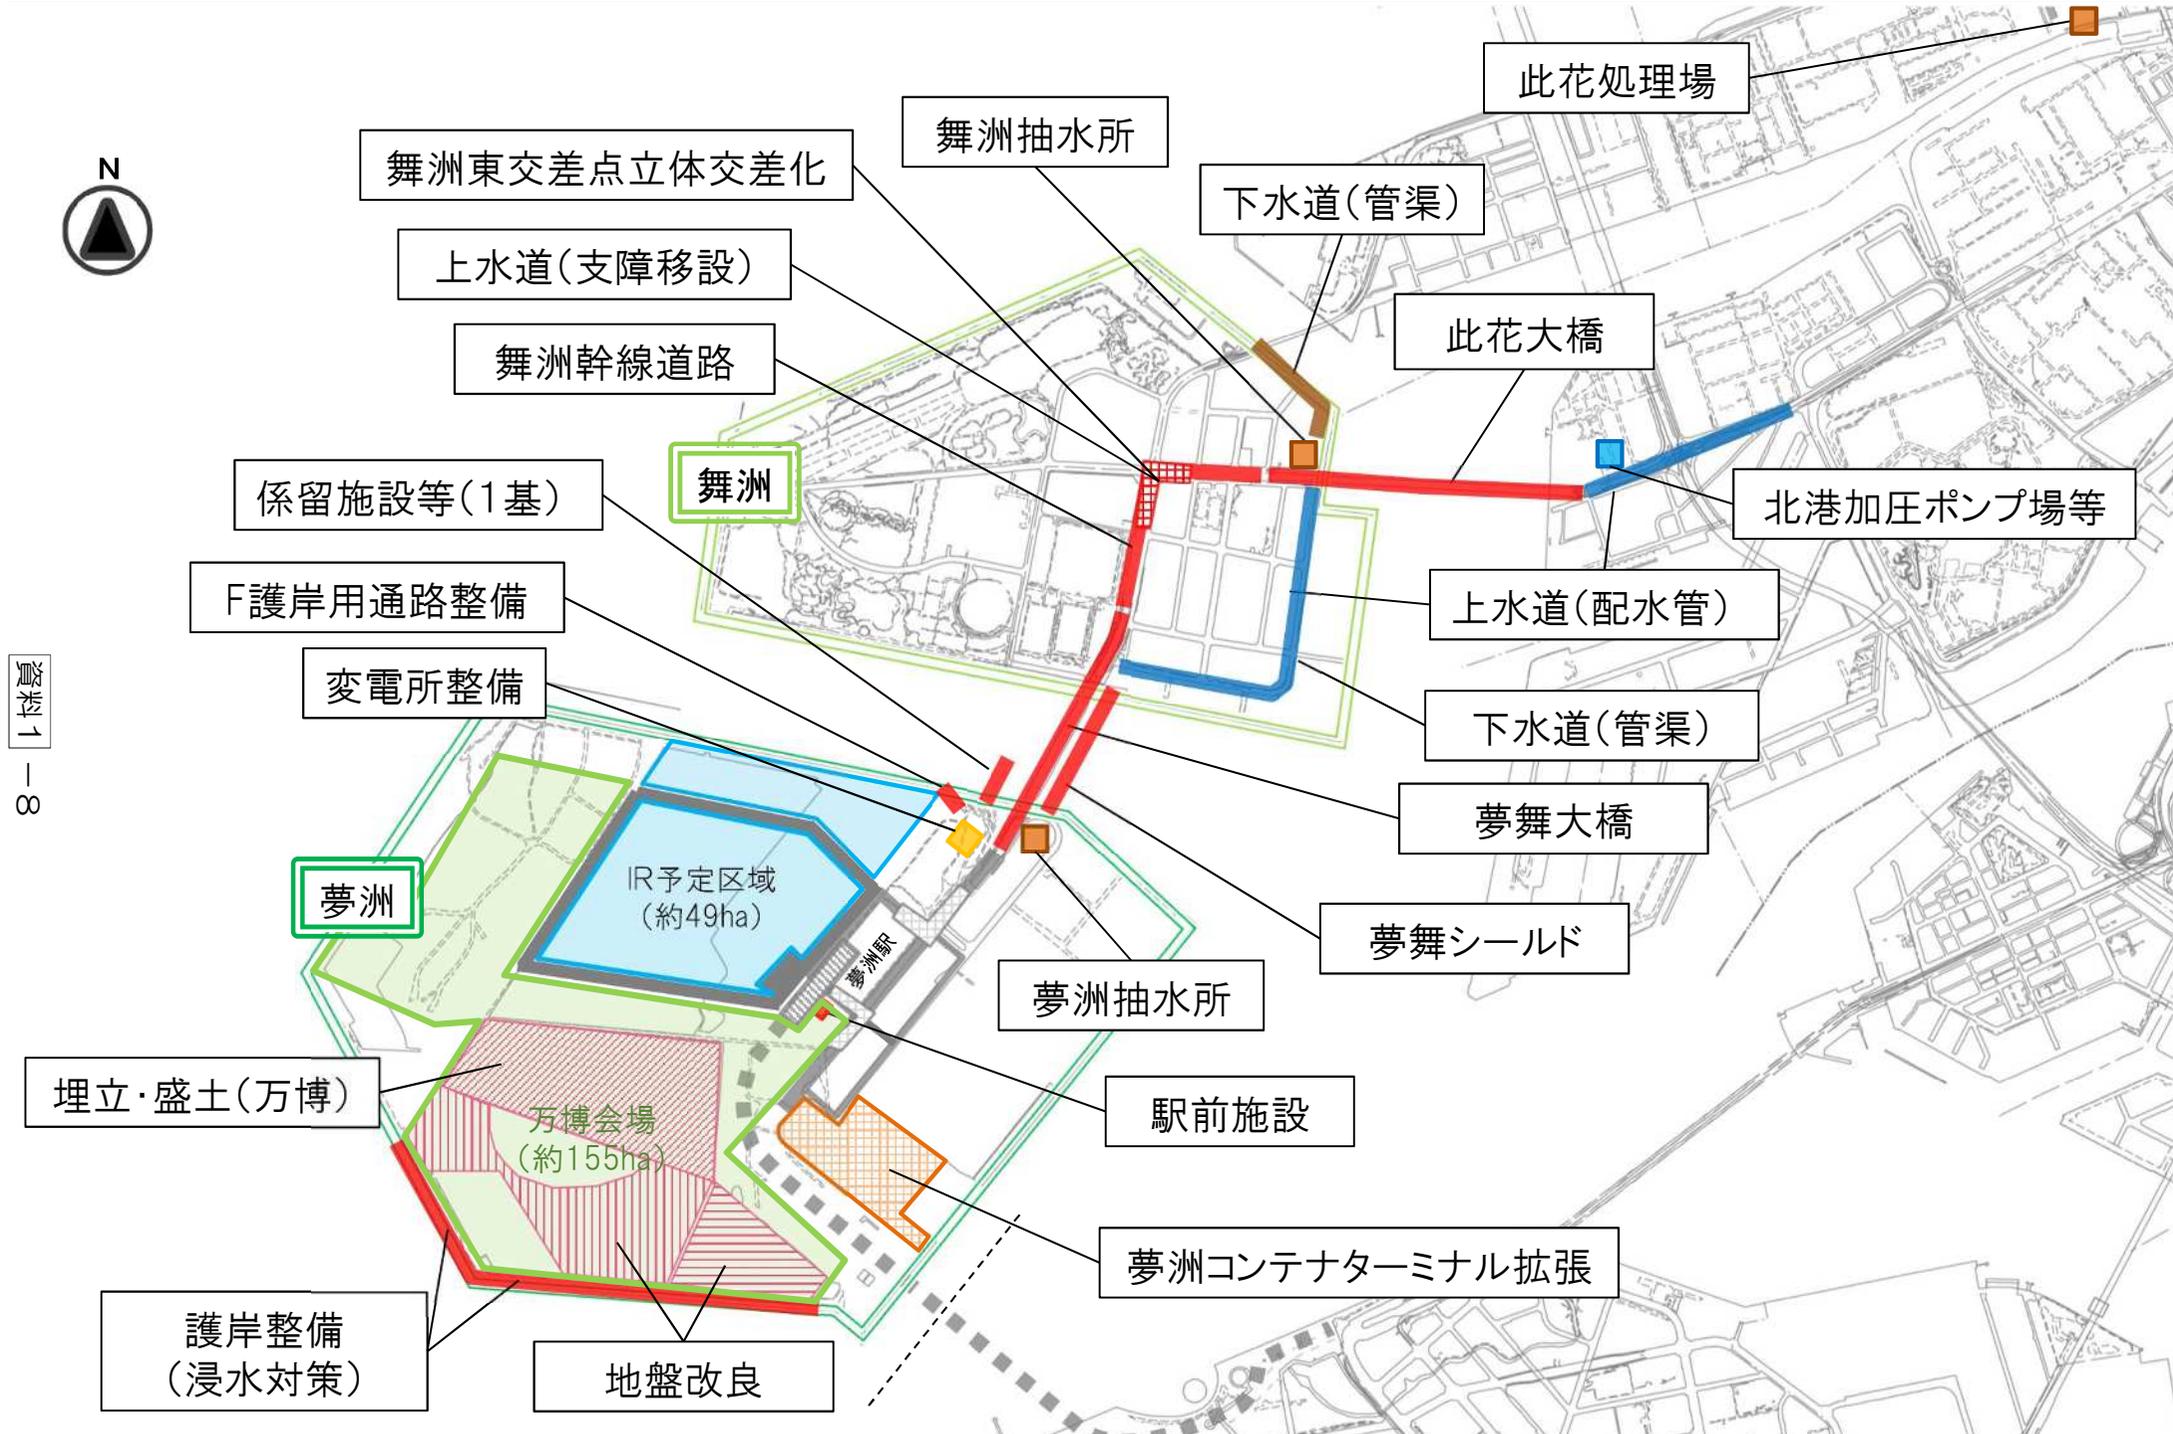

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

破線：変更前（第8回）夢洲まちづくり事業調整会議
 実線：変更後（第9回）夢洲まちづくり事業調整会議

R5年3月現在

工区		年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考	
夢洲地区	夢洲抽水所	道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道							・2024年12月末までに供用開始予定 場内復旧 ・2025年1月～3月は場内復旧予定	
	駅前施設								・2024年12月末までに工事完了 ・R6年1月以降に開業に向けた検査	
	係留施設	浮棧橋			浮棧橋				待合所	
		波除堤								契約不調による遅延 他工事への影響なし
	F護岸工事用通路									3月施工完了
	浸水対策（G・H護岸）									3月施工完了
	埋立・盛土 （万博）	盛土								施工完了
		地盤改良	南西							
	南東									施工完了
	夢洲コンテナターミナル拡張									
変電所整備									R6年度当初より電力供給開始。なお、万博開催時には、緊急時等の対応として、2系統で供給できるよう整備するもの	
舞洲地区	此花大橋	道路改良								施工完了
		塗装工事								
	舞洲幹線道路									右左折2車線化 本復旧
	舞洲東 交差点 立体交差化	立体交差化								下部工 上部工
		水道（支障移設）								下部工に伴う支障移設 施工完了
	夢舞大橋									歩道補修
	舞洲11・14・ 16・18号線	舗装工事								舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないように通行時間帯などを調整し施工するため、万博開催に影響なし
		水道工事								施工完了
		下水道管渠 （舞洲立坑～舞洲抽水所）								
	舞洲地区 排水管（ドレン）布施工事									
下水道管渠 （舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）										
舞洲抽水所									・2024年12月末までに供用開始予定 場内復旧 ・2025年1月～3月は場内復旧予定	

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

破線：変更前（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議
 実線：変更後（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議

R5年3月現在

工区		年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
夢舞 シールド	水道								施工完了
	下水 (汚水)				準備工			4月1日から供給	
	関電送配電 (特高)					管路取付 (夢洲立坑)	立金物取付 ケーブル布設		
	関電送配電 (高低圧)						ケーブル布設		
その他	此花処理場								・2024年12月末までに供用開始予定 ・2025年1月～3月は場内復旧予定
	水道	配水管							湧水発生による工程遅延 夢洲・舞洲外のため、他工事への影響なし
		北港加圧 ポンプ場等							

夢洲関連工事進捗状況

2023年2月末時点

【14】 舞洲東交差点立体交差化
令和4年7月14日 右左折2車線化済

【13】 舞洲幹線道路(4車線→6車線)
令和4年7月14日 6車線化済

【17】 係留施設等
浮棧橋設置済

【7~9】 上・下水道、電気、通信、ガス
令和2年度より施工中

【2】 埋立・盛土(IR) 済

IR施設整備

【5】 観光外周道路
令和3年度より施工中

【1】 埋立・盛土(万博) 済

日本国際博覧会会場整備
令和4年10月より基盤整備・管路(給水・汚水・電気など)工事開始

【4】 浸水対策 済
令和5年3月末施工完了

【3】 地盤改良
令和3年度より施工中

【15】 此花大橋(4車線→6車線)
令和4年10月29日 6車線化済

【16】 夢舞大橋(4車線→6車線)
令和4年8月4日 6車線化済

【6】 高架橋準備工事(迂回路)
令和4年10月30日 切替え済


【6】 高架橋(2橋)
令和3年度より施工中

【11】 駅前施設
令和5年2月より工事着手

【12】 夢洲幹線道路
令和3年度より施工中

【10】 鉄道(南ルート)
令和4年7月19日 シールド掘進開始

資料1-1-1

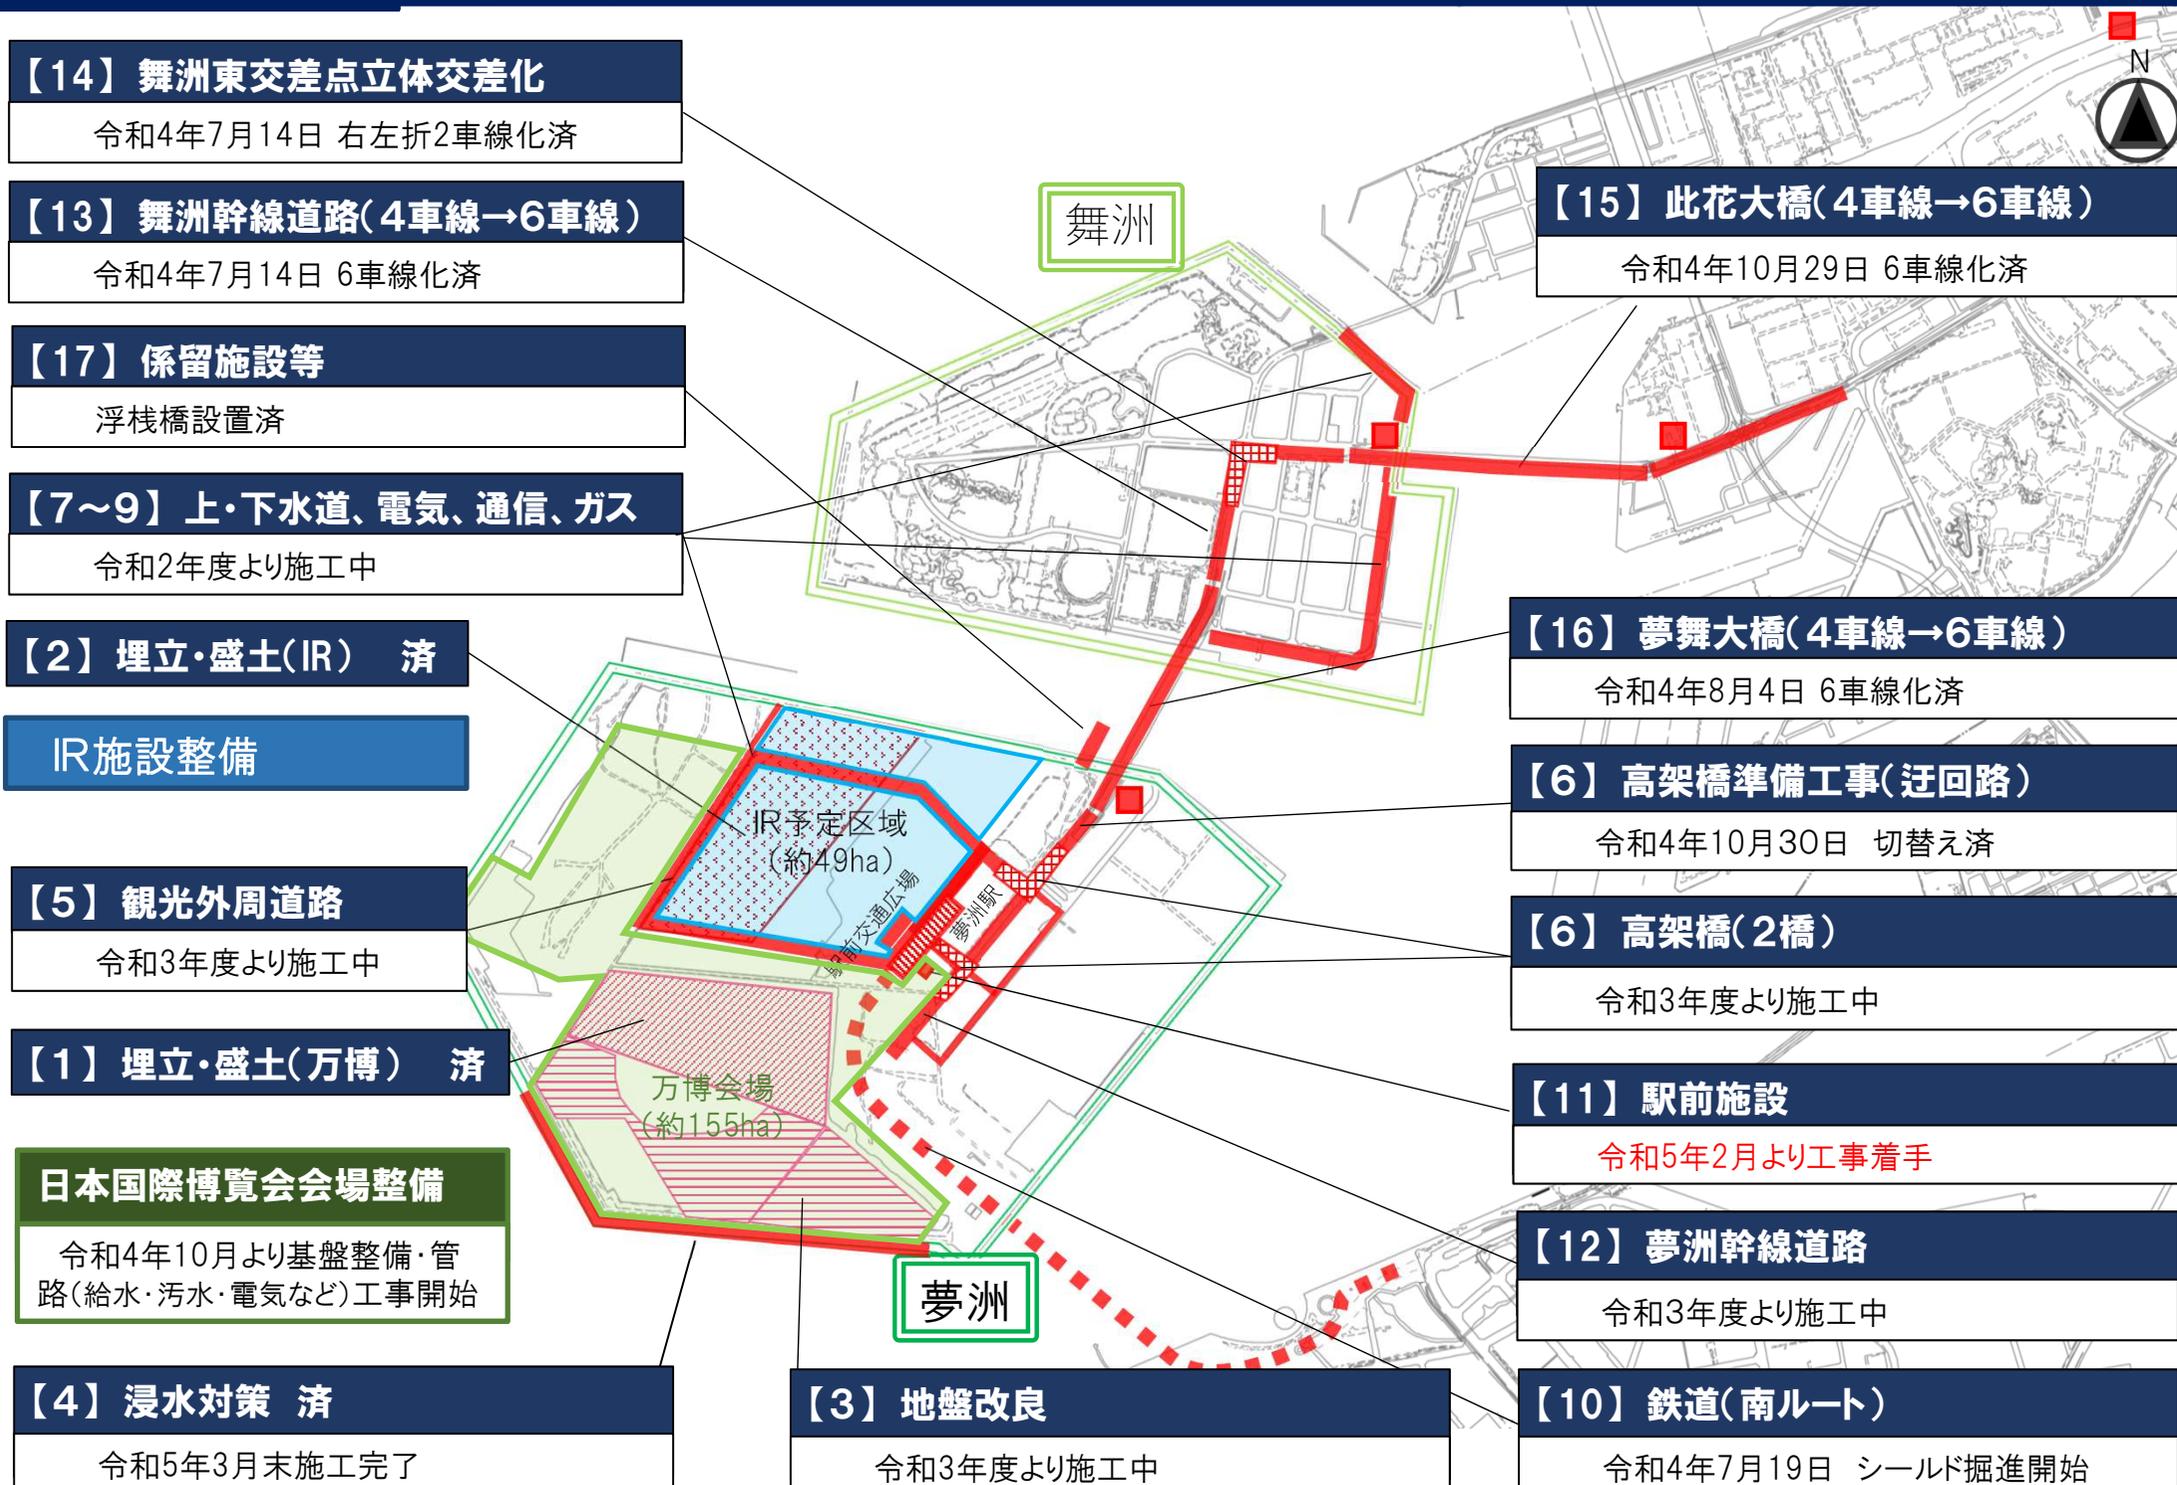

【1,2】埋立・盛土(IR・万博) 済

令和4年4月完了



【3】地盤改良

令和3年度～施工中



南東部: 令和5年2月完了



南西部: 令和4年度～施工中

【4】浸水対策 済

令和5年3月末施工完了



【5】観光外周道路

令和3年度～施工中



【6】高架橋準備工事(迂回路) 済

令和4年10月30日切り替え済

◀ 舞洲行き ▶




◀ 夢洲行き ▶



【6】高架橋(2橋)

令和3年度～施工中

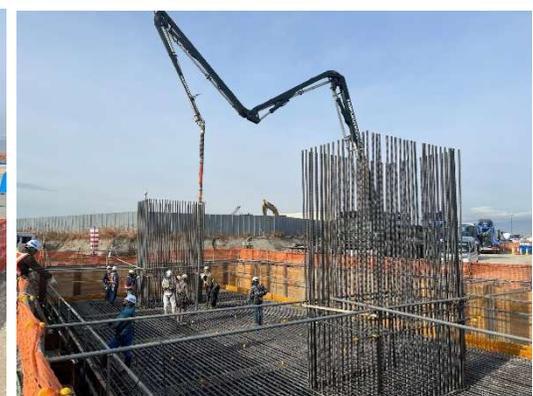

夢洲関連工事進捗状況

2023年2月末時点

【7~9】上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度～施工中




下水道管敷設状況



電気管路敷設状況

【10】鉄道(南ルート)

令和4年7月19日シールド発進

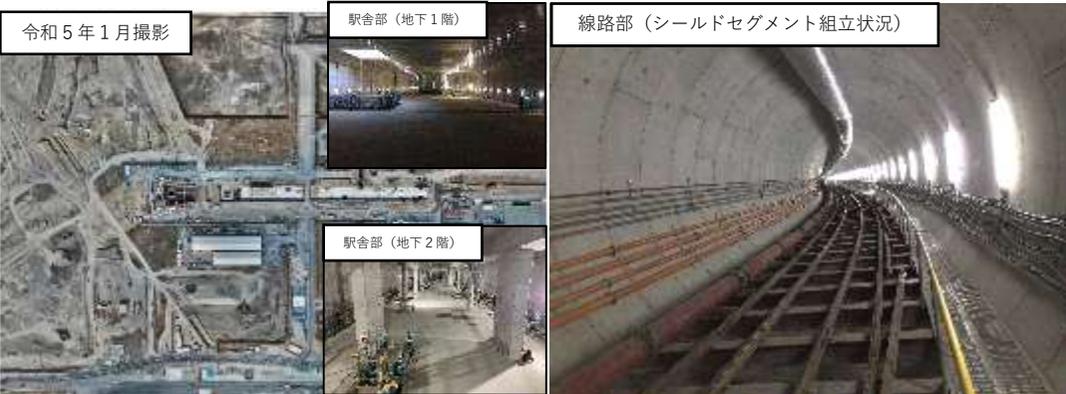

令和5年1月撮影

駅舎部(地下1階)

線路部(シールドセグメント組立状況)

駅舎部(地下2階)

【12】夢洲幹線道路

令和3年度～施工中



【13】舞洲幹線道路(4車線→6車線)

令和4年7月14日完了



施工前(2車線)



施工後(3車線)

【14】舞洲東交差点立体交差化

令和4年7月14日 右左折2車線化完成

◀ 北行き ▶



右折 2車線化

◀ 西行き ▶



左折 2車線化

【15】此花大橋(4車線→6車線)

令和4年10月29日完了



施工中(歩道舗装撤去)



施工後(3車線)

【16】 夢舞大橋(4車線→6車線) 済

令和4年8月4日完了



施工前(2車線)



施工後(3車線)

【17】 係留施設等

令和4年3月浮棧橋完成



夢洲関連工事 令和5年2月時点で稼働している工事の契約状況

令和5年2月時点で稼働している工事件数:45件

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
埋立	大阪港湾局	1	夢洲2区（南東部）土地造成工事	R3.11.2	R5.2.28	大阪・関西万博会場地となる夢洲2区における土地造成工事	五洋・ヤマト特定建設工事共同企業体
		2	夢洲2区（南西部）土地造成工事 [表層混合処理工ほか]	R4.11.30	R6.5.31	大阪・関西万博会場地となる夢洲2区における土地造成工事	五洋・南海辰村特定建設工事共同企業体
3		夢洲G・H護岸背後浸水対策工事	R4.2.3	R5.3.31	夢洲南側護岸背後における法面被覆及び胸壁設置工事	東亜・奥村組土木特定建設工事共同企業体	
下水道施設		4	夢洲2・3区雨水管整備工事	R4.8.19	R5.3.31	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事【臨港III街区】	高知建設(株)
F護岸工 用通路		5	夢洲F護岸スロープ整備等工事	R4.10.24	R5.3.31	F護岸へのアクセスを確保するための工用通路の整備工事	(株)ミナミ建設工業
駅前施設		6	(仮称)夢洲駅南東出入口整備工事	R5.1.31	R6.8.30	北港テクノポート線（仮称）夢洲駅南東出入口の土木構造物整備工事	大林・熊谷・東急・東洋 特定建設工事共同企業体
鉄道	大阪市高速電気軌道(株) (Osaka Metro)	7	北港テクノポート線 インフラ部整備工事	R2.7.3	R6.3.29	北港テクノポート線整備に伴う（仮称）夢洲駅及び夢咲トンネルまでの線路部のトンネル建設工事	大林・熊谷・東急・東洋 特定建設工事共同企業体
道路・橋梁	大阪市建設局	8	(仮称) 観光外周道路（夢洲） 舗装新設工事－1	R3.6.25	R5.3.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	山本組建設(株)
		9	(仮称) 夢洲北高架橋架設工事－1	R3.12.22	R5.9.29	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)森組
		10	(仮称) 夢洲南高架橋架設工事－1	R3.12.15	R5.9.29	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	大鉄工業(株)

夢洲関連工事 令和5年2月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
道路・橋梁	大阪市建設局	11	夢洲中央幹線外1路線道路改良工事	R3.12.15	R5.9.29	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	和興建設工業(株)
		12	(仮称) 夢洲北高架橋架設工事 - 2	R4.3.9	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	日本車輛製造(株)
		13	(仮称) 夢洲南高架橋架設工事 - 2 - 1	R4.11.14	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)IHIインフラシステム
		14	(仮称) 観光外周道路(夢洲) 舗装新設工事 - 2	R5.2.7	R6.12.27	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)シビル・エンジニアリング
I R	大阪府・大阪市 I R推進局	15	IR予定地既製杭載荷試験	-	R5.7.15	I R開業地における土壌調査	(株)竹中工務店・(株)大林組・(株)大成建設
		16	IR予定地層別沈下計設置	-	R5.9.30	I R開業地における土壌調査	(株)竹中工務店
荷捌き地 拡張	国土交通省近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所	17	大阪港北港南地区荷さばき地(C12) 整備工事	R4.10.27	R6.4.15	夢洲コンテナターミナル(C12) 荷さばき地整備	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
	阪神国際港湾株式会社 大阪事業本部	18	C12延伸部INゲートハウス棟新築 その他工事	R5.1.31	R6.3.29	夢洲コンテナターミナル(C12) 荷さばき地整備	東洋建設(株)
		19	C12延伸部OUTゲートハウス棟外新築 その他工事	R5.1.31	R6.5.31	夢洲コンテナターミナル(C12) 荷さばき地整備	東洋建設(株)
万博	公益社団法人2025年 日本国際博覧会協会	20	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事(その1)	R4.6.24	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤整備	大林組・奥村組土木興業共同企業体

夢洲関連工事 令和5年2月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
万博	公益社団法人2025年 日本国際博覧会協会	21	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その2）	R4.6.24	R5.6.30	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・本間組共同企業体
		22	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その3）	R4.6.23	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	竹中土木・森本組共同企業体
		23	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その4）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・大鉄工業共同企業体
		24	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その5）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・大鉄工業共同企業体
		25	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その6）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	熊谷組・ガイアート共同企業体
電力施設	関西電力送配電(株)	26	夢洲島内管路新設工事（1工区）	R2.5.28	R5.2.28	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電 線管路の新設工事【臨港Ⅰ、Ⅱ街区】	(株)松野組
		27	夢洲島内管路新設工事（11工区）	R4.1.24	R5.4.28	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電 線管路の新設工事【臨港Ⅶ街区】	(株)きんでん
		28	夢洲島内管路新設工事（4工区）	R4.2.7	R6.11.29	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電 線管路の新設工事【臨港Ⅲ街区】	五十嵐工業(株)
		29	夢洲内大阪広域環境施設組合 北港事務所単独地中化	R4.5.25	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電 線管路の新設工事【観光Ⅰ、Ⅱ期】	(株)かんでんエンジニアリング 大阪北支店
		30	舞洲SS内夢洲内管路新設工事	R4.8.17	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電 線管路の新設工事【臨港Ⅰ街区】	

夢洲関連工事 令和5年2月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道 施設	大阪市水道局	31	夢洲中1丁目(その4)400mm 配水管布設工事他	R4.3.22	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管 の新設工事【観光III期】	(株)福山建設
		32	北港白津1丁目外(その2)600mm 配水管敷設工事 (夢洲～舞洲共同シールド内配管)	R4.3.25	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管 の新設工事【夢舞シールド】	(株)久本組
		33	夢洲中1丁目(その5)400mm 配水管布設工事	R4.12.8	R6.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管 の新設工事【観光IV期、臨港VI街区】	井上建設興業(株)
ガス供給 施設	大阪ガス ネットワーク(株)	34	大阪・関西万博(III期)	R4.9.8	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等へのガス導管の新設 工事【観光III期】	日鉄パイプライン & エンジニアリング(株)
		35	大阪・関西万博(IV期)	R4.9.8	R6.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等へのガス導 管の新設工事【観光IV期】	
		36	夢洲観光II期道路先行工事	R4.12.21	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等へのガス導 管の新設工事【観光II期】	JFEエンジニアリング(株)
下水道 施設	日本下水道事業団	37	大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事 その3	R.3.12.16	R7.3.31	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事 【観光II期・IV期、臨港II・III・VII街区、 夢洲コンテナターミナル線、夢舞シールド、舞洲14・16・18 号線、夢洲抽水所、舞洲抽水所】	大林・大本・久本JV
通信施設	エヌ・ティ・ティ・インフ ラネット(株)	38	大阪北総22RN0001電気通信設備工事 此花ビル舗装先行工事(夢洲)	R4.4.13	R6.6.10	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への地中電 気通信管路の新設工事	エクシオグループ(株)
自治体 管路	大阪港湾局 (関西電力送配電(株))	39	夢洲自治体管路新設工事	R3.3.17	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	(株)かんでんエンジニアリング大阪北支店
	大阪港湾局 (エヌ・ティ・ティ・インフ ラネット(株))	40	夢洲自治体管路新設工事	R3.4.23	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	エクシオグループ(株)

夢洲関連工事 令和5年2月時点で稼働している工事の契約状況

【舞洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
道路・橋梁	大阪市建設局	41	舞洲東高架橋整備に伴う 道路照明設備改良工事	R4.9.15	R5.5.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)三好電気商会
		42	(仮称) 舞洲東高架橋架設工事 - 1	R4.12.14	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)森組
		43	(仮称) 舞洲東高架橋架設工事 - 2	R4.12.16	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	日本ファブテック(株)
上水道 施設	大阪市水道局	44	北港白津1丁目外600mmその他配水管布設工 事他	R3.3.16	R5.2.28	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管の新設工事【舞洲1・14・16号線】	明雄建設(株)

【その他地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道 施設	大阪市水道局	45	此花枝管600mm配水管布設工事他	R3.3.9	R5.8.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管の新設工事	(株)ケンセイ
