

夢洲関連部会及びワーキングにおける R5年度の取り組みについて

令和5年10月20日
大阪市建設局

夢洲関連部会及びワーキングの取組みについて（R5年度3月以降）

■埋設調整部会

○取組状況

	第16回	第17回	第18回
日時	R5. 4. 14	R5. 6. 28	R5. 10. 5

○取組内容

- ・ 工事輻輳箇所のインフラ埋設管路の調整
- ・ 埋設管路の離隔詳細協議など

■工程調整部会

○取組状況

	第20回	第21回
日時	R5. 6. 28	R5. 10. 5

○取組内容

- ・ 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整
- ・ 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況

	第29回	第30回	第31回	第32回	第33回	第34回	第35回
日時	R5. 3. 22	R5. 4. 25	R5. 5. 23	R5. 6. 27	R5. 7. 25	R5. 8. 22	R5. 9. 26

○取組内容

- ・ 安全推進協議会の実施（西野田労働基準監督署による現地視察、講義）
- ・ 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
- ・ 工事車両運行時のルールの共有など

夢洲関連事業の計画工程について

○各工事の進捗状況


- 施工現場間での工程調整に伴い、計画工程に若干の変更が生じているものの、概ね計画工程どおり工事が進捗
- 万博会場の準備や後期終盤における工事車両の増加に対応するため、インフラ施設の整備を令和6年12月末までに完了させるが、1日でも早い完成を目指していく
- (仮称)夢洲北高架橋の完成時期について、令和6年9月末に前倒しを行い、工事車両の通行に活用

○令和5年度における工事輻輳箇所の工程管理(取り組み継続)

- 地下鉄駅工事現場付近における埋設管路工事においては、地下鉄工事が完了した区間から各事業者が順次、期間内に工事を完了させる必要があることから、これまで以上に工程の管理を徹底していく。


【工程管理の取組み】

- ・1週間ごとの進捗状況確認
- ・別途工程管理、進捗状況表の作成、各事業者への共有

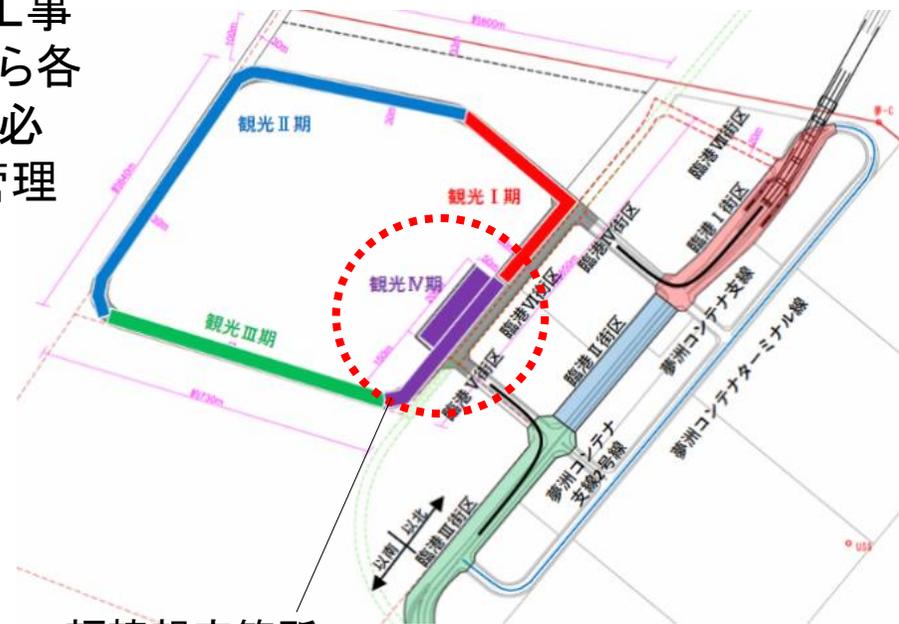

輻輳想定箇所

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

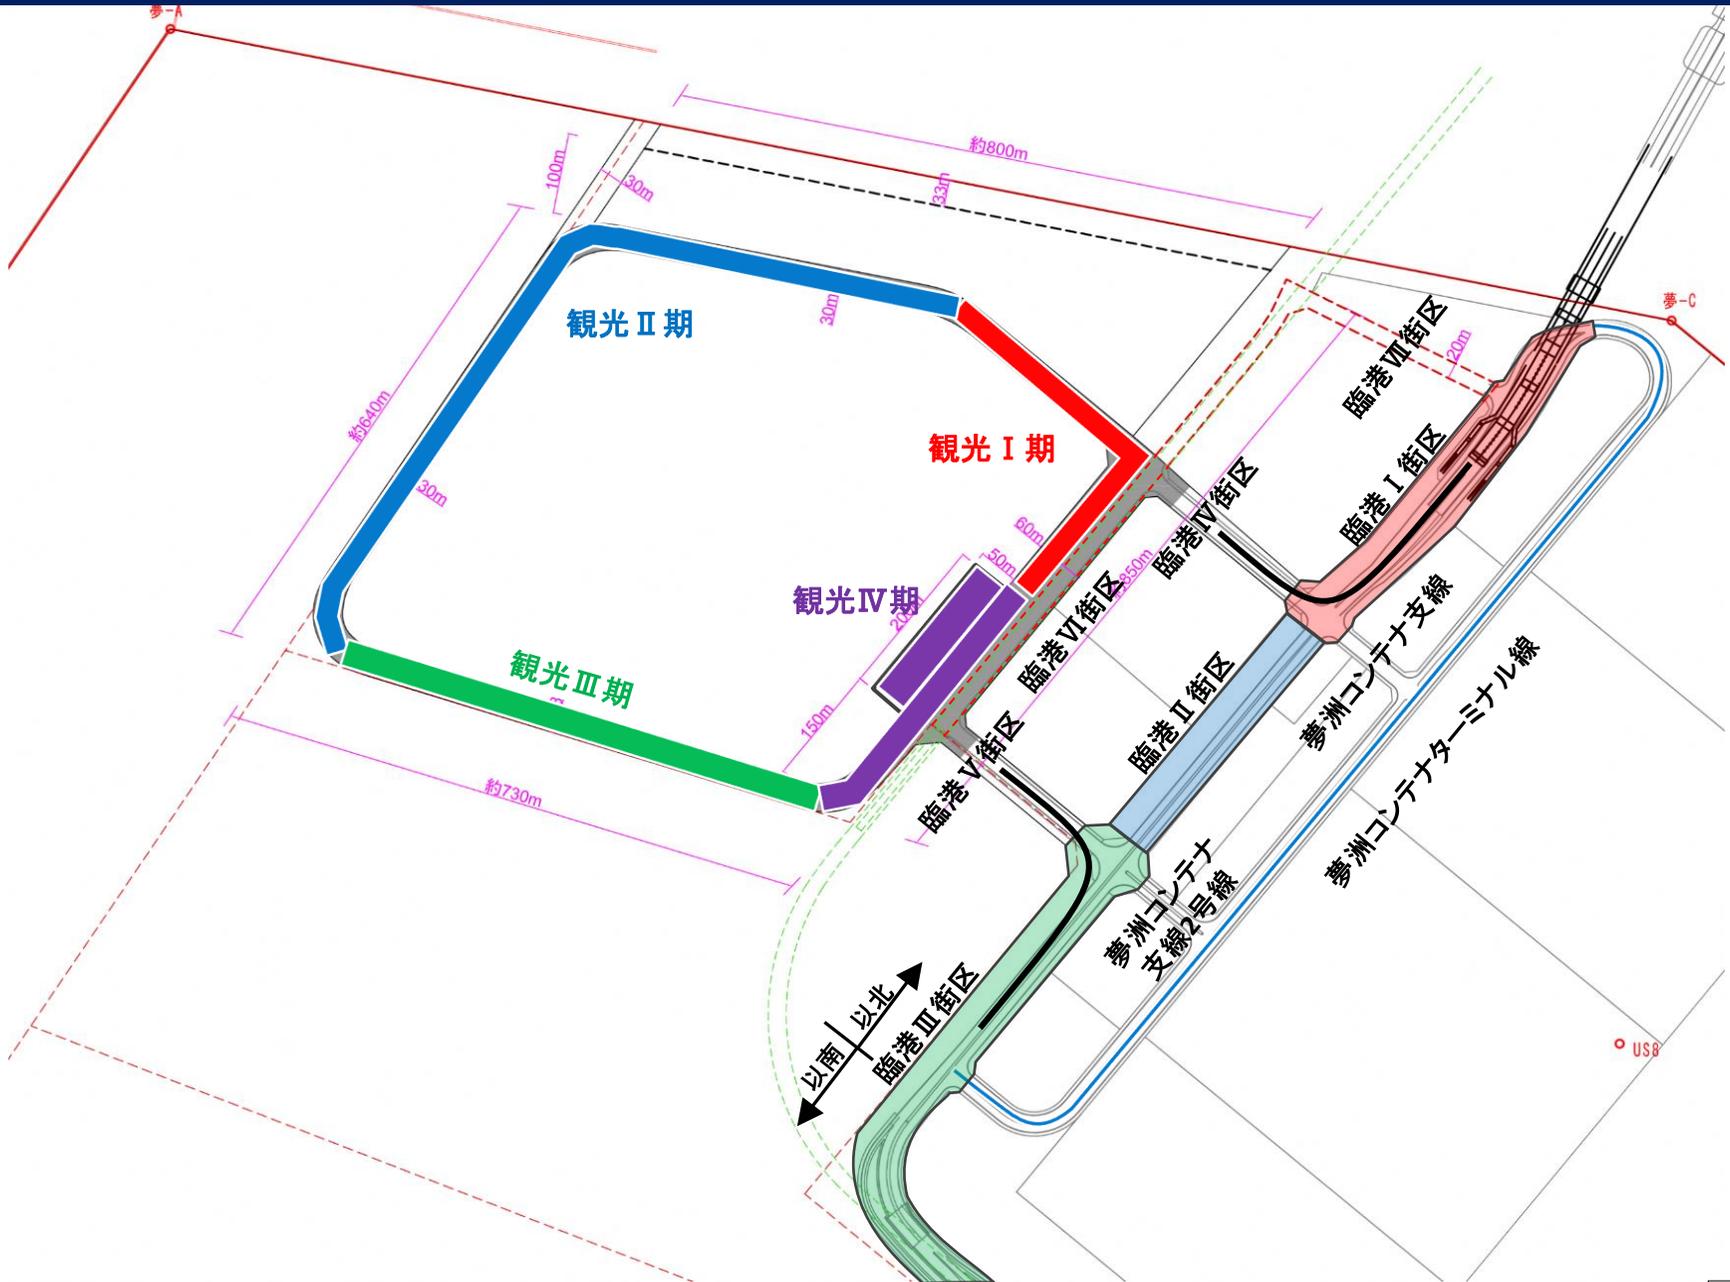

※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年10月現在

破線：変更前（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第10回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
観光Ⅰ期 (北・東)	道路			基層まで施工		歩道舗装・道路付属物等	表層	
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)							施工完了
	水道							施工完了
	NTT (MH)							施工完了
	関電送配電(特高)							施工完了
	関電送配電(高低)							施工完了
	ガス							施工完了
観光Ⅱ期 (北・西)	道路				基層まで施工	歩道舗装・道路付属物等	表層	
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)							施工完了
	水道							施工完了
	NTT (MH)							施工完了
	関電送配電(特高)							施工完了
	関電送配電(高低)							施工完了
	ガス							施工完了
観光Ⅲ期 (南) (万博敷地側)	道路						車道・歩道・道路付属物等	
	下水(汚水)							施工完了
	下水(雨水)							施工完了
	水道							施工完了
	NTT (MH)							施工完了
	ガス							施工完了
観光Ⅳ期 (東) (駅前交通広場前)	道路						車道・歩道・道路付属物等	
	鉄道 駅舎部 地下横断通路							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							
	水道							
	NTT (MH)							
	ガス							
	雨水撤去							
観光Ⅰ～Ⅳ期 土地改良事業 (液状化対策工事)	大阪IR(雨水)							大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業
	大阪IR(上水)							

※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年10月現在

破線：変更前（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第10回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考	
臨港I街区 夢洲中央幹線:北側(夢舞大橋側)	道路						本復旧 舗装	道路工事の舗装に高架橋舗装の工程も含んだ表現であったため、今回、高架橋に舗装工程を示す。北高架橋は、上部工事を前倒し、早まった分に橋面舗装を実施し、令和6年9月末完成予定	
	北高架橋				下部工事 上部工		橋面舗装		
	下水(汚水)		西側 夢舞大橋取付高架橋下:推進						施工完了
	NTT (MH)								施工完了
	関西送配電(特高)		西側		西側(残工事)				施工完了
	関西送配電(高低)								施工完了
	ガス		東側(支障移設)						施工完了
	電柱撤去・移設		東側		西側				施工完了
臨港II街区 夢洲中央幹線:中央	道路						歩道舗装 本復旧		
	下水(汚水)			西側				施工完了	
	NTT (MH)					西側		施工完了	
	関西送配電(特高)		西側	西側(残工事)				施工完了	
臨港III街区 以北 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路						舗装	道路工事の舗装に高架橋舗装の工程も含んだ表現であったため、今回、高架橋に舗装工程を示す。	
	南高架橋				下部工事 上部工				
	下水(汚水)		西側(高架橋以北)						施工完了
	下水(雨水)								
	NTT (MH)					西側			施工完了
	関西送配電(特高)		西側(高架橋以北)						施工完了
	自治体管路			西側(高架橋以南~咲州トンネル区間)					施工完了
電柱撤去・移設									
臨港III街区 以南 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路								
	下水(汚水)							施工完了	
	下水(雨水)							施工完了	
	NTT (MH)					西側		施工完了	
	関西送配電(特高)			西側(高架橋以南)				施工完了(道路部)	
	自治体管路			西側(高架橋以南~咲州トンネル区間)				施工完了	
	電柱撤去・移設								

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道(汚水・雨水)

上水道

自治体管路

NTT

ガス

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年10月現在

破線：変更前（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第10回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港IV街区 夢洲2号線 山九・上組 北側 夢洲北高架道路下	道路						歩道舗装 本復旧 舗装	再掲
	北高架橋				下部工事	上部工	橋面舗装	再掲
	下水（汚水）			南側				施工完了
	下水（雨水）					北側		
	水道							施工完了
	NTT (MH)			南側	南側 (残工事)	南側		
	関電送配電 (特高)							施工完了
	関電送配電 (高低)							
	ガス			北側			北側	施工完了
	自治体管路							
電柱撤去・移設								施工完了
臨港V街区 夢洲1号線 山九・上組 南側 夢洲南高架道路下	道路						歩道舗装 本復旧	再掲
	南高架橋				下部工事	上部工	舗装	
	下水（汚水）		南側 北側			南側		施工完了
	下水（雨水）					南側		
	水道（既設移設）		北側 南側					施工完了
	水道（新設）		北側					夢洲南高架橋工事との工程調整を踏まえ、臨港V街区からコンテナ支線に設置位置を変更。
	NTT (MH)					北側		
	関電送配電 (特高)							施工完了
	関電送配電 (高低)							
	自治体管路							
電柱撤去・移設								施工完了
臨港VI街区 夢洲中央線 山九・上組 西側 観光外周道路側	道路							
	鉄道 駅舎部 インフラ外							2024年度(R6)のインフラ外工事は、駅舎内部における建築・設備工事であり、作業内容を精査した結果、道路用地での施工ヤード使用及び工事車両の通行等は令和7年1月末までに完了する見込みとなった
	下水（雨水）							施工完了
	水道							施工完了
	NTT (MH)							
	関電送配電 (高低)							施工完了
	自治体管路					東側		
	雨水撤去							
電柱撤去・移設								

道路・鉄道
 関西電力送配電
 下水道（汚水・雨水）
 上水道
 自治体管路
 NTT
 ガス

※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

R5年10月現在

破線：変更前（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議
 実線：変更後（第10回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港VII街区 夢洲5号線 F護岸近辺	下水（污水）							施工完了
	関電送配電（特高）							照明柱等復旧他、舗装復旧
	自治体管路							
	電柱撤去・移設							
夢洲コンテナターミナル線	道路							
	下水（污水）							
	水道							施工完了
	ガス							
夢洲コンテナ支線 北側 東西道路	下水（污水）							施工完了
	水道							→夢洲南高架橋工事との工程調整を踏まえ、臨港V街区からコンテナ支線に設置位置を変更。 →設置位置の変更に併せて、工程についても再検討を行い、R5.10～R6.12へ変更。 →機器製作に期間を要する都合上、機器設置工事（掘削なし）はR6秋以降に実施。 基礎工事及び配管工事（掘削あり）はR5秋から先行して実施。
夢洲コンテナ支線 南側 東西道路	水道							施工完了

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（污水・雨水）

上水道

自治体管路

NTT

ガス

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事） ～整備箇所図～



夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

R5年10月現在

破線：変更前（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議
 実線：変更後（第10回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考	
夢洲地区	夢洲抽水所	道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道						場内復旧 場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定	
	駅前施設							・2024年12月末までに工事完了 ・R6年1月以降に開業に向けた検査	
	係留施設	浮棧橋			浮棧橋			待合所	
		波除堤							R6.6⇒R6.8 工程の見直しによる遅延 他工事への影響なし
	F護岸工事用通路								施工完了
	浸水対策（G・H護岸）								施工完了
	埋立・盛土 （万博）	盛土							施工完了
		地盤改良							施工完了
	夢洲コンテナターミナル拡張								
	変電所整備								R6年度当初より電力供給開始。なお、万博開催時には、緊急時等の対応として、2系統で供給できるよう整備するもの
舞洲地区	此花大橋	道路改良						施工完了	
	舞洲幹線道路					右左折2車線化		本復旧	
	舞洲東 交差点 立体交差化	立体交差化					下部工	上部工	
		水道（支障移設）					下部工に伴う支障移設		施工完了
	夢舞大橋							歩道補修	
	舞洲11・14・ 16・18号線	舗装工事							舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないよう通行時間帯などを調整し施工するため、万博開催に影響なし
		水道工事							施工完了
		下水道管渠 （舞洲立坑～舞洲抽水所）							
	舞洲地区 排水管（ドレン）設置工事								
	舞洲給水塔 追加塩素注入設備改良工事								水道局単独工事であり、万博開催期間の給水に影響なし
下水道管渠 （舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）								施工完了	
舞洲抽水所								場内復旧 場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定	

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

R5年10月現在

破線：変更前（第9回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第10回）夢洲等まちづくり事業調整会議

工区		年度	2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
夢舞 シールド	水道								施工完了
	下水（汚水）				準備工			4月1日から供給	施工完了
	関電送配電（特高）					管路取付（夢洲立坑）	立金物取付	ケーブル布設	
	関電送配電（高低圧）							ケーブル布設	
	NTT（通信ケーブル）							ケーブル布設	
その他	此花処理場								場内復旧 場内復旧も含めて2024年12月末までに供用開始予定
	水道	配水管							工程を精査し1ヶ月の工期短縮が可能となった
		北港加圧 ポンプ場等							水道局単独工事であり、万博開催期間の給水に影響なし

夢洲関連工事進捗状況

2023年9月末時点

【14】舞洲東交差点立体交差化

令和4年7月14日 右左折2車線化済

【13】舞洲幹線道路(4車線→6車線)

令和4年7月14日 6車線化済

【17】係留施設等

令和4年3月末 浮棧橋設置済

【7~9】上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度より施工中

【2】埋立・盛土(IR) 済

IR施設整備

【5】観光外周道路

令和3年度より施工中

【1】埋立・盛土(万博) 済

日本国際博覧会会場整備

令和4年10月より基盤整備・管路(給水・汚水・電気など)工事開始

【4】浸水対策 済

令和5年3月末施工完了

【3】地盤改良

令和3年度より施工中

【15】此花大橋(4車線→6車線)

令和4年10月29日 6車線化済

【16】夢舞大橋(4車線→6車線)

令和4年8月4日 6車線化済

【6】高架橋(2橋)

令和3年度より施工中

【11】駅前施設


令和5年2月より工事着手

【12】夢洲幹線道路

令和3年度より施工中

【10】鉄道(南ルート)

令和5年5月24日 シールド到達

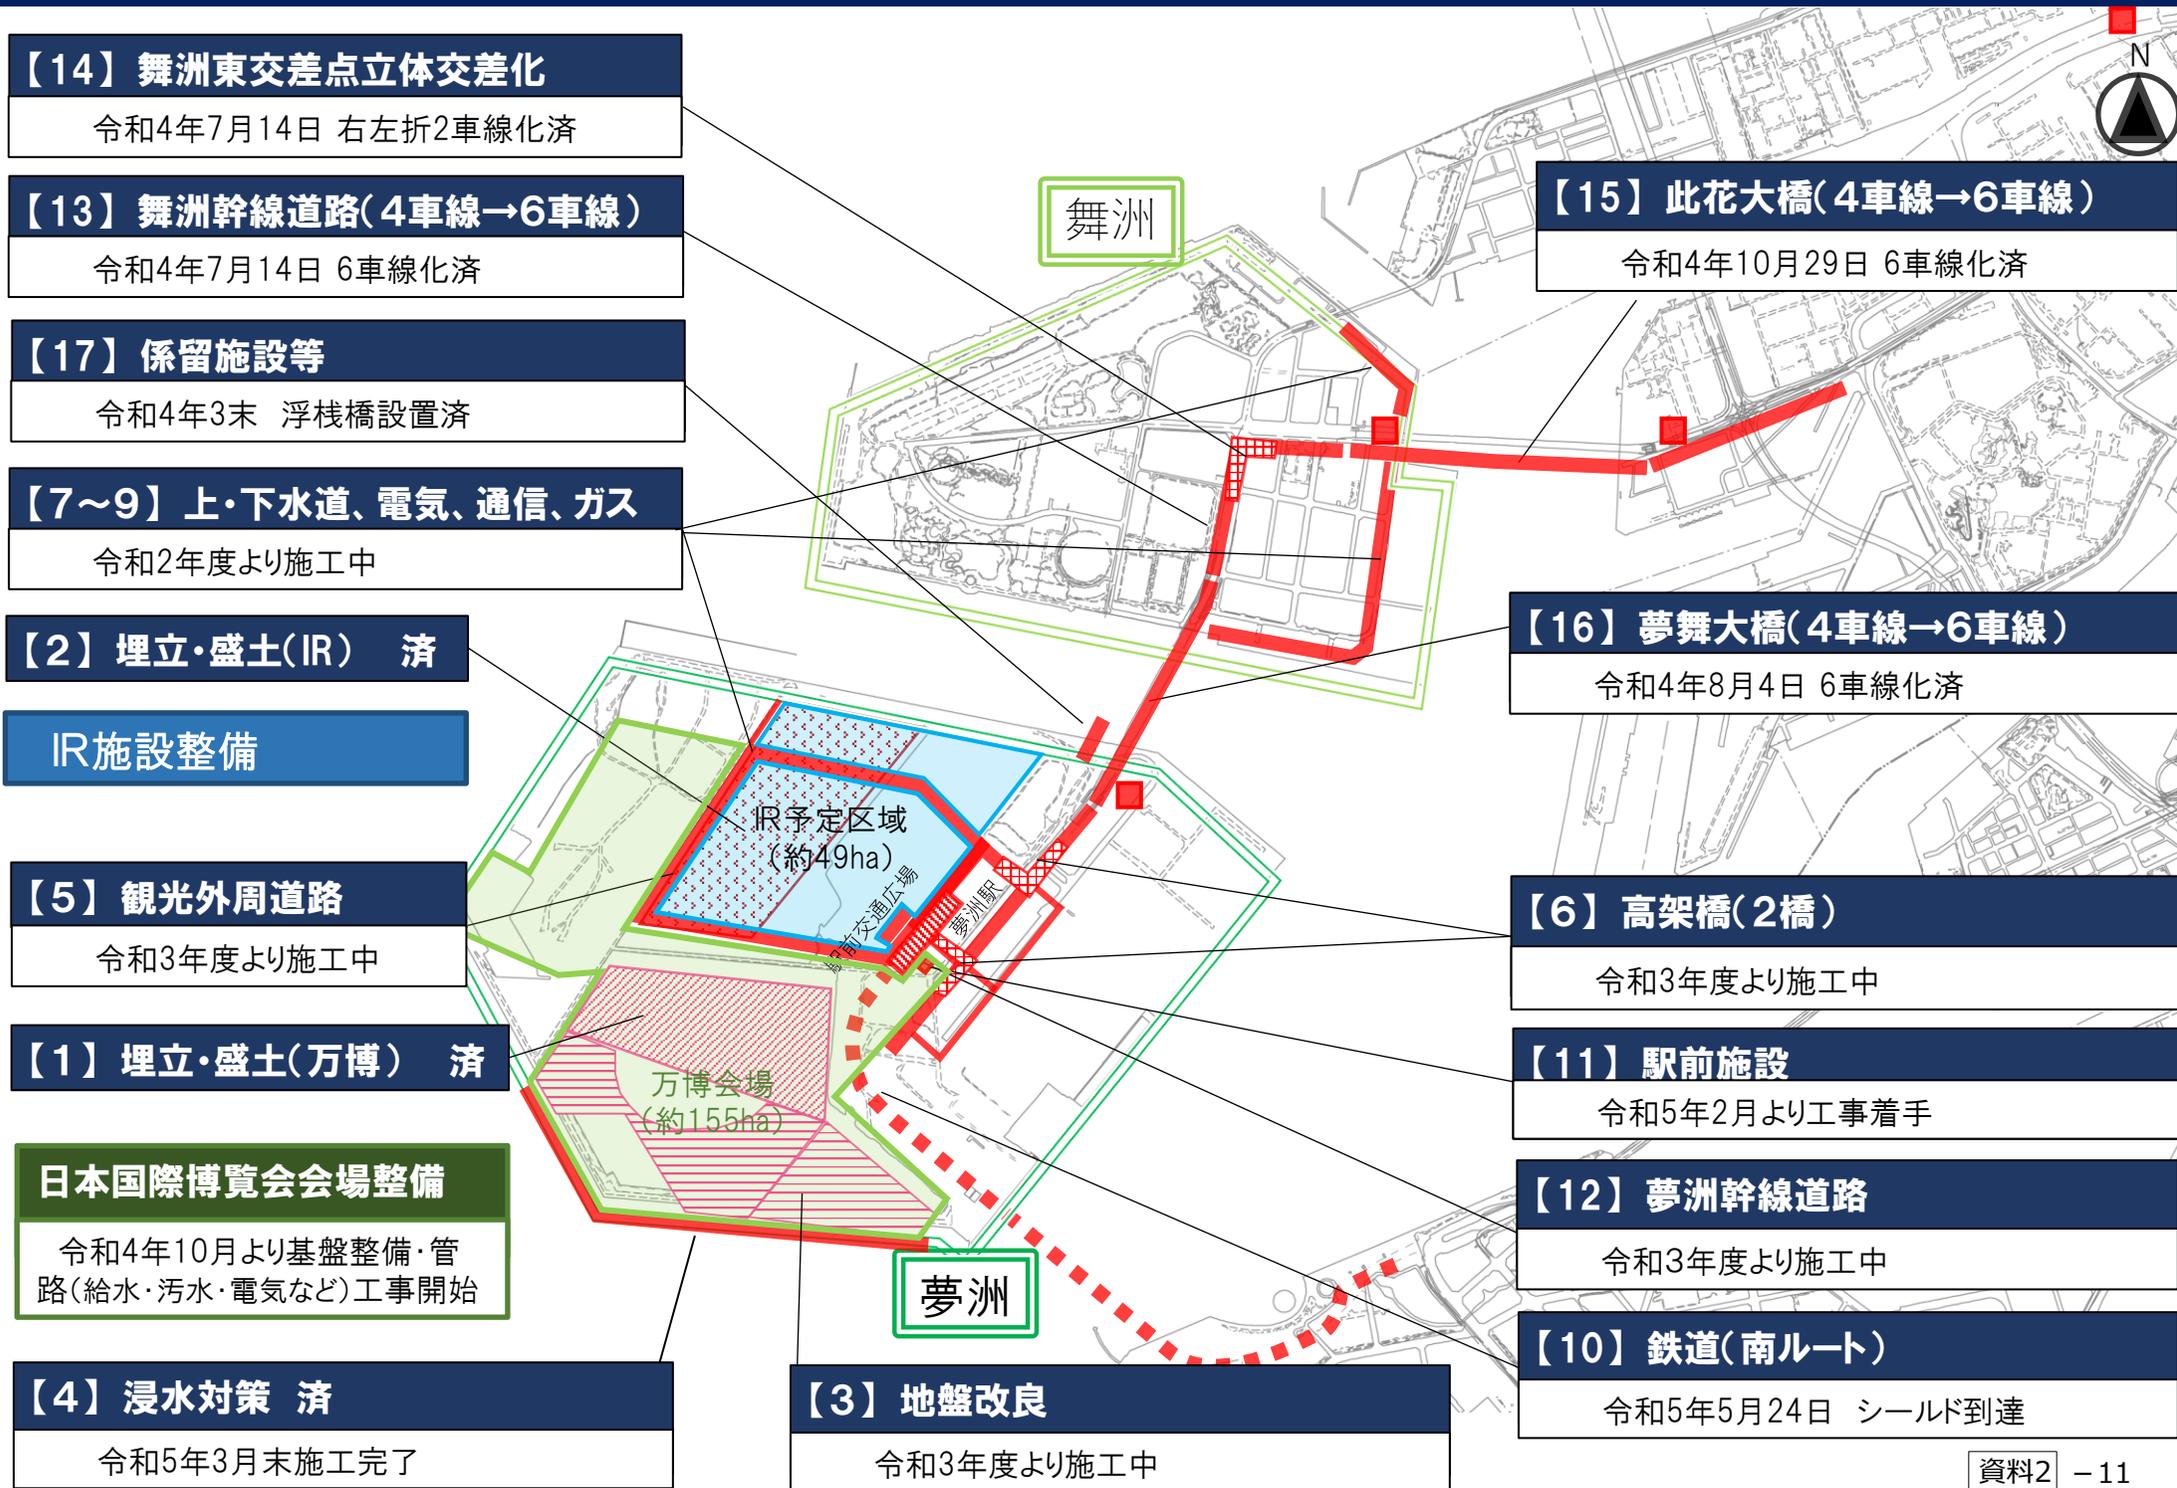

【1,2】埋立・盛土(IR・万博)

令和4年4月完了



【3】地盤改良

令和3年度～施工中



【4】浸水対策

令和5年3月末施工完了



【5】観光外周道路

令和3年度～施工中



【6】高架橋(2橋)

令和3年度～施工中

南高架橋



北高架橋



【7～9】上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度～施工中




【10】 鉄道(南ルート)

令和5年5月24日シールド到達



【11】 駅前施設

令和4年度～施工中

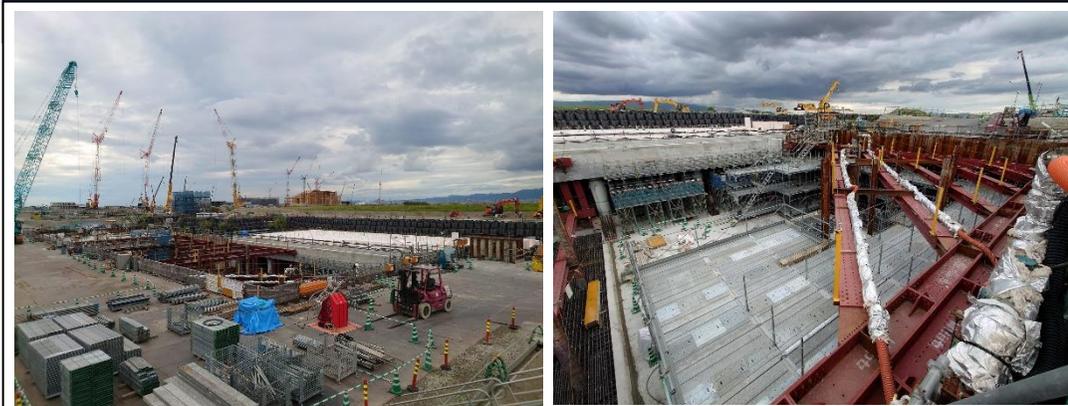

【12】 夢洲幹線道路

令和3年度～施工中




【13】 舞洲幹線道路(4車線→6車線)

令和4年7月14日完了



【14】 舞洲東交差点立体交差化

令和4年度～施工中

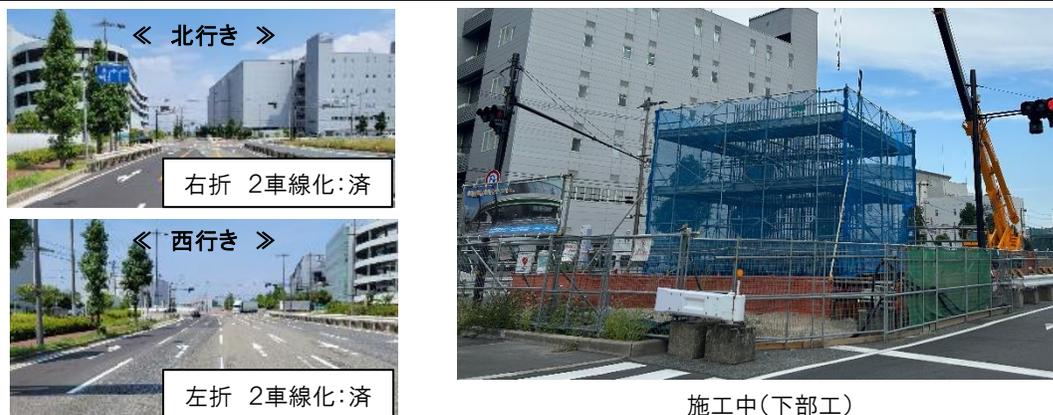

【15】 此花大橋(4車線→6車線)

令和4年10月29日完了



夢洲関連工事 令和5年10月時点で稼働している工事の契約状況

令和5年10月時点で稼働している工事件数：58件（未契約件数28件）

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
埋立	大阪港湾局	1	夢洲2区（南西部）土地造成工事 [表層混合処理工ほか]	R4.11.30	R6.5.31	大阪・関西万博会場地となる夢洲2区における土地造成工事	五洋・南海辰村特定建設工事共同企業体
		2	夢洲2区（南東部）盛土及びその他工事	R5.1.20	R5.12.28	夢洲2区（南東部）における土砂受入れに伴う盛土工事	鳳工業(株)
		3	夢洲域内余水吐補修工事	R5.9.12	R6.3.29	余水吐の補修	(株)マルエイ
下水道施設		4	夢洲2・3区雨水管整備工事	R4.8.19	R5.3.31	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事【臨港Ⅲ街区】	高知建設(株)
		5	夢洲3区雨水管整備工事 (夢洲1号線・2号線)	R5.6.2	R6.2.29	夢洲1号線・2号線における雨水管渠の築造工事	(有)eau
波除堤		6	夢洲F護岸波除堤整備工事（その1-3）	R5.2.24	R5.12.28	夢洲F護岸の浮桟橋整備に伴う波除堤整備工事	ヤマト工業(株)
		7	夢洲F護岸波除堤整備工事（その2）	R5.8.18	R6.8.30	夢洲F護岸の浮桟橋整備に伴う波除堤整備工事	ヤマト工業(株)
港湾道路		8	夢洲コンテナターミナル 背後道路等改良工事	R5.7.5	R6.3.29	夢洲コンテナターミナル背後の道路改良	互栄土木建設(株)
駅前施設		9	(仮称)夢洲駅南東出入口整備工事	R5.1.31	R6.8.30	北港テクノポート線（仮称）夢洲駅南東出入口の土木構造物整備工事	大林・熊谷・東急・東洋 特定建設工事共同企業体
		10	(仮称) 夢洲駅南東出入口昇降機設備工事	R5.8.7	R7.2.28	北港テクノポート線（仮称）夢洲駅南東出入口のエスカレーター・エレベーター設備工事	フジテック(株)

夢洲関連工事 令和5年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
鉄道	大阪市高速電気軌道(株) (Osaka Metro)	11	北港テクノポート線 インフラ部整備工事	R2.7.3	R6.3.29	北港テクノポート線整備に伴う(仮称)夢洲駅及び 夢咲トンネルまでの線路部のトンネル建設工事	大林・熊谷・東急・東洋 特定建設工事共同企業体
		12	北港テクノポート線 インフラ外部整備工事	R3.9.3	R7.1.31	北港テクノポート線整備に伴う夢洲駅及び夢咲トン ネルまでの線路部の鉄道施設建設工事	—
道路・橋梁	大阪市建設局	13	(仮称) 夢洲北高架橋架設工事－ 1	R3.12.22	R6.1.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづく り構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた 基盤整備	(株)森組
		14	(仮称) 夢洲北高架橋架設工事－ 2	R4.3.9	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづく り構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた 基盤整備	日本車輛製造(株)
		15	(仮称) 夢洲南高架橋架設工事－ 2－ 1	R4.11.14	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづく り構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた 基盤整備	(株)IHIインフラシステム
		16	夢洲中央幹線外 3 道路照明設備改修工事	R5.8.25	R6.12.27	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづく り構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた 基盤整備	松田電気工業(株)
		17	夢舞大橋高欄設置その他工事	R5.9.13	R6.2.29	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづく り構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた 基盤整備	ファースト建設(株)
IR	大阪IR(株)	18	IR予定地層別沈下計測	-	R6.9.30	IR開業地における地盤沈下計測業務	(株)竹中工務店
荷捌き地 拡張	国土交通省近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所	19	大阪港北港南地区荷さばき地(C12) 整備工事	R4.10.27	R6.4.15	夢洲コンテナターミナル(C12) 荷さばき地整備	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
	阪神国際港湾株式会社 大阪事業本部	20	C12延伸部INゲートハウス棟新築 その他工事	R5.1.31	R6.3.29	夢洲コンテナターミナル(C12) 荷さばき地整備	東洋建設(株)

夢洲関連工事 令和5年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
荷捌き地 拡張	阪神国際港湾株式会社 大阪事業本部	21	C12延伸部OUTゲートハウス棟外新築 その他工事	R5.1.31	R6.5.31	夢洲コンテナターミナル（C12）荷さばき地整備	東洋建設(株)
万博	公益社団法人2025年 日本国際博覧会協会	22	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その1）	R4.6.24	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・奥村組土木興業共同企業体
		23	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その3）	R4.6.23	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	竹中土木・森本組共同企業体
		24	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その4）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・大鉄工業共同企業体
		25	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その5）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・大鉄工業共同企業体
		26	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その6）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	熊谷組・ガイアート共同企業体
		27	2025年日本国際博覧会協会 電気供給施設運用等委託業務	R4.9.7	R8.3.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、電気供給 施設運用	関西電力送配電・きんでん・ ダイヘン共同企業体
		28	2025年日本国際博覧会協会 施設整備事業 PW北東工区	R5.4.1	R7.2.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、施設整備	大林組・大鉄工業・TSUCHIYA共同企業体
		29	2025年日本国際博覧会協会 施設整備事業 PW南東工区	R5.4.1	R7.2.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、施設整備	清水・東急・村本・青木あすなろ 共同企業体
		30	2025年日本国際博覧会協会 施設整備事業 PW西工区	R5.4.1	R7.2.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、施設整備	竹中工務店・南海辰村建設・ 竹中土木共同企業体

夢洲関連工事 令和5年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
万博	公益社団法人2025年 日本国際博覧会協会	31	2025年日本国際博覧会協会 施設整備事業 GW工区	R5.4.1	R7.2.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、施設整備	鹿島建設・飛鳥建設共同企業体
電力施設	関西電力送配電(株)	32	夢洲島内管路新設工事（1工区）	R2.5.28	R5.2.28	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅰ、Ⅱ街区】	(株)松野組
		33	夢洲島内管路新設工事（11工区）	R4.1.24	R5.4.28	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅶ街区】	(株)きんでん
		34	夢洲島内管路新設工事（4工区）	R4.2.7	R6.11.29	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅲ街区】	五十嵐工業(株)
		35	夢洲内大阪広域環境施設組合 北港事務所単独地中化	R4.5.25	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電線管路の新設工事【観光Ⅰ、Ⅱ期】	(株)かんでんエンジニアリング
		36	夢舞シールド立金物他取付工事	R5.3.27	R5.10.31	夢舞シールド内の地中電力ケーブルを布設するための鋼材取付工事【夢舞シールド】	(株)かんでんエンジニアリング
		37	関西大阪万博暫定供給線新設工事	R5.1.18	R6.5.31	大阪・関西万博開催地への地中電力ケーブルの新設工事【舞洲、夢舞シールド、臨港Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ街区】	(株)きんでん
		38	舞洲SS夢洲新駅供給工事	R5.5.30	R5.12.31	(仮称)夢洲駅への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅴ、Ⅵ街区】	(株)かんでんエンジニアリング
		39	舞洲SS舞洲コンテナバース線1.2L 移設工事（ケーブル）	R5.7.5	R5.10.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電線の移設工事【臨港Ⅰ街区】	(株)かんでんエンジニアリング
		40	夢洲変電所新設工事のうち建物他工事	R5.7.12	R7.3.31	変電所新設に伴う建物新設および敷地整備	(株)KANSOテクノス

夢洲関連工事 令和5年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者		工事情報				受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道 施設	大阪市水道局	41	夢洲中1丁目(その5)400mm 配水管布設工事	R4.12.8	R6.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管 の新設工事【観光IV期、臨港VI街区】	井上建設興業(株)
		42	令和5年度プラント系情報通信ネットワー ク構築(水質テレメータ)	R5.10.6	R7.1.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管 新設に伴うテレメータ設置工事【夢洲コンテナ支線 1号線】	向洋電機(株)
		43	令和5年度プラント系情報通信ネットワー ク構築(配水テレメータ)	R5.9.29	R7.1.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管 新設に伴うテレメータ設置工事【夢洲コンテナ支線 1号線】	メタウォーター(株)
ガス供給 施設	大阪ガス ネットワーク(株)	44	大阪・関西万博(IV期)	R4.9.8	R6.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等へのガス導 管の新設工事【観光IV期】	日鉄パイプライン& エンジニアリング(株)
		45	C12延伸部ゲートハウス棟	R5.7.31	R5.10.31	夢洲コンテナターミナル(C12)延伸部ゲートハウ ス棟へのガス導管の新設工事	鳳工業(株)
下水道 施設	日本下水道事業団	46	大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事 その3	R3.12.16	R7.3.31	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事 【観光II期・IV期、臨港II・III・VII街区、 夢洲コンテナターミナル線、夢舞シルド、舞洲14・16・18 号線、夢洲抽水所、舞洲抽水所】	大林・大本・久本特定建設共同企業体
通信施設	エヌ・ティ・ティ・インフ ラネット(株)	47	大阪北総22RN0001電気通信設備工事 此花ビル舗装先行工事(夢洲)	R4.4.13	R6.6.10	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電 気通信管路の新設工事	エクシオグループ(株)
	(株)NTTドコモ (エヌ・ティ・ティ・イン フラネット(株))	48	大阪府大阪市此花区夢洲東支障移転工事	R4.12.16	R6.1.9	大阪港湾局の依頼に基づき、夢洲道路整備工事に支 障となるNTTドコモの既設ハンドホールを移設す る工事	エクシオグループ(株)
	(株)NTTフィールドテクノ	49	大阪総22-A0328電気通信設備工事 此花ビル等アクセス系光設備工事 (大阪・関西万博)	R5.3.24	R6.6.25	大阪・関西万博開催地への通信ケーブルの新設工事	(株)ミライト・ワン
自治体 管路	大阪港湾局 (関西電力送配電(株))	50	夢洲自治体管路新設工事	R3.3.17	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	(株)かんでんエンジニアリング
	大阪港湾局 (エヌ・ティ・ティ・インフ ラネット(株))	51	夢洲自治体管路新設工事	R3.4.23	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	エクシオグループ(株)

夢洲関連工事 令和5年10月時点で稼働している工事の契約状況

【舞洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
道路・橋梁	大阪市建設局	52	(仮称) 舞洲東高架橋架設工事－1	R4.12.14	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)森組
		53	(仮称) 舞洲東高架橋架設工事－2	R4.12.16	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	日本ファブテック(株)
電力施設	関西電力送配電(株)	54	舞洲SS北港緑地1丁目供給工事	R5.5.30	R6.1.31	(仮称)北港緑地1丁目への地中電線管路の新設工事【舞洲】	(株)かんでんエンジニアリング
		55	舞洲SS夢洲地区開発に伴う配電線増強工事	R5.5.30	R6.1.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への地中電線管路の新設工事【舞洲】	(株)かんでんエンジニアリング
上水道施設	大阪市水道局	56	夢舞枝管600mm配水管布設工事(300mm排水設備設置工事)	R5.10.6	R6.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管新設に伴う排水管設置工事	(株)ソイルテクノ

【その他】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道施設	大阪市水道局	57	此花枝管600mm配水管布設工事他	R3.3.9	R6.2.29	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管の新設工事	(株)ケンセイ
		58	北港加圧ポンプ場 加圧ポンプ設備増強工事	R5.6.5	R7.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管新設に伴うポンプ設備増強	(株)鶴見製作所
