

夢洲における関連事業の工事調整


- ・ 工事進捗状況、工事車両調整について
- ・ 工事車両の運行管理について

令和4年12月2日

大阪市建設局

夢洲における関連事業の工事調整

○事業箇所図

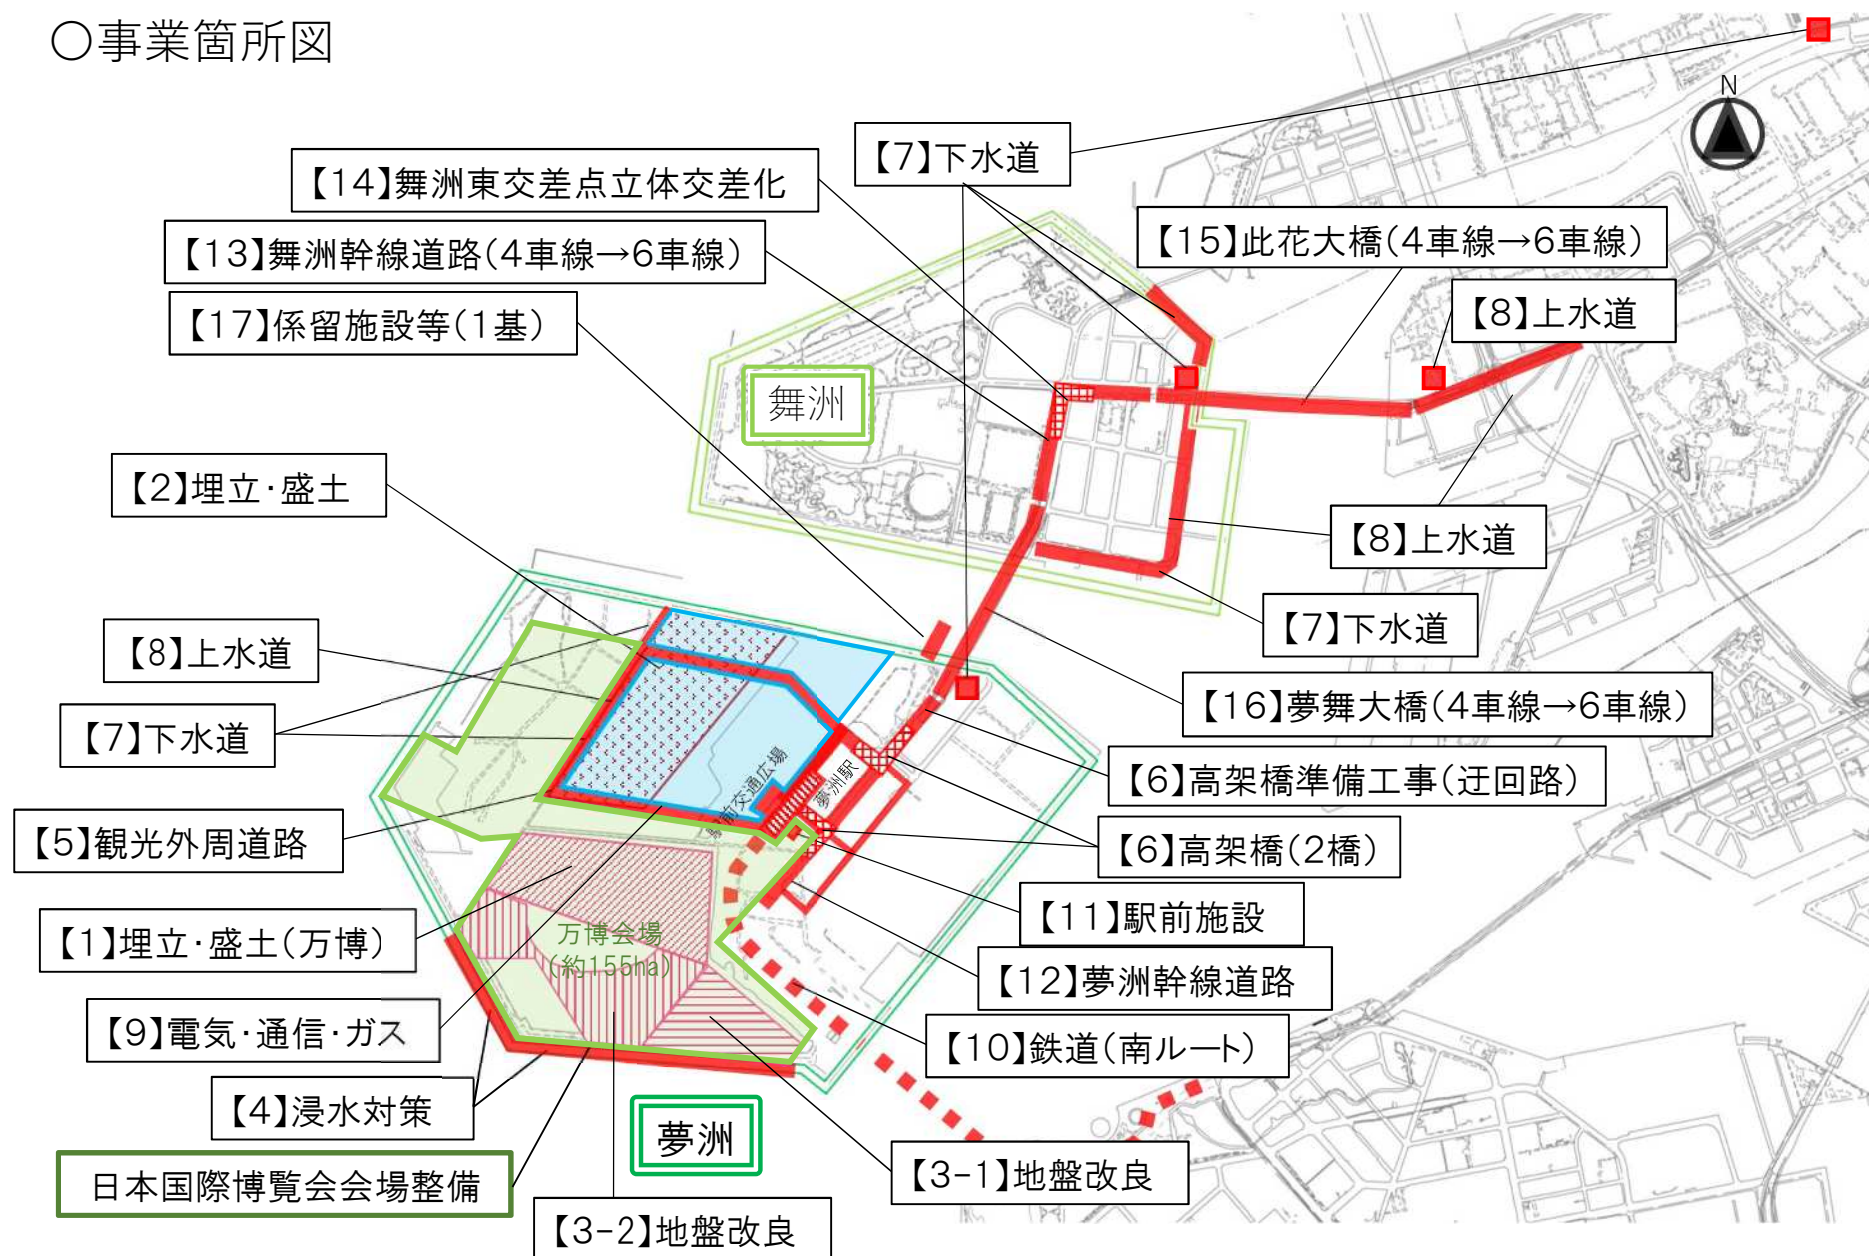


夢洲における関連事業の工事調整

2022年
12月時点

インフラ整備 箇所図番号		項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況 (R4年10月末時点)
				H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	～	
万博		大阪・関西万博	開催期間: (始)2025年 4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積: 155ha パビリオン等: 約110区画		基本計画	検討・設計等		整地・インフラ工事			開催	撤去工事※				
					基本計画	検討・設計等		パビリオン等建築工事								
インフラ整備						●基本計画策定					●4～10月	※撤去工事完了時期未定				
	【1】	埋立・盛土(万博)	約30ha(約90万m3)		地盤改良・盛土											完了
	【2】	埋立・盛土	約42ha(約42万m3)		埋立・盛土											完了
	【3-1】	地盤改良	2区南東部 約12ha				地盤改良									
	【3-2】	地盤改良	2区南西部 約19ha					地盤改良								
	【4】	浸水対策(G・H護岸)	約1.7km					工事								
	【5】	観光外周道路	L=約2.6km、W=30～34m	予備設計	詳細設計等	工事 (Ⅰ期)	工事 (Ⅱ期)	工事 (Ⅰ～Ⅳ期本整備)								
	【6】	(仮称)夢洲北高架橋	3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m	迂回路 詳細設計等	迂回路 工事											完了
				予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工等)										
		(仮称)夢洲南高架橋	3径間連続鋼床版箱桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m	予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工等)										
	【7】	下水道	此花処理場の機能増強 夢洲抽水所(新設)、舞洲抽水所(増設) 管渠(φ250～φ2200mm、L=約17km)	詳細設計等	工事											
				詳細設計等	工事											
	【8】	上水道	北港加圧ポンプ場等(機能増強) 配水管(φ600mm他、L=約8.5km)	詳細設計等	工事											
				詳細設計等	工事											
	【9】	電気・通信・ガス 電気	配管等 変電所	詳細設計等	工事											
								詳細設計等	工事							
	【10】	鉄道(南ルート)	事前調査	基本検討 調査等												
		インフラ部	駅舎部 L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m シールドトンネル部 L=761m、Φ6,800×2		設計等	工事(開業準備込)										
		インフラ外	レール・電気設備等 一式			工事(組立等)	工事(掘進工等)									
	【11】	駅前施設	地下広場・階段・昇降機等			設計等	工事(開業準備込)									
	【12】	夢洲幹線道路(周辺道路含む)	L=約2.2km、W=60m	予備設計	詳細設計等	工事										
	【13】	舞洲幹線道路	L=約0.8km、W=60m	予備設計	詳細設計等	工事				工事						
	【14】	舞洲東交差点立体交差化	4径間連続鋼床版箱桁橋 L=約220m、W=約8.9m～11.7m		設計等	工事										
	【15】	此花大橋	6車線化(歩道撤去等) L=約1.1km	予備設計	詳細設計等	工事 (6車線化)				詳細設計等	工事(歩道設置)					
	【16】	夢舞大橋	6車線化(ガードレール撤去等) L=約1.0km		詳細設計等	工事 (6車線化)										
	【17】	係留施設等	浮桟橋(1基、L=40m、W=20m)等 波除堤(L=60m)		詳細設計等	工事 (浮桟橋)			詳細設計等	工事 (待合所)						完了
物流・工事車両	【18】	CONPASの導入 車両待機場の整備	新・港湾情報システム(CONPAS) 夢洲での追加整備 咲洲での追加整備		概要・詳細設計、 試験期間中の改修	試験 運用等	順次 導入	本格運用								
	【19】	ターミナルゲートの時間延長 荷捌き地の拡張(ゲート増設) 咲洲ヘシフト	早朝等ゲートオープン時間の延長 C12コンテナミナル拡張※、ゲート増設 (※増設ゲート周辺部分) ・船舶着岸場所一時移転 ・空コンテナ返却場所一時移転	社会実験	検討・協議等	詳細設計	コンテナミナル拡張工事 増設ゲート工事	システム導入 運用			実施					完了
		工事車両対策	運搬日、時間帯等を調整			社会実験 R3-10実施	社会実験 R4-1.31～ 供用開始									
					検討			本格実施								

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中

夢洲における関連事業の工事調整（工事進捗状況）

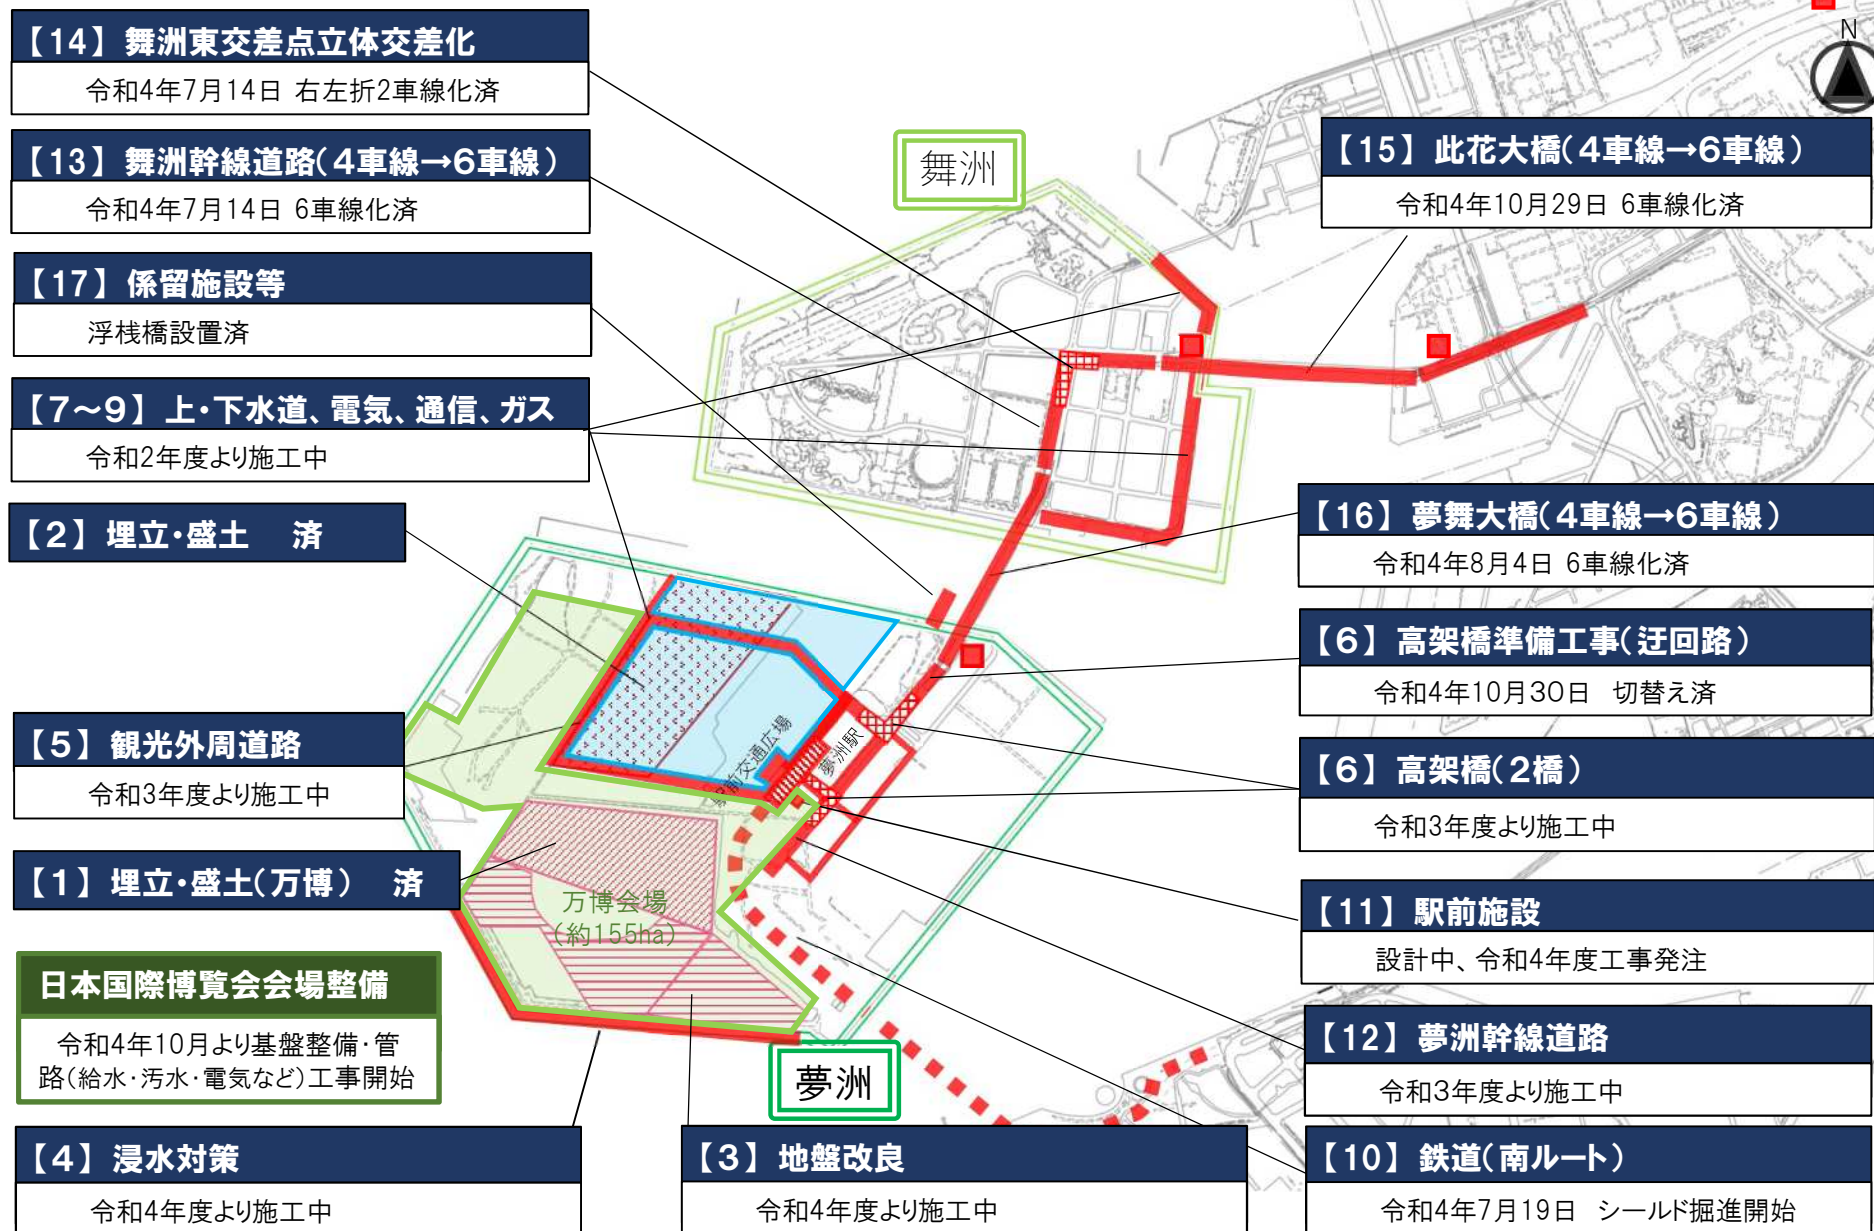

夢洲における関連事業の工事調整（工事進捗状況）

【1,2】埋立・盛土(万博)

令和4年4月完了



【3】地盤改良

令和3年度～施工中



【4】浸水対策

令和4年度～施工中



【5】観光外周道路

令和3年度～施工中



【6】高架橋準備工事(迂回路)

令和4年10月30日切り替え済

＜ 舞洲行き ＞

＜ 夢洲行き ＞



【6】高架橋(2橋)

令和3年度～施工中

