

図1 位置図

(2 事業概要①所在地)

生野区生野東1丁目～生野区舍利寺3丁目

対象事業 位置図



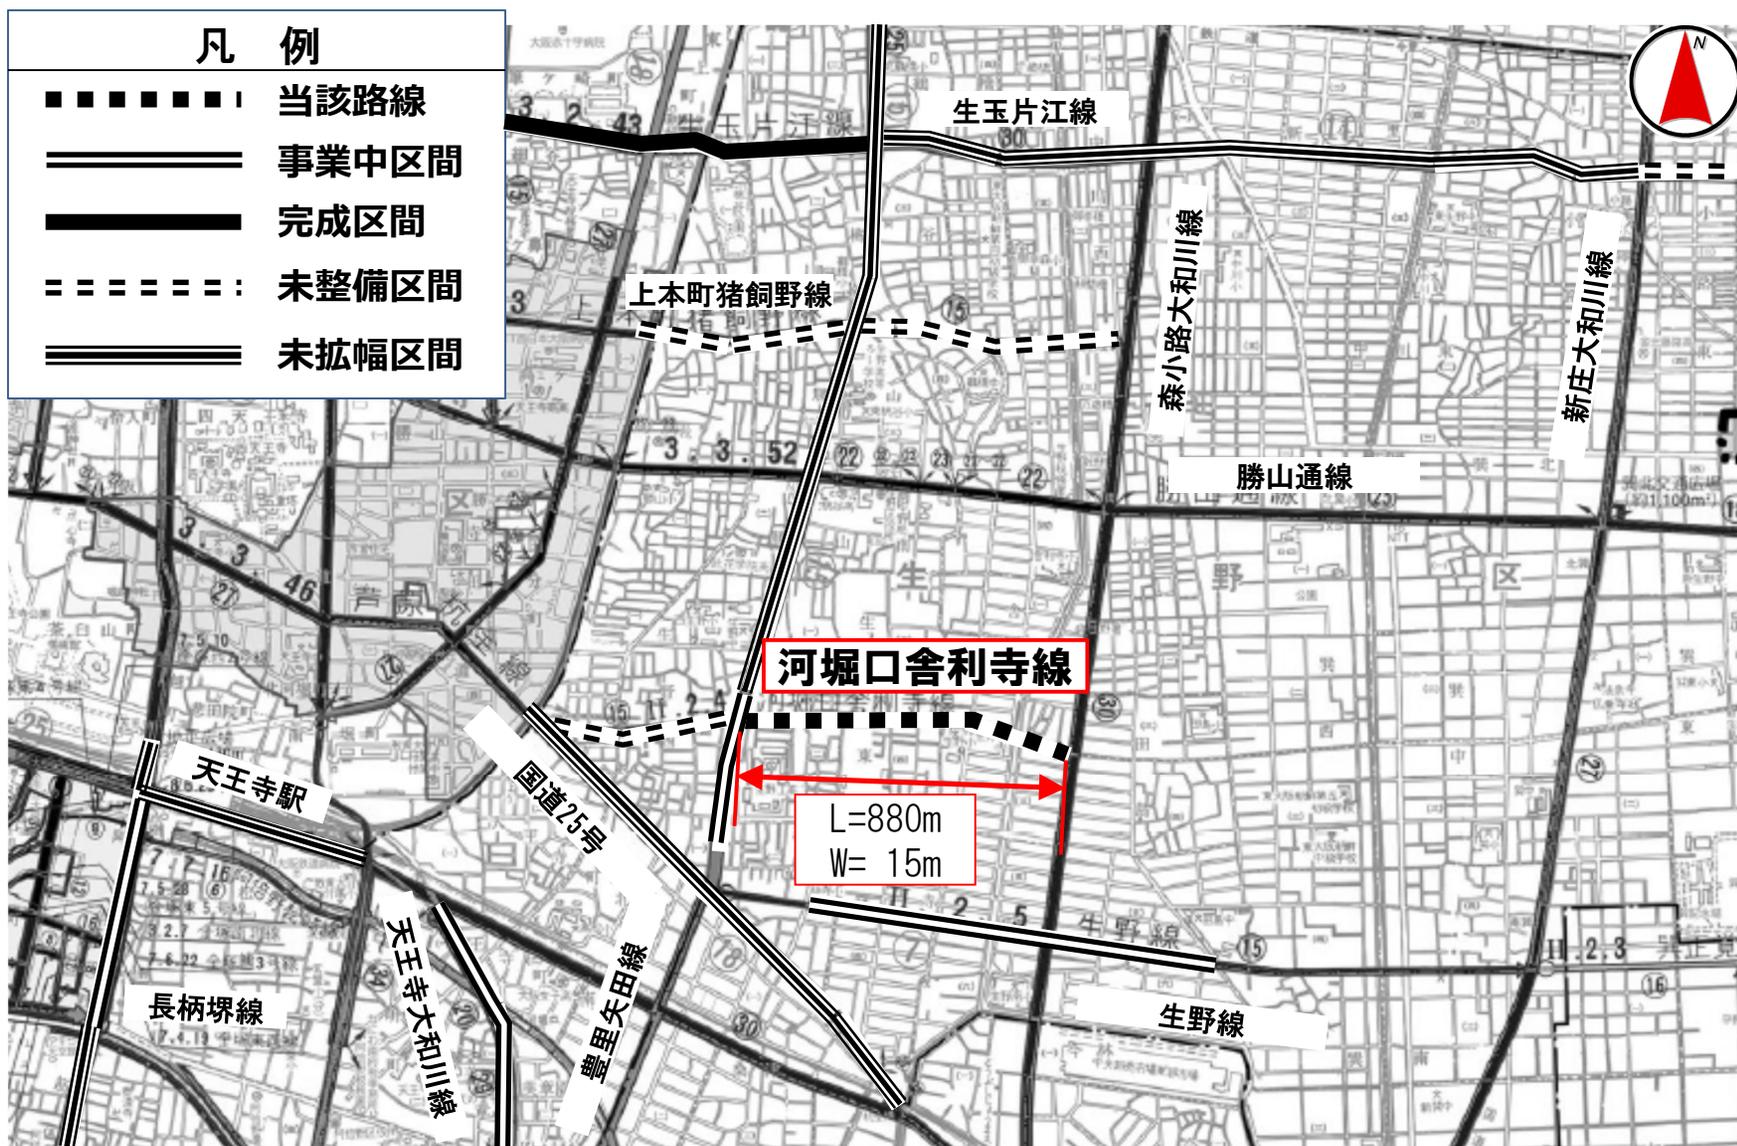


図3 進捗状況

(4 事業の実現見通しの視点 ②事業規模)



河堀口舍利寺線 事業中箇所 L=880m

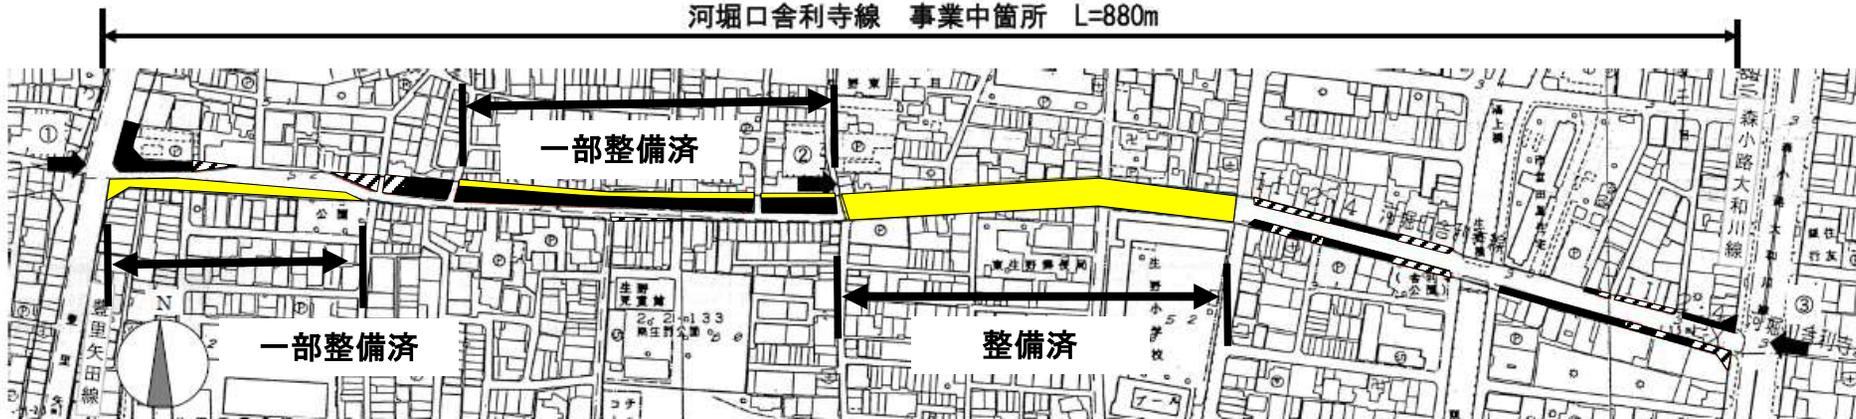

凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率:97%(面積ベース)
 工事進捗率:33%(面積ベース)


事業費ベース進捗率:86%

図4 進捗率の推移

(4 事業の実現見通しの視点 ③総事業費)

進捗率の推移(単位:%)

事業採択時の
想定進捗率

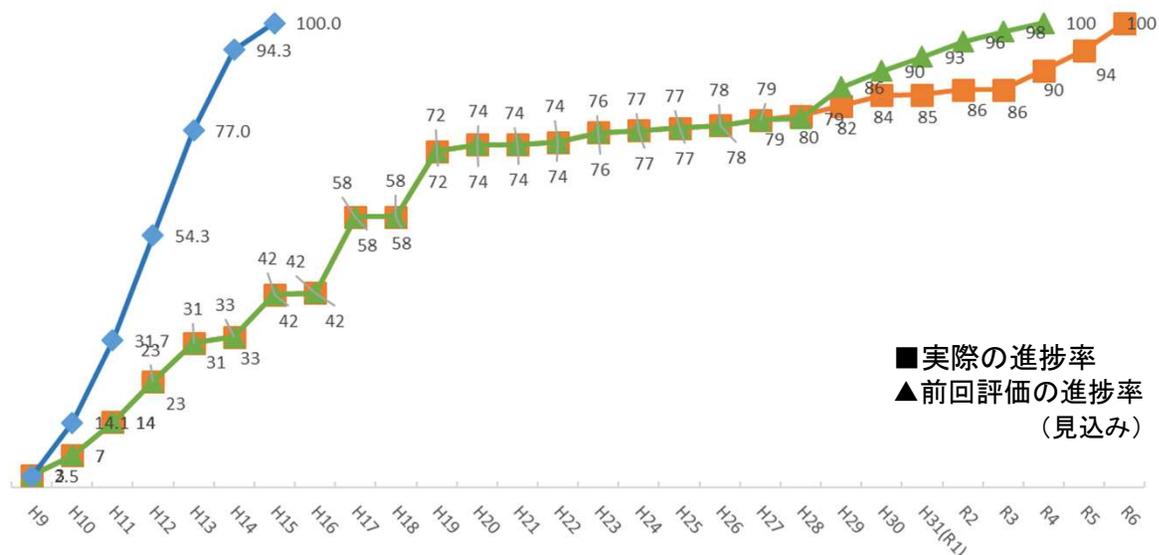

残事業の内容

- ・用地取得21件(200㎡)
- ・道路工事(延長588m、面積8,812㎡)
- ・残事業費約8億円

今後のスケジュール(見込み)

- ・令和6年度 事業完了予定

事業が遅延した原因とその状況

・用地取得において、売買に難色を示されていることなどで、用地買収が難航し、事業が長期化していた。

対応と解消の目途及びその根拠

・用地取得において、難航している物件については、土地収用法の適用も視野に入れながら、用地取得を進め、令和6年度での事業完了をめざす。
