


図1 位置図

(2 事業概要①所在地)

西成区千本北1丁目～西成区千本中2丁目

対象事業 位置図

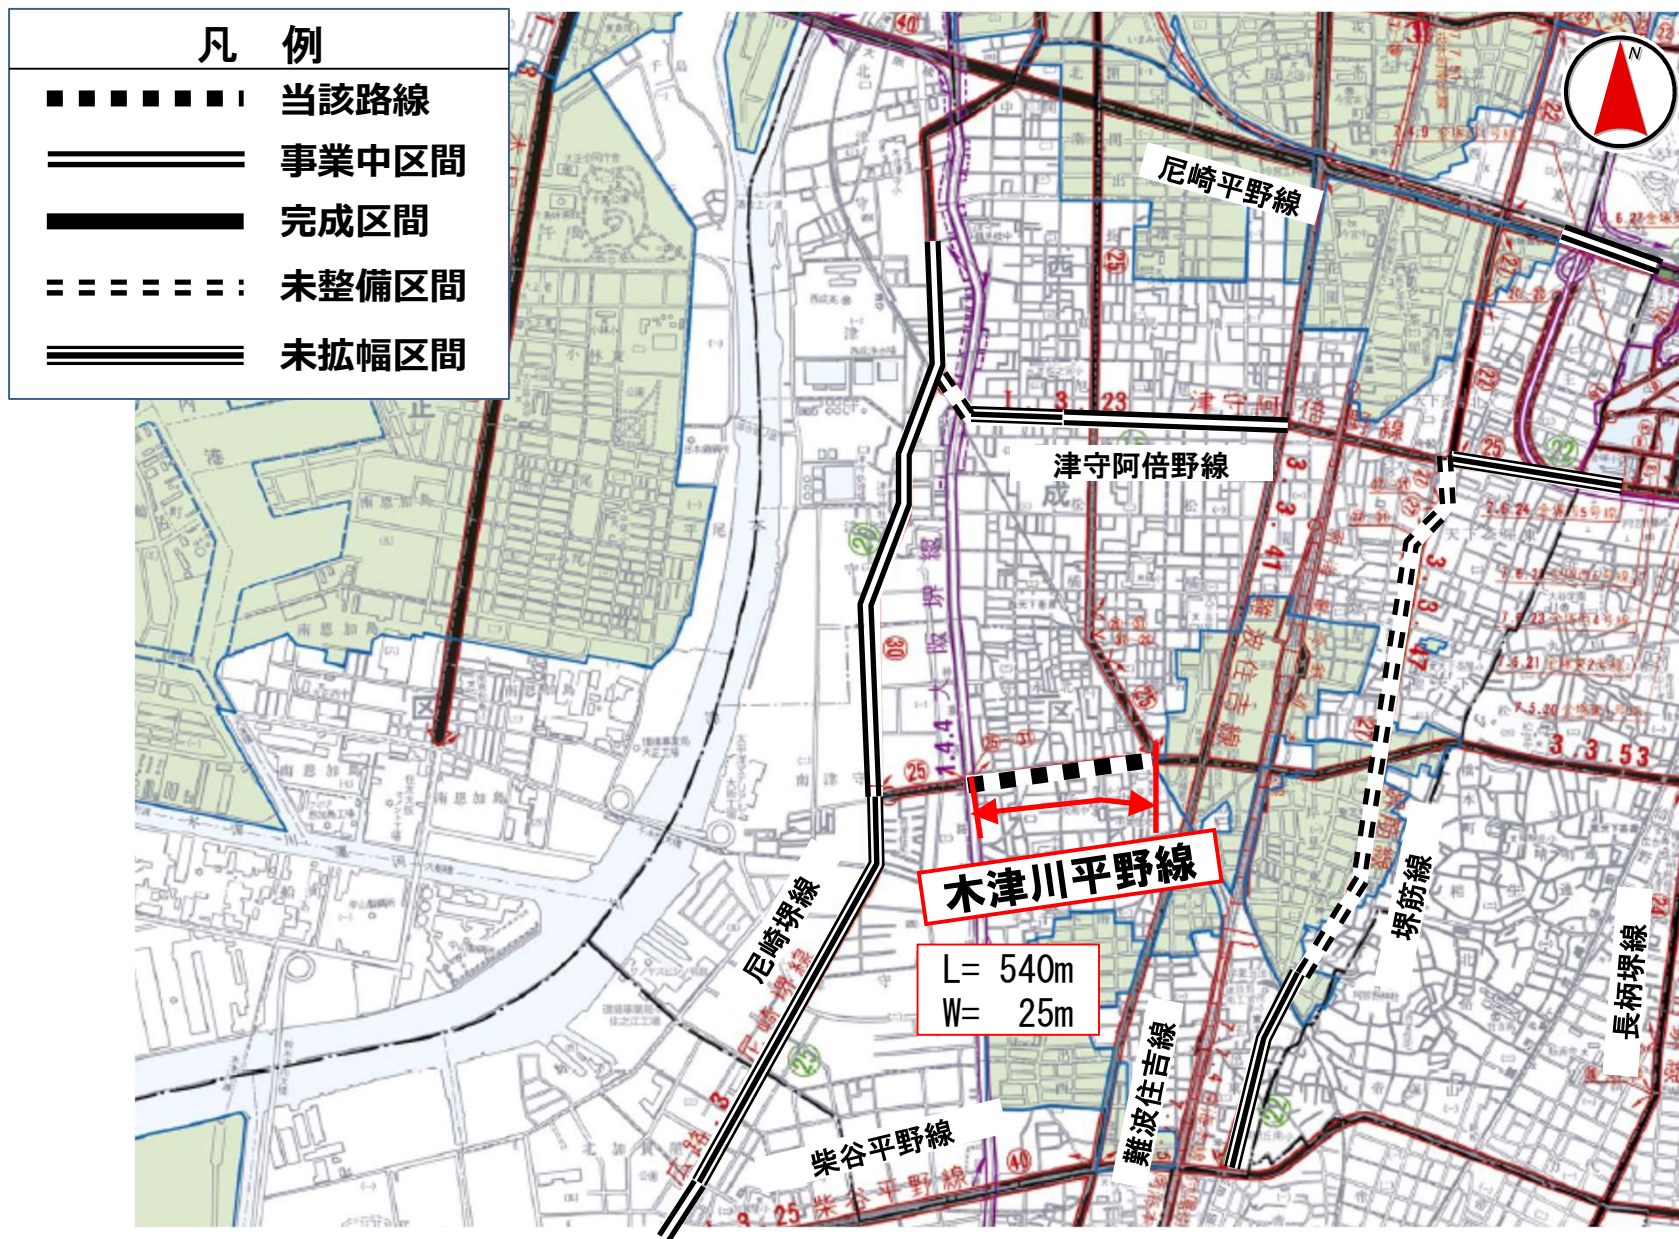

# 図3 進捗状況

## (4 事業の実現見通しの視点 ③事業規模)

①




②



③



木津川平野線 事業中箇所 L=540m



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率: 45%(面積ベース)  
工事進捗率: 0%(面積ベース)


事業費ベース進捗率: 19%

## 図4 進捗率の推移

## (4 事業の実現見通しの視点 ③総事業費)

### 進捗率の推移(単位:%)

事業採択時の  
想定進捗率

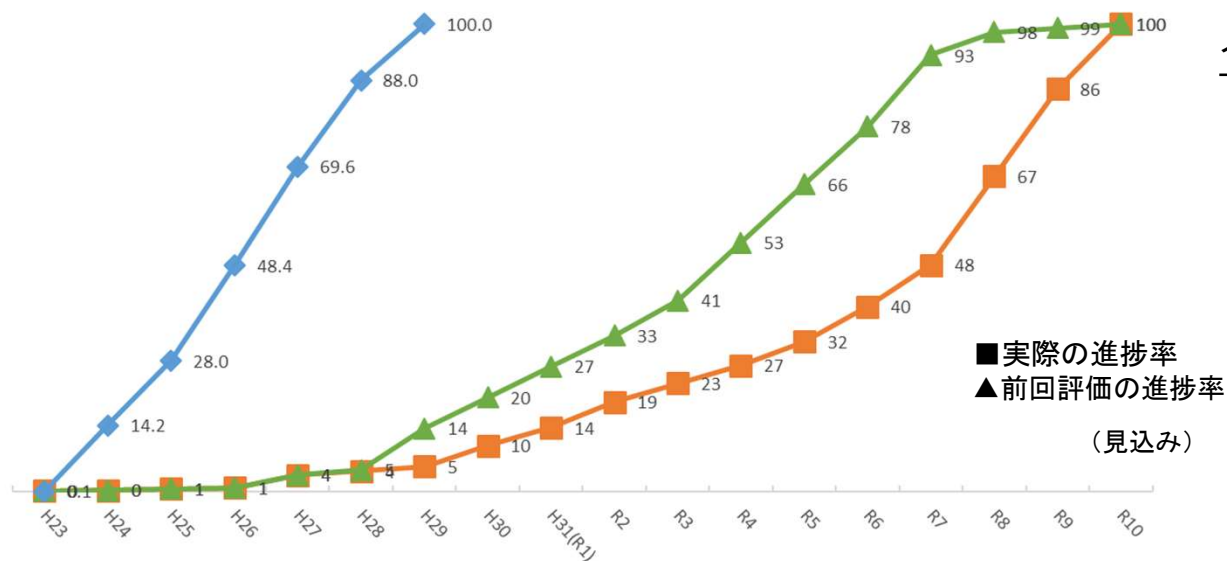

### 残事業の内容

- ・用地取得47件(6,940㎡)
- ・道路工事(延長540m、面積13,500㎡)
- ・残事業費約97億円

### 今後のスケジュール(見込み)

- ・令和10年度 事業完了予定

### 事業が遅延した原因とその状況

- ・用地取得において、用地買収が難航し、事業が長期化していた。

### 対応と解消の目途及びその根拠

- ・用地買収については、個別課題の解消に向け精力的に取り組み、計画的な取得を行い、令和10年度での事業完了をめざす。
