


2021年度完成:埋設、夢舞大橋6車線化、係留施設等(浮棧橋)、車両待機場、埋立・盛土等

2022年度完成:埋設、迂回路、此花大橋6車線化、浸水対策(G・H護岸)


2023年度完成:埋設、荷捌き地の拡張、係留施設等(波除堤)、鉄道(躯体工事等)

2024年度完成:地盤改良、外周道路Ⅰ～Ⅳ期、夢洲北・南高架道路、舞洲東交差点立体交差化、夢洲幹線道路拡幅、舞洲幹線道路拡幅、係留施設等(船客用待合所)、鉄道(躯体内(開業準備工))、駅前施設等

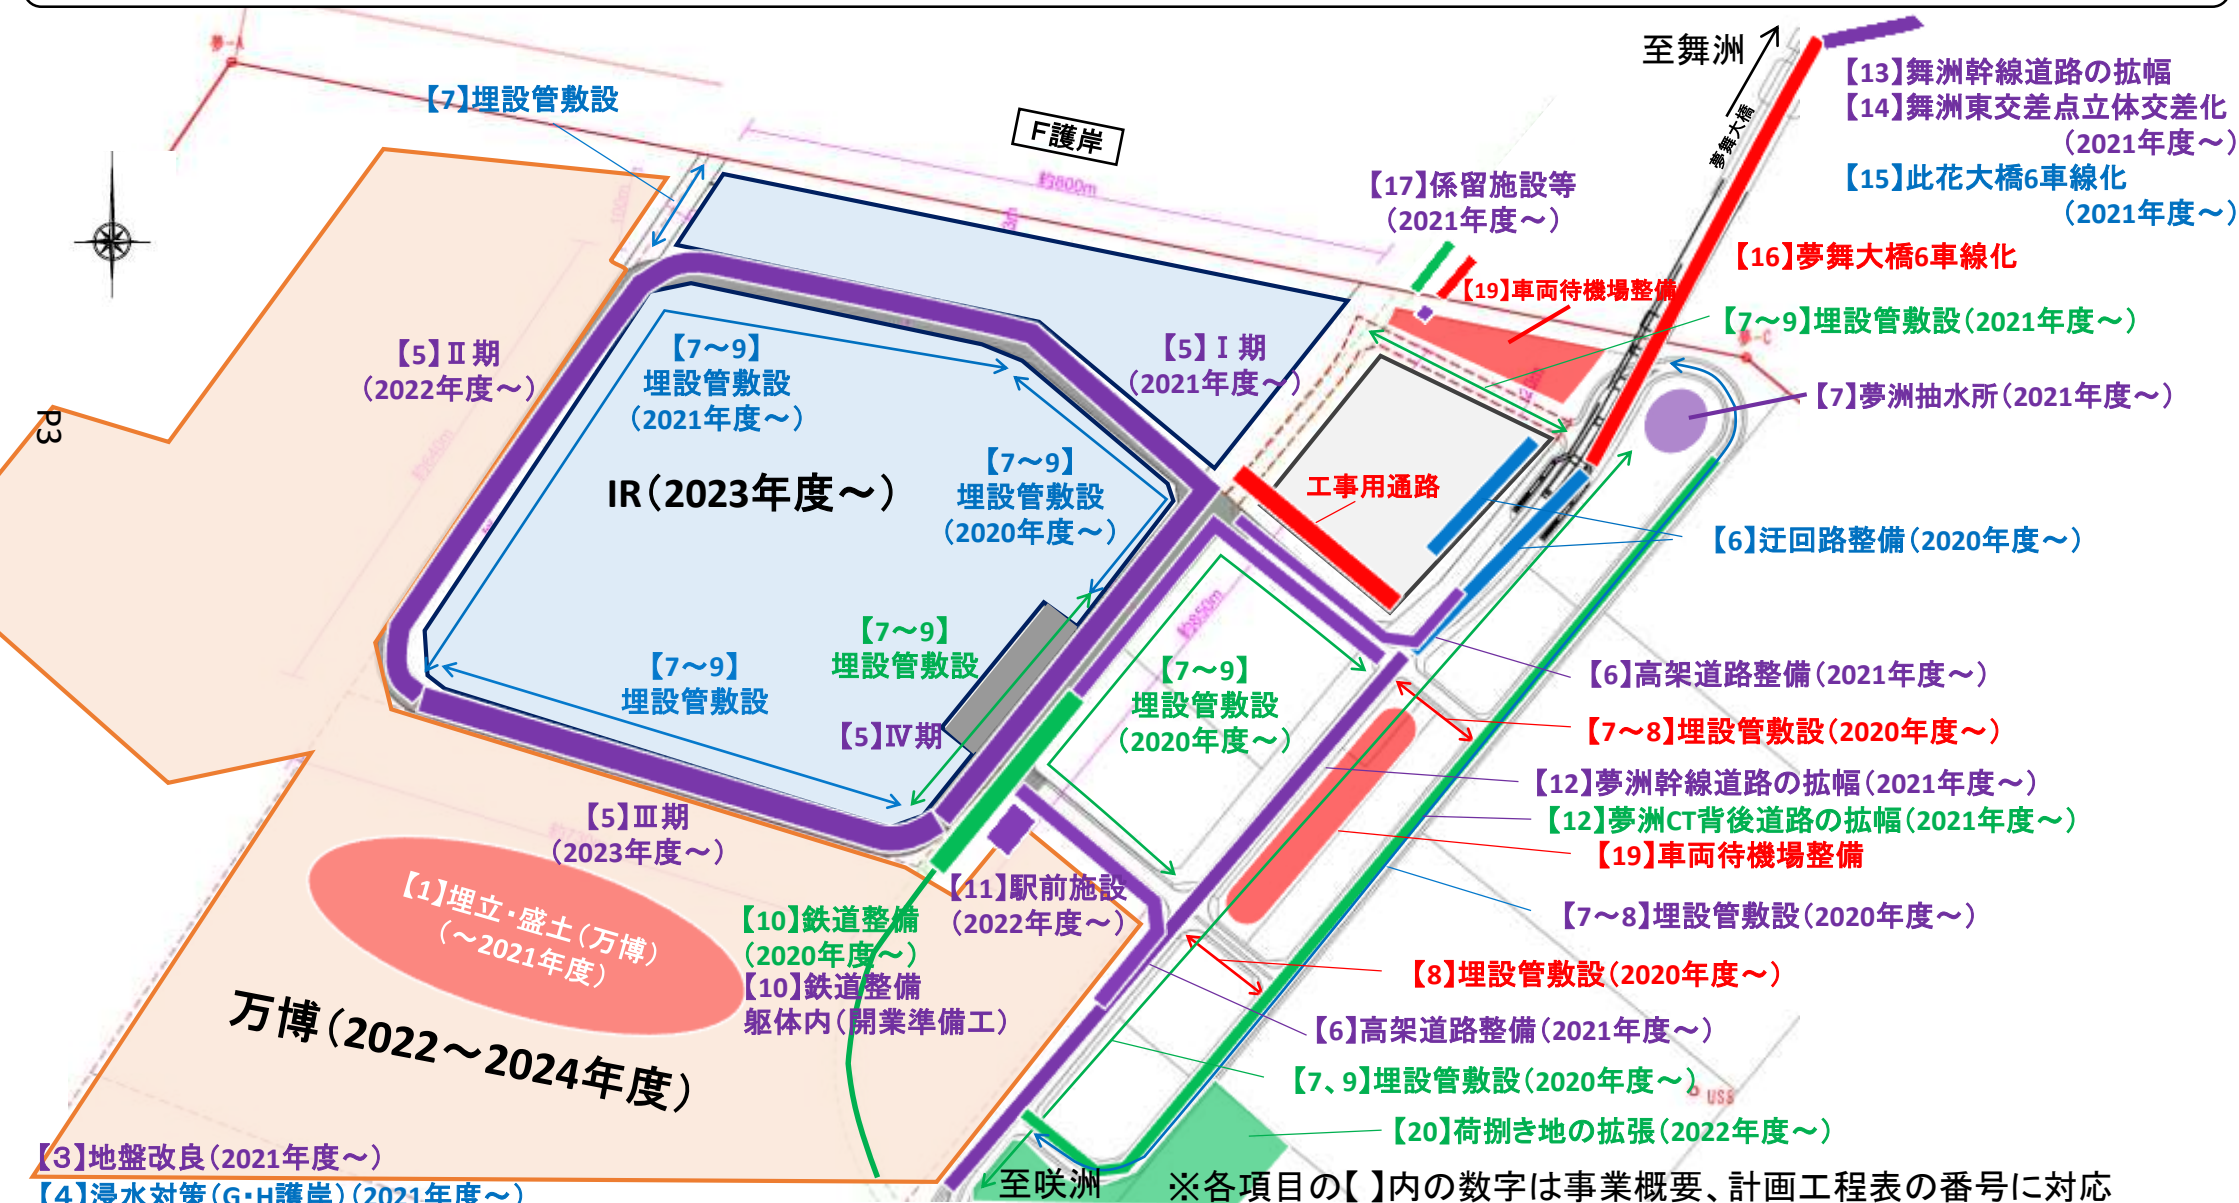

2022年度(令和4年度)の工事状況

※F護岸利用範囲については、原案をベースに
各事業の施工計画をもとに協議・調整を行う

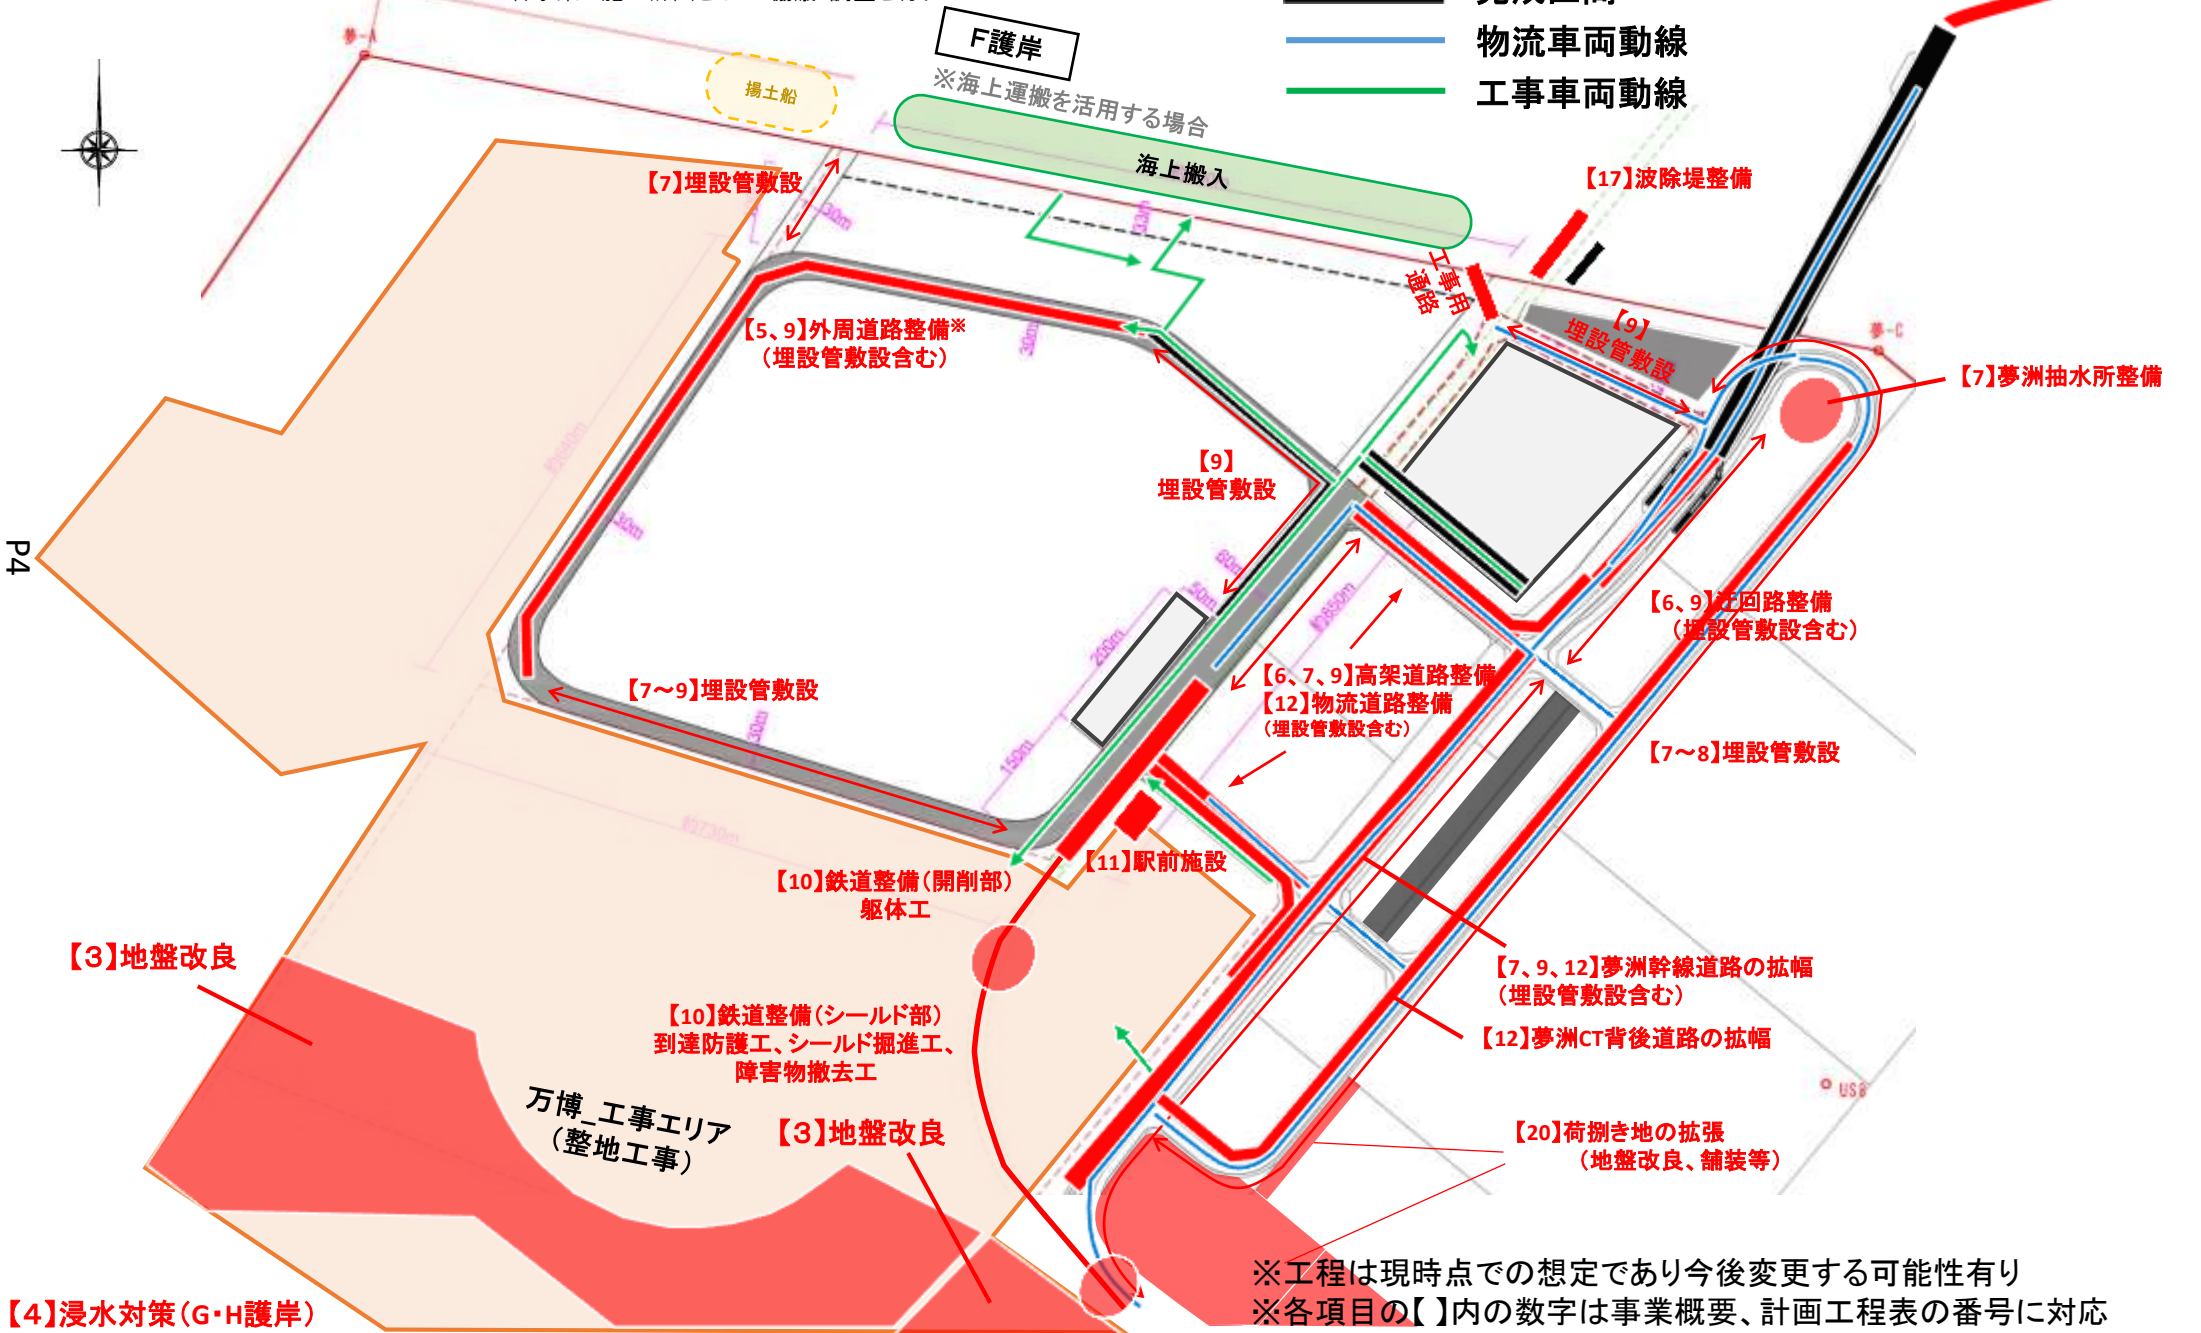

※F護岸利用範囲については、原案をベースに各事業の施工計画をもとに協議・調整を行う

1区北側護岸での海上搬入の可否は
管理者によりその都度判断

F護岸

※海上運搬を活用する場合

海上搬入

IR_工事下

【5】外周道路整備(歩道部)

IR_工事エリア

【5】外周道路整備

【7～9】
埋設管敷設

【10】鉄道整備(開削部)
躯体工、仮復旧工

【11】駅前施設

【10】鉄道整備(シールド部)
シールド掘進工

万博_工事エリア

- 施工箇所
- 埋設管の敷設・撤去等箇所
- 完成区間
- 物流車両動線
- 工事車両動線

【14】
舞洲東交差点
立体交差化

【17】波除堤整備

【7】埋設管敷

【7】夢洲抽水所整備

【6、7～9】
高架道路整備
(埋設管路敷設含む)

【7】埋設管敷設

【7、9】
埋設管敷設

【12】夢洲CT背後道路の拡幅

【20】荷捌き地の拡張
(地盤改良、舗装等)

※工程は現時点での想定であり今後変更する可能性有り
※各項目の【】内の数字は事業概要、計画工程表の番号に対応

2024年度(令和6年度上半期)の工事状況

※F護岸利用範囲については、原案をベースに各事業の施工計画をもとに協議・調整を行う

1区北側護岸での海上搬入の可否は管理者によりその都度判断

※海上運搬を活用する場合
海上搬入

- 施工箇所
- 埋設管の敷設・撤去等箇所
- 完成区間
- 物流車両動線
- 工事車両動線

【13、14】
舞洲幹線道路拡幅
舞洲東交差点立体交差化

【17】
船客用待合所等整備

【9】電柱撤去等

【7】夢洲抽水所整備

【5】外周道路整備

IR_工事エリア

【6】
高架道路整備

【9、12】物流道路整備
(電柱撤去含む)

【6】
高架道路整備

【11】駅前施設

【10】鉄道整備
躯体内(開業準備工)

【9】電柱撤去等

【7】埋設管敷設

【3】地盤改良

万博_工事エリア

※工程は現時点での想定であり今後変更する可能性有り
※各項目の【 】内の数字は事業概要、計画工程表の番号に対応

2024年度(令和6年度下半期)の工事状況

※F護岸利用範囲については、原案をベースに
各事業の施工計画をもとに協議・調整を行う

1区北側護岸での海上搬入の可否は
管理者によりその都度判断

F護岸

※海上運搬を活用する場合
海上搬入

IR_工事エリア

IR_工事エリア

万博_工事エリア

- 施工箇所
- 埋設管の敷設・撤去等箇所
- 完成区間
- 物流車両動線
- 工事車両動線

【13、14】
舞洲幹線道路拡幅
舞洲東交差点立体交差化

浮桟橋等

【17】
船客用待合所等整備

【7】夢洲抽水所整備

工事用道路撤去

【12】物流道路整備

【7】埋設管敷設

【11】駅前施設

【10】鉄道整備
躯体内(開業準備工)

【12】夢洲幹線道路整備

※工程は現時点での想定であり今後変更する可能性有り
※各項目の【】内の数字は事業概要、計画工程表の番号に対応
