

夢洲関連部会及びワーキングにおける R4年度の実施（議事）

令和4年11月22日
大阪市建設局

夢洲関連事業の推進に向けた検討体制

夢洲万博関連事業等推進連絡会議（2022年（令和4年）5月10日に設置）

【目的】万博会場整備やインフラ整備等の推進に向けた総合調整

（事務局：大阪市）

【構成】会長：内閣総理大臣補佐官 座長：大阪市副市長

委員：内閣官房副長官補付内閣審議官、内閣官房万博推進本部事務局次長、経済産業省商務・サービス審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省港湾局長、万博協会副事務総長、大阪府副知事、（大阪府市特別顧問）

夢洲万博関連事業等推進連絡会議 幹事会 ※ 令和4年12月2日、令和5年3月に開催予定

①大阪府で設置済



情報共有・調整

※ 令和4年11月22日開催、
令和5年3月に開催予定

夢洲等まちづくり事業調整会議（2019年（令和元年）8月 設置済 8回開催）

【目的】夢洲関連事業の一元的な事業調整、進捗管理及び情報共有等

【構成】座長：大阪市副市長

（事務局：大阪市）

委員：大阪府市（万博推進局、IR推進局、大阪都市計画局、大阪港湾局）、

大阪市（建設局、水道局）、2025年日本国際博覧会協会、西日本電信電話、

関西電力送配電、大阪ガスネットワーク

オブザーバー：近畿地方整備局企画部

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所、
大阪府都市整備部、大阪市環境局

アドバイザー：大阪府市特別顧問

夢洲関連埋設調整部会

【目的】インフラ整備における埋設企業体の計画・調整

【構成】

大阪府市（万博推進局、IR推進局、大阪港湾局）、大阪市（建設局、水道局）、
2025年日本国際博覧会協会、西日本電信電話、関西電力送配電、大阪ガスネットワーク

夢洲関連工程調整部会

【目的】インフラ、IR、万博関連工事の工程調整

【構成】大阪府市（万博推進局、IR推進局、大阪港湾局）、大阪市（建設局、水道局）、

2025年日本国際博覧会協会、西日本電信電話、
関西電力送配電、大阪ガスネットワーク

夢洲関連工事連絡調整WG

【目的】発注者と受注者、受注者間で円滑な工事推進に向けた調整

【構成】発注者（近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所、大阪市、2025年日本国際博覧会協会、埋設企業体、鉄道事業者）、施工受託者（各工事）等

②博覧会協会で設置済



万博会場建設にかかる連絡調整協議体

【目的】円滑な万博会場整備に向けた連絡調整

【設置】万博協会の工事施工者により先行設置し、協会外工事の施工者が順次参加（事務局：協会）

【構成】

<協会全体統括担当>
会場全体の統括施工者

<協会整備工事>
工区ごとの統括施工者

<協会外整備工事>
出展者（参加国、企業等）の施工受託者

段階的に組織を拡大



情報共有・調整

参画

連絡調整協議体

会場基盤整備工事
（土木工事）

- 大林組・奥村組JV
- 大林組・本間組JV
- 竹中土木・森本組JV
- 大林組・大鉄JV
- 大林組・大鉄JV
- 熊谷組・ガイアートJV

●：統括施工者

※ 令和4年10月3日設置

※ 万博工事業者がR4年8月よりWGに参加
（月1回、これまで3回実施）

夢洲関連部会及びワーキング R4年度の取組み

■埋設調整部会

○取組状況

	第13回	第14回
日時	R4. 7. 28	R4. 10. 7
参加人数	50人	55人

○取組内容

- ・ 博覧会会場への引込管路の調整
- ・ IR事業の埋設計画の共有
- ・ 埋設管路の離隔詳細協議など

■工程調整部会

○取組状況

	第15回	第16回	第17回
日時	R4. 7. 28	R4. 10. 7	R4. 11. 14
参加人数	50人	55人	80人

○取組内容

- ・ 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整 【資料2】
- ・ 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について 【資料5】

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況

	第18回	第19回	第20回	第21回	第22回	第23回	第24回	第25回
日時	R4. 4. 26	R4. 5. 24	R4. 6. 28	R4. 7. 26	R4. 8. 23	R4. 9. 27	R4. 10. 25	R4. 11. 22

○取組内容

- ・ 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
- ・ 工事車両運行時のルール共有など
- ・ 工事車両運行管理システムについての意見交換

夢洲関連工事進捗状況

2022年10月末時点



【14】 舞洲東交差点立体交差化

令和4年7月14日 右左折2車線化済

【13】 舞洲幹線道路(4車線→6車線)

令和4年7月14日 6車線化済

【17】 係留施設等

浮棧橋設置済

【7~9】 上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度より施工中

【2】 埋立・盛土(IR) 済

IR施設整備

【5】 観光外周道路

令和3年度より施工中

【1】 埋立・盛土(万博) 済

日本国際博覧会会場整備

令和4年10月より基盤整備・管路(給水・汚水・電気など)工事開始

【4】 浸水対策

令和4年度より施工中

【3】 地盤改良

令和4年度より施工中

【15】 此花大橋(4車線→6車線)

令和4年10月29日 6車線化済

【16】 夢舞大橋(4車線→6車線)

令和4年8月4日 6車線化済

【6】 高架橋準備工事(迂回路)

令和4年10月30日 切替え済

【6】 高架橋(2橋)

令和3年度より施工中

【11】 駅前施設


設計中、令和4年度工事発注

【12】 夢洲幹線道路

令和3年度より施工中

【10】 鉄道(南ルート)

令和4年7月19日 シールド掘進開始

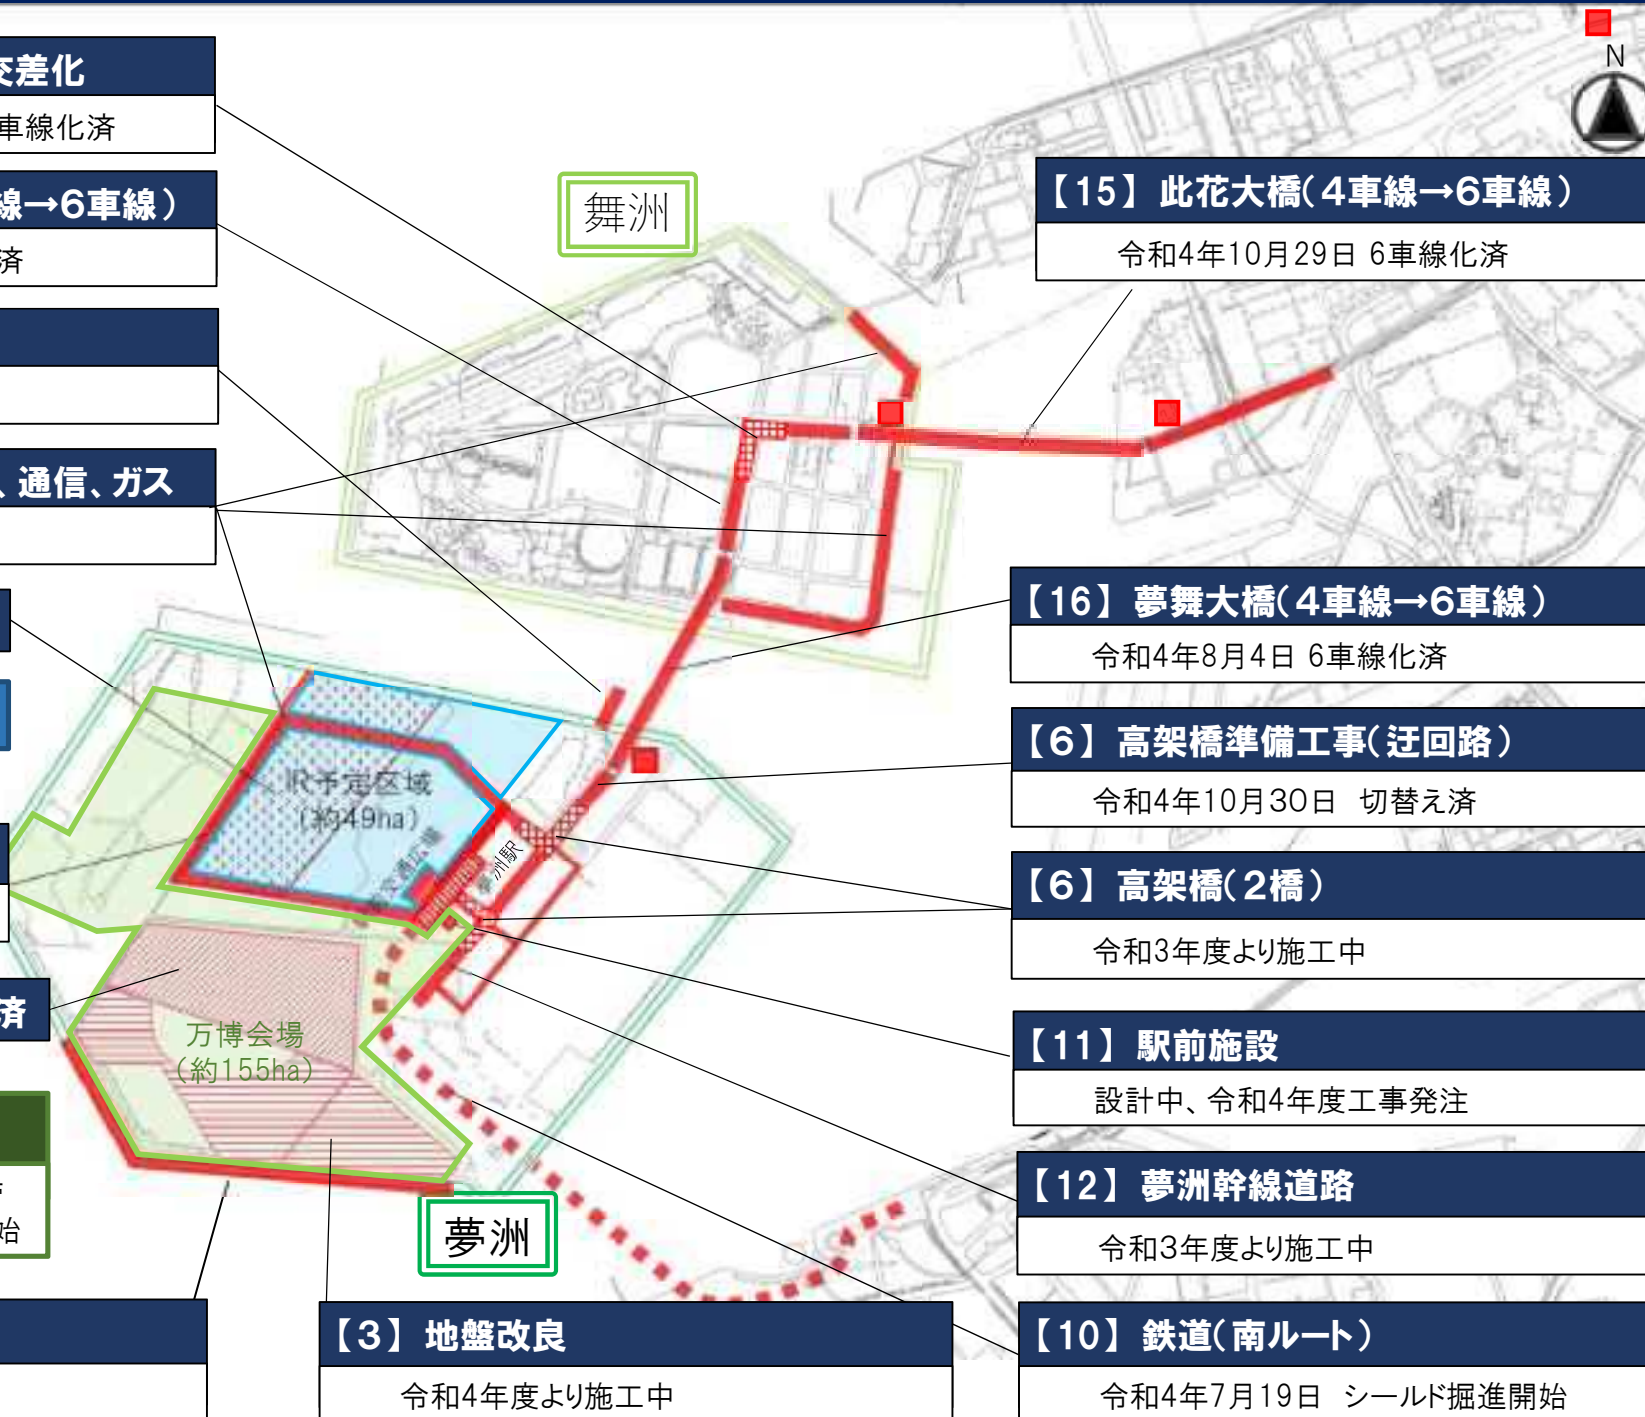

夢洲関連工事進捗状況

2022年10月末時点

【1,2】埋立・盛土(IR・万博) 済

令和4年4月完了



【3】地盤改良

令和3年度～施工中



【4】浸水対策

令和4年度～施工中



【5】観光外周道路

令和3年度～施工中



【6】高架橋準備工事(迂回路) 済

令和4年10月30日切り替え済

◀ 舞洲行き ▶

◀ 夢洲行き ▶



【6】高架橋(2橋)

令和3年度～施工中



夢洲関連工事進捗状況

2022年10月末時点

【7～9】上・下水道、電気、通信、ガス

令和2年度～施工中



下水道管敷設状況



電気管路敷設状況

【10】鉄道(南ルート)

令和4年7月19日シールド発進

令和4年7月撮影

駅舎部(地下1階)

線路部(シールドセグメント組立状況)



駅舎部(地下2階)



【12】夢洲幹線道路

令和3年度～施工中



【13】舞洲幹線道路(4車線→6車線) 済

令和4年7月14日完了



施工前(2車線)



施工後(3車線)

【14】舞洲東交差点立体交差化

令和4年7月14日 右左折2車線化完成

《 北行き 》

《 東行き 》



右折 2車線化



左折 2車線化

【15】此花大橋(4車線→6車線) 済

令和4年10月29日完了



施工中(歩道舗装撤去)



施工後(3車線)

【16】 夢舞大橋(4車線→6車線) 済

令和4年8月4日完了



施工前(2車線)



施工後(3車線)

【17】 係留施設等

令和4年3月浮棧橋完成



夢洲関連工事 令和4年10月時点で稼働している工事の契約状況

令和4年10月時点で稼働している工事件数：38件

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
埋立	大阪港湾局	1	夢洲2区（南東部）土地造成工事	R3.11.2	R5.2.28	大阪・関西万博会場地となる夢洲2区における土地造成工事	五洋・ヤマト特定建設工事共同企業体
		2	大正区ドルフィン第13号撤去及び その他工事（その1-2）	R4.7.19	R5.3.31	夢洲PCB含有土埋立区域における土工事及び大阪港内にあるドルフィン等の撤去	(株)OSW
浸水対策		3	夢洲G・H護岸背後浸水対策工事	R4.2.3	R5.3.31	夢洲南側護岸背後における法面被覆及び胸壁設置工事	東亜・奥村組土木特定建設工事共同企業体
下水道施設		4	夢洲2・3区雨水管整備工事	R4.8.19	R5.3.31	夢洲島内の雨水・排水渠の築造工事【臨港Ⅲ街区】	高知建設(株)
鉄道	大阪市高速電気軌道(株) (Osaka Metro)	5	北港テクノポート線 インフラ部整備工事	R2.7.3	R6.3.29	北港テクノポート線整備に伴う（仮称）夢洲駅及び夢咲トンネルまでの線路部のトンネル建設工事	大林・熊谷・東急・東洋JV
道路・橋梁	大阪市建設局	6	（仮称）観光外周道路（夢洲） 舗装新設工事－1	R3.6.25	R4.12.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	山本組建設(株)
		7	（仮称）夢洲北高架橋架設工事－1	R3.12.22	R5.9.29	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)森組
		8	（仮称）夢洲南高架橋架設工事－1	R3.12.15	R5.9.29	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	大鉄工業(株)
		9	夢洲中央幹線外1路線道路改良工事	R4.1.31	R4.12.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	和興建設工業(株)大阪支店
		10	夢洲中央幹線道路照明灯設置工事	R4.3.7	R4.12.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)ハートス

夢洲関連工事 令和4年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
道路・橋梁	大阪市建設局	11	(仮称) 夢洲北高架橋架設工事－2	R4.3.9	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	日本車輛製造(株)
		12	(仮称) 観光外周道路（夢洲）場内 出入口施設新設工事	R4.9.21	R4.12.28	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、IRを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)巴建設工業
I R	大阪府・大阪市 I R 推進局	13	IR予定地ボーリング調査	－	R5.1.31	I R開業地における土壌調査	(株)東京ソイルリサーチ・応用地質(株)・ 基礎地盤コンサルタンツ(株)・川崎地質(株)・ 中央開発(株)・明治コンサルタント(株)
荷捌き地 拡張	国土交通省近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所	14	大阪港北港南地区荷さばき地（C12） 地盤改良工事	R4.3.14	R4.12.14	夢洲コンテナターミナル（C12）荷さばき地整備	東亜・大本・本間特定建設工事共同企業体
万博	公益社団法人2025年 日本国際博覧会協会	15	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その1）	R4.6.24	R6.6.28	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・奥村組土木興業共同企業体
		16	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その2）	R4.6.24	R5.6.30	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・本間組共同企業体
		17	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その3）	R4.6.23	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	竹中土木・森本組共同企業体
		18	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その4）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・大鉄工業共同企業体
		19	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その5）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	大林組・大鉄工業共同企業体
		20	2025年日本国際博覧会協会 会場基盤整備工事（その6）	R4.6.24	R6.10.31	2025年日本国際博覧会の開催に基づく、会場基盤 整備	熊谷組・ガイアート共同企業体

夢洲関連工事 令和4年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
電力施設	関西電力送配電(株)	21	夢洲島内管路新設工事（1 工区）	R2.5.28	R5.2.28	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅰ、Ⅱ街区】	(株)松野組
		22	夢洲島内管路新設工事（1 1 工区）	R4.1.24	R5.4.28	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅶ街区】	(株)きんでん
		23	夢洲島内管路新設工事（4 工区）	R4.2.7	R5.2.28	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅲ街区】	五十嵐工業(株)
		24	夢洲内大阪広域環境施設組合 北港事務所単独地中化	R4.5.25	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への地中電線管路の新設工事【観光Ⅰ、Ⅱ期】	(株)かんでんエンジニアリング 大阪北支店
		25	舞洲 S S 内夢洲内管路新設工事	R4.8.17	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への地中電線管路の新設工事【臨港Ⅰ街区】	
上水道施設	大阪市水道局	26	夢洲東1丁目（その2）600mm配水管布設工事	R3.7.16	R4.11.30	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への配水管の新設工事【夢洲コンテナターミナル線】	(株)シオン
		27	夢洲中1丁目（その4）400mm 配水管布設工事他	R4.3.22	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への配水管の新設工事【観光Ⅲ期】	(株)福山建設
		28	北港白津1丁目外（その2）600mm 配水管敷設工事 （夢洲～舞洲共同シールド内配管）	R4.3.25	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への配水管の新設工事【夢舞シールド】	(株)久本組
		29	夢洲東1丁目外300mm 大口給水管布設工事	R4.8.12	R4.12.28	大阪・関西万博開催地及び I R 開業地等への給水管の新設工事【観光Ⅲ期、臨港Ⅲ街区】	(有)E.S.C
下水道施設	日本下水道事業団	30	大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事 その3	R.3.12.16	R7.3.31	夢洲島内の雨水・排水管渠の築造工事 【観光Ⅱ期・Ⅳ期、臨港Ⅱ・Ⅲ・Ⅶ街区、 夢洲コンテナターミナル線、夢舞シールド、舞洲14・16・18 号線、夢洲抽水所、舞洲抽水所】	大林・大本・久本JV

夢洲関連工事 令和4年10月時点で稼働している工事の契約状況

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
通信施設	西日本電信電話株式会社 (エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株))	31	大阪北総22RN0001電気通信設備工事 此花ビル舗装先行工事(夢洲)	R4.4.13	R6.6.10	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への地中電気通信管路の新設工事	エクシオグループ(株)
自治体 管路	大阪港湾局 (関西電力送配電(株))	32	夢洲自治体管路新設工事	R3.3.17	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工事	(株)かんでんエンジニアリング大阪北支店
	大阪港湾局 (エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株))	33	夢洲自治体管路新設工事	R3.4.23	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工事	エクシオグループ(株)

【舞洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
道路・橋梁	大阪市建設局	34	此花大橋改良工事－2	R3.10.19	R4.11.30	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、I Rを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	酒井工業(株)大阪本社
		35	此花大橋埋立地取付橋改良工事－2	R3.10.19	R4.11.30	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、I Rを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	酒井工業(株)大阪本社
		36	舞洲東高架橋整備に伴う 道路照明設備改良工事	R4.9.15	R5.5.31	2025年日本国際博覧会の開催及び「夢洲まちづくり構想」に基づく、I Rを含む国際観光拠点に向けた基盤整備	(株)三好電気商会
上水道 施設	大阪市水道局	37	北港白津1丁目外600mmその他配水管布設工事他	R3.3.16	R5.2.28	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管の新設工事【舞洲1・14・16号線】	明雄建設(株)

夢洲関連工事 令和4年10月時点で稼働している工事の契約状況

【その他地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道 施設	大阪市水道局	38	此花枝管600mm配水管布設工事他	R3.3.9	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びI R開業地等への配水管の新設工事	(株)ケンセイ

夢洲関連インフラ整備事業の計画工程の主な変更点

- ① 未調整区間の埋設管路の工程調整の完了
- ② 道路工事の工程を R7 年 3 月完成から R6 年 12 月完成へ前倒し


■ 夢洲関連インフラ整備（夢洲地区 道路）

- 観光外周道路（観光Ⅰ～Ⅳ期）
 - ・ R4 年度実施の道路及び埋設管路工事について、工事箇所、時期について詳細調整を行い、R4 年度中に実施できるよう調整
 - ・ 道路工事については、R6 年 12 月末までに完了できるよう、工程の前倒し
- 夢洲中央幹線道路（臨港Ⅰ～Ⅲ街区）
 - ・ R4 年度実施の道路及び埋設管路工事について、工事箇所、時期について詳細調整を行い、R4 年度中に実施できるよう調整
 - ・ 道路工事については、観光外周道路と同様、R6 年 12 月末までに完了できるよう、工程の前倒し
- 夢洲内物流道路（臨港Ⅳ～Ⅶ街区、コンテナターミナル線）
 - ・ 高架橋の施工計画をもとに、R5 年度の高架橋工事と埋設管路工事について、詳細調整を実施し、埋設管理工事が R5 年度中に実施できるよう調整

■ 夢洲関連インフラ整備（その他工事）

- Ⅰ R 拡張予定地における変電所整備工事の追加
 - ・ 万博開催時に電力の安定供給が可能となるよう、万博開催時までに変電所を整備

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

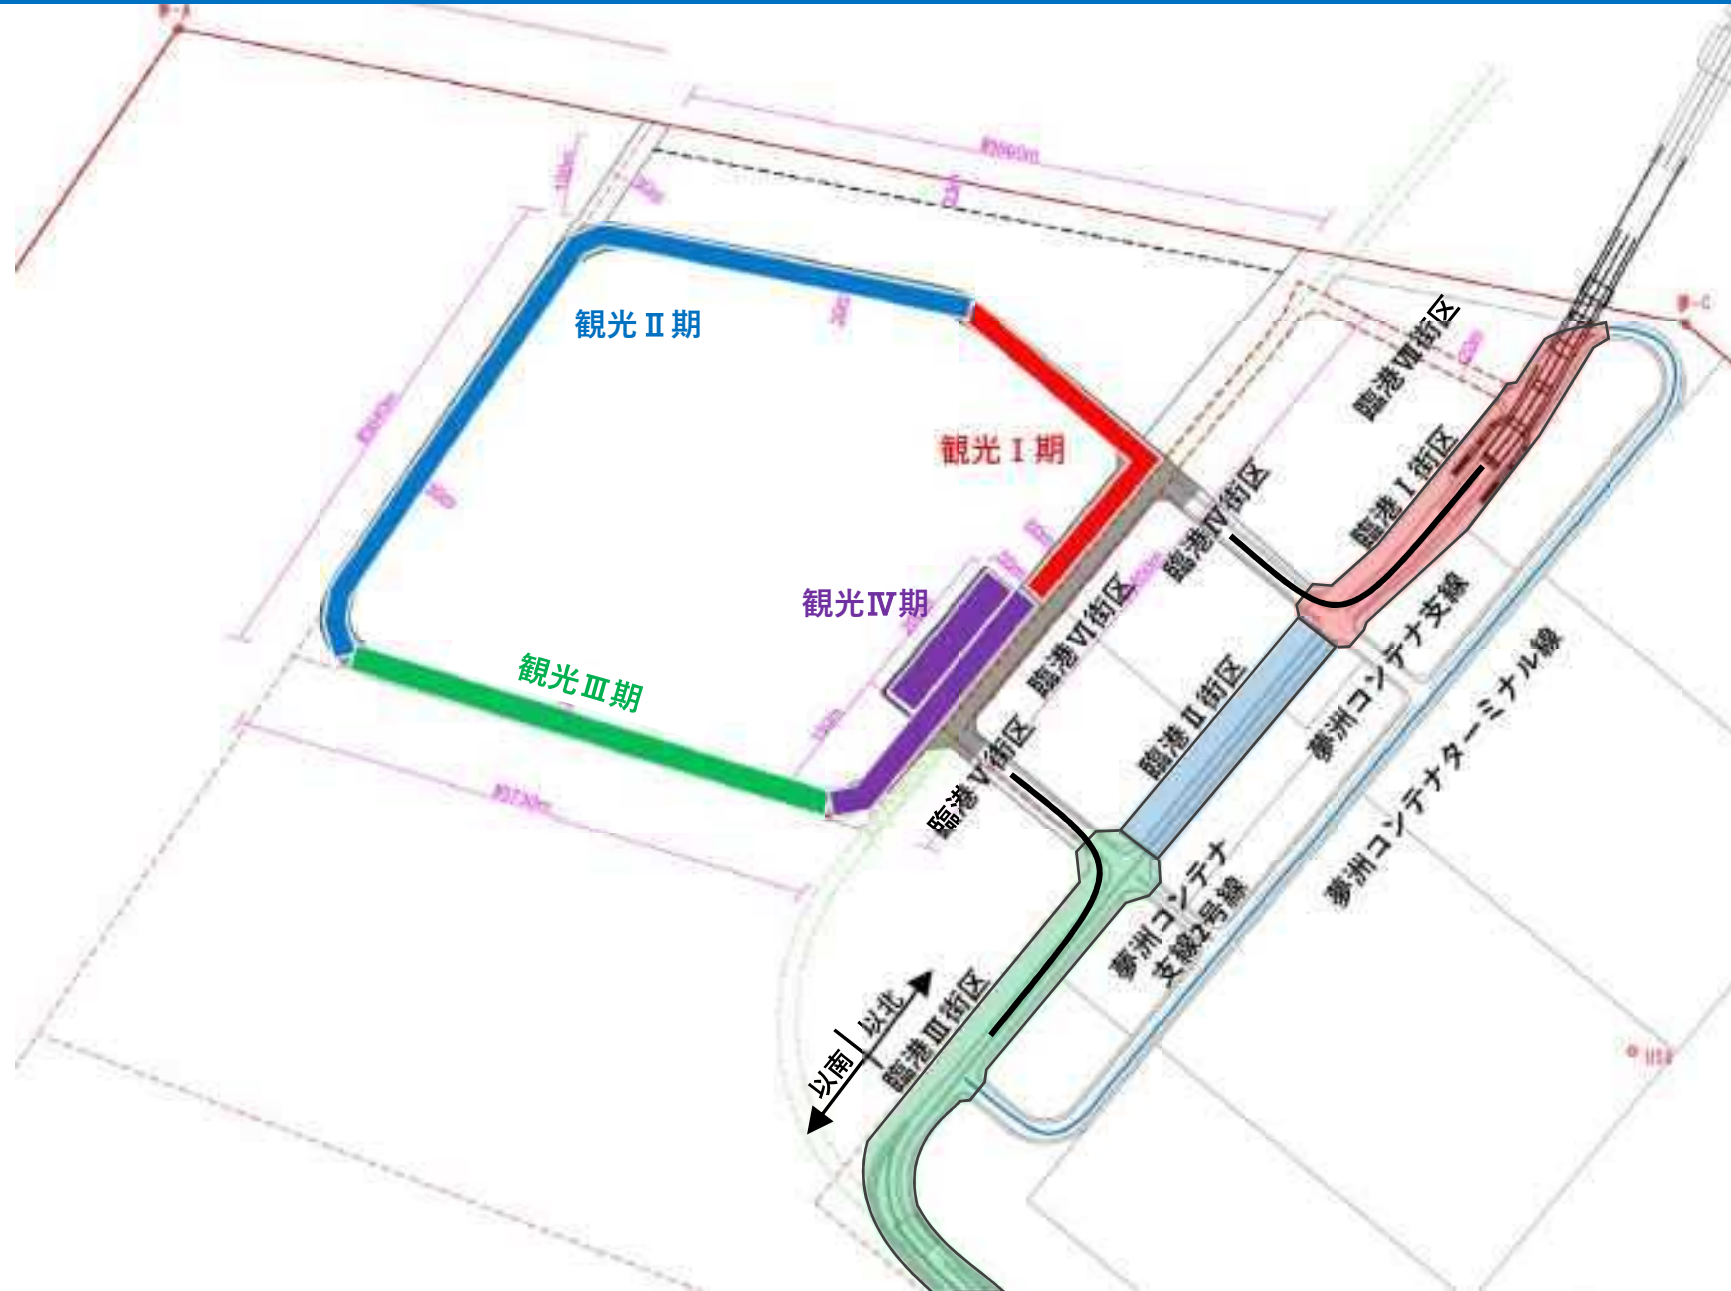

※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
工区								
観光Ⅰ期 （北・東）	道路			基層まで施工		歩道舗装・道路付属物等	表層	施工完了
	下水（污水）							施工完了
	下水（雨水）							施工完了
	水道							施工完了
	NTT（MH）							施工完了
	関電送配電（特高）							施工完了
	関電送配電（高低）							施工完了
	ガス							施工完了
観光Ⅱ期 （北・西）	道路	盛土期間	圧密沈下期間		基層まで施工	歩道舗装・道路付属物等	表層	施工完了
	下水（污水）							施工完了
	下水（雨水）							施工完了
	水道							
	NTT（MH）							
	関電送配電（特高）			東西				施工完了
	関電送配電（高低）							
	ガス				東西			
観光Ⅲ期 （南） （万博敷地側）	道路	盛土期間	圧密沈下期間			車道・歩道・道路付属物等		
	下水（污水）							施工完了
	下水（雨水）							施工完了
	水道							施工完了
	NTT（MH）							
	ガス							
観光Ⅳ期 （東） （駅前交通広場前）	道路						車道・歩道・道路付属物等	
	鉄道 駅舎部 地下横断通路							
	下水（污水）							
	下水（雨水）							
	水道							
	NTT（MH）							
	NTT（HH）							
	ガス							

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（污水・雨水）

上水道

自治体管路

NTT

ガス

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部

自転車道部

車道部

破線：変更前（第7回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
工区								
臨港Ⅰ街区 夢洲中央幹線:北側（夢舞大橋側）	道路							
	高架橋							
	下水（污水）							施工完了
	NTT（MH）							
	関電送配電（特高）							
	関電送配電（高低）							
	ガス							施工完了
	自治体管路							
	電柱撤去・移設							施工完了
臨港Ⅱ街区 夢洲中央幹線:中央	道路							
	下水（污水）							施工完了
	NTT（MH）							
	関電送配電（特高）							施工完了
臨港Ⅲ街区 以北 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路							
	高架橋							
	下水（污水）							施工完了
	下水（雨水）							
	NTT（MH）							
	関電送配電（特高）							施工完了
	自治体管路							施工完了
	電柱撤去・移設							
臨港Ⅲ街区 以南 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路							
	下水（污水）							
	下水（雨水）							
	NTT（MH）							
	関電送配電（特高）							
	自治体管路							施工完了
	電柱撤去・移設							

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（污水・雨水）

上水道

自治体管路

NTT

ガス

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部 自転車道部 車道部

破線：変更前（第7回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
工区								
臨港Ⅳ街区 夢洲2号線 山九・上組 北側 夢洲北高架道路下	道路							
	高架橋				下部工等	上部工	歩道舗装 本復旧	
	下水（汚水）			南側		北側		施工完了
	下水（雨水）							
	水道							
	NTT（MH）			南側 南側（残工事）		南側		
	関電送配電（特高）							施工完了
	関電送配電（高低）							
	ガス			北側				施工完了
	自治体管路					北側		
	港湾局（切土工事）		北側					施工完了
	電柱撤去・移設							施工完了
臨港Ⅴ街区 夢洲1号線 山九・上組 南側 夢洲南高架道路下	道路							
	高架橋				下部工等	上部工	歩道舗装 本復旧	
	下水（汚水）		南側 北側			南側		施工完了
	下水（雨水）							
	水道（既設移設）		北側 南側					施工完了
	水道（新設）			北側				
	NTT（MH）					北側		
	関電送配電（特高）							施工完了
	関電送配電（高低）							
	自治体管路							
	港湾局（切土工事）							施工完了
	電柱撤去・移設							施工完了
臨港Ⅵ街区 夢洲中央線 山九・上組 西側 観光外周道路側	道路							
	鉄道 駅舎部 インフラ外							2024年度(R6)のインフラ外工事は、駅舎内部における建築・設備工事であり、道路上での作業はなし
	下水（雨水）							
	水道							
	NTT（MH）							
	関電送配電（高低）							
	自治体管路				東側			
	電柱撤去・移設							

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路）～計画工程表～

凡例：歩道部
自転車道部
車道部

破線：変更前（第7回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
工区								
臨港Ⅶ街区 夢洲5号線 F護岸近辺	下水（污水）				南側			施工完了
	関電送配電（特高）							
	自治体管路				南側			
	電柱撤去・移設							
夢洲コンテナターミナル線	道路							
	下水（污水）							
	水道							施工完了
夢洲コンテナ支線 北側 東西道路	下水（污水）							施工完了
	水道							施工完了
夢洲コンテナ支線 2号線 南側 東西道路	水道							施工完了

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（污水・雨水）


上水道

自治体管路

NTT

ガス

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事） ～整備箇所図～

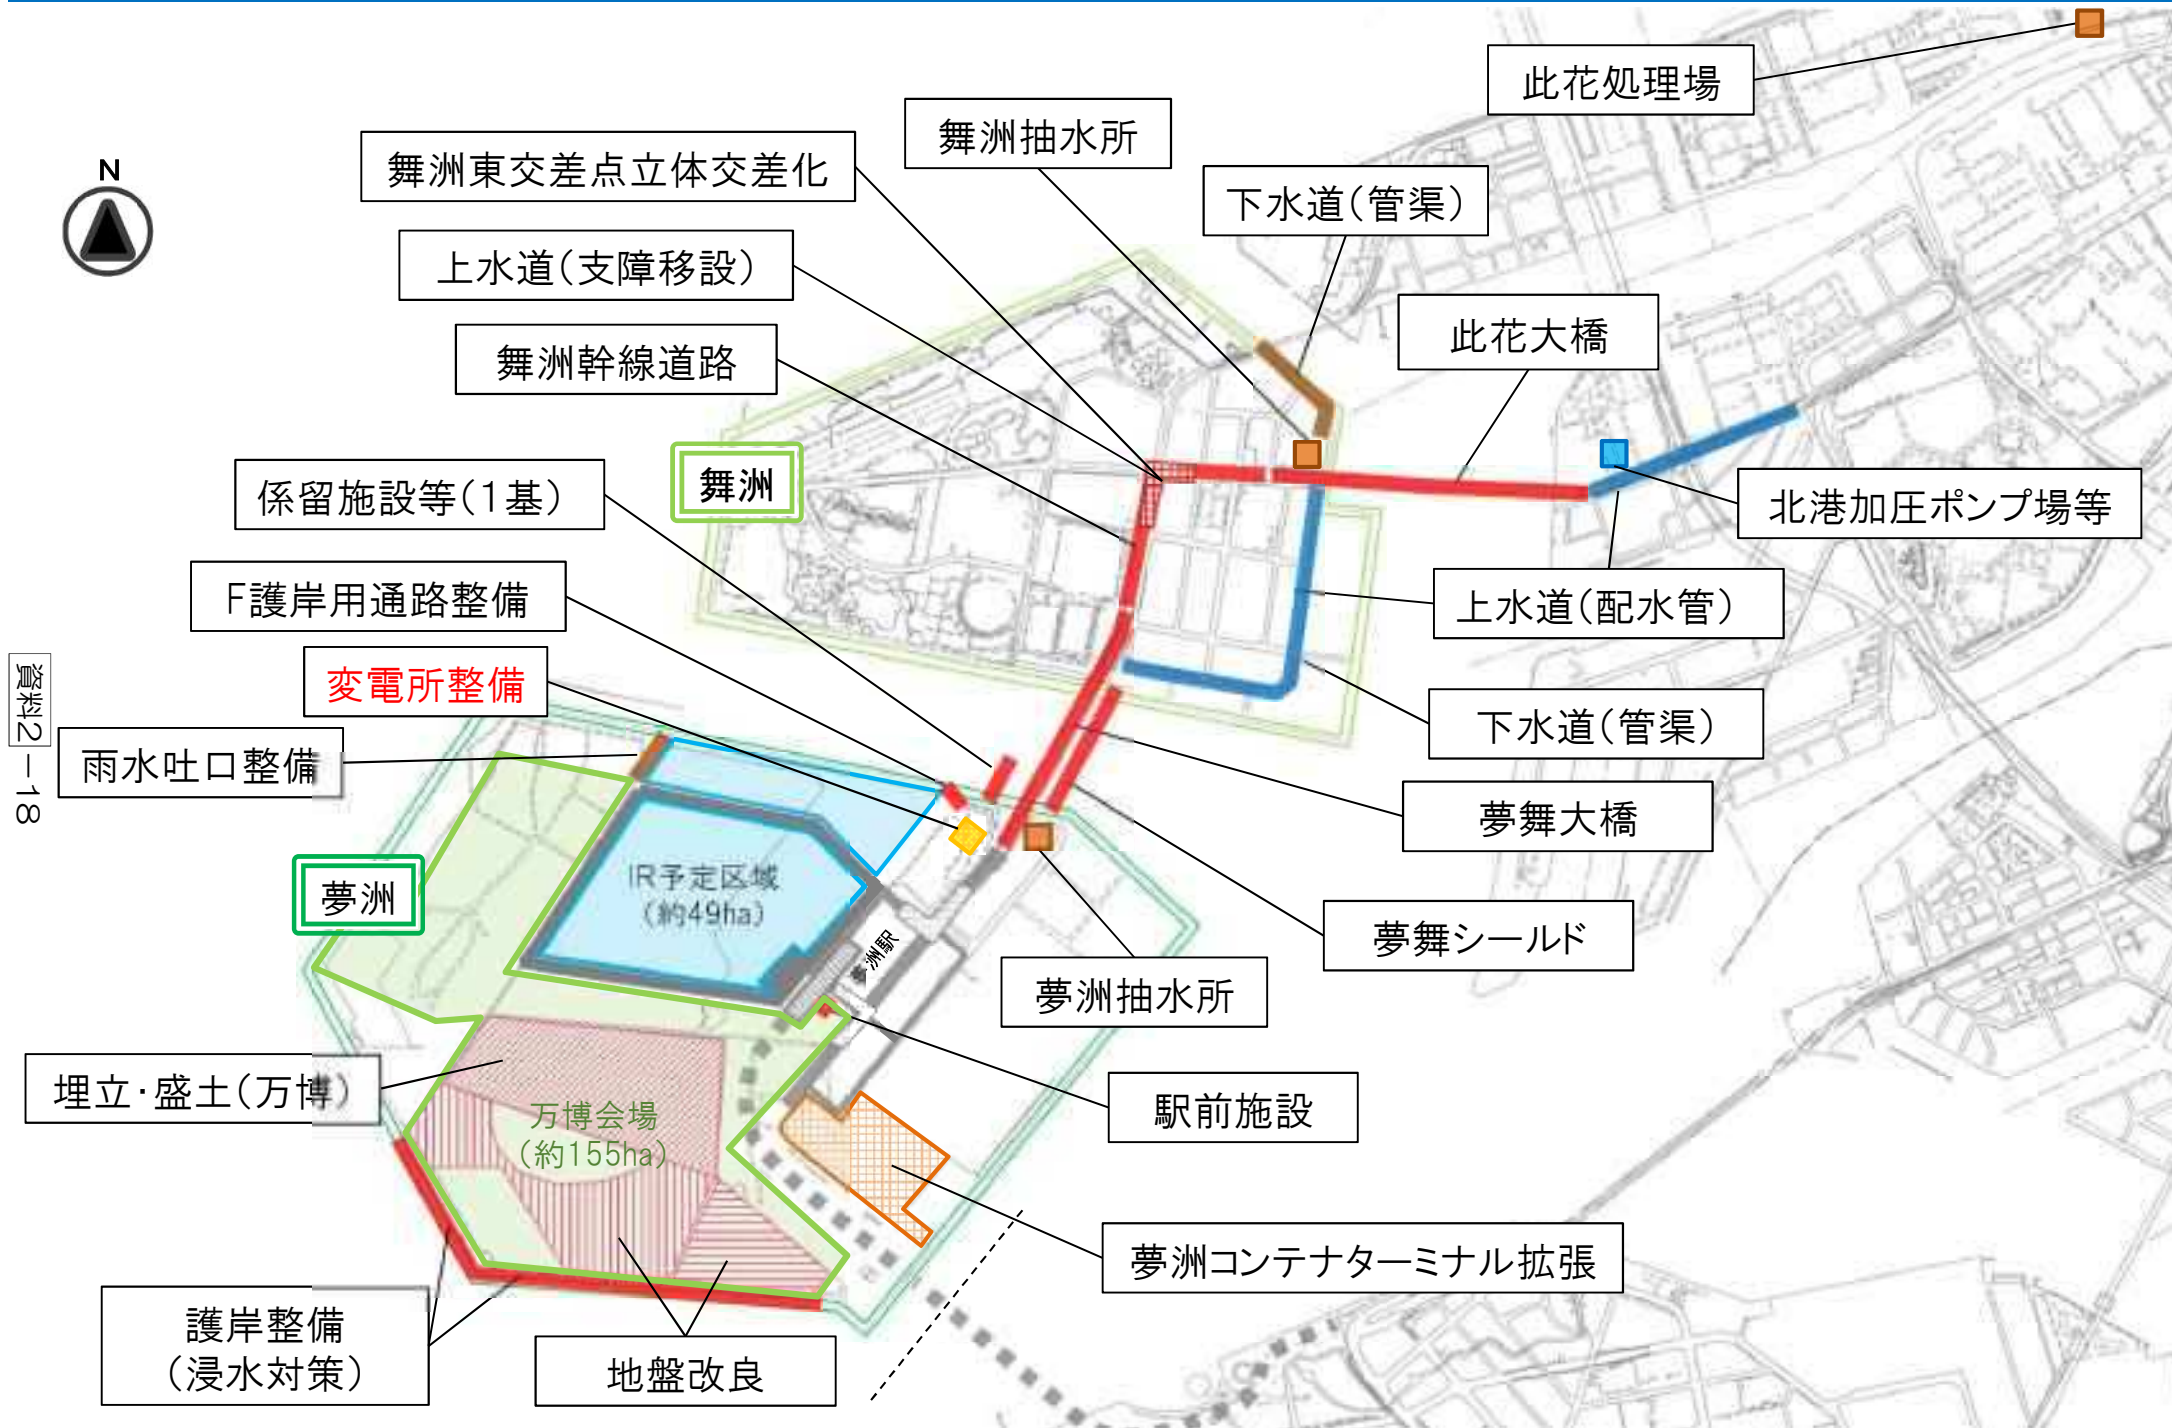

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

破線：変更前（第7回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考	
工区	夢洲地区		道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道						・ 2024年12月末までに供用開始予定 ・ 2025年1月～3月は場内復旧予定
	夢洲抽水所								
	雨水吐口工事								
	駅前施設								
	係留施設	浮桟橋							
		波除堤							
	F護岸工事用通路								
	浸水対策（G・H護岸）								
	埋立・盛土 （万博）	盛土							施工完了
		地盤改良	南西						
南東									
夢洲コンテナターミナル拡張									
変電所整備									
舞洲地区	此花大橋	道路改良							
		塗装工事							
	舞洲幹線道路								
	舞洲東 交差点 立体交差化	立体交差化							
		水道（支障移設）							
	夢舞大橋								
	舞洲11・14・ 16・18号線	舗装工事							舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないよう通行時間帯などを調整し施工するため、万博開催に影響なし
		水道工事							
		下水道管渠 （舞洲立坑～舞洲抽水所）							
	下水道管渠 （舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）								
舞洲抽水所								・ 2024年12月末までに供用開始予定 ・ 2025年1月～3月は場内復旧予定	

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

破線：変更前（第7回）夢洲等まちづくり事業調整会議
実線：変更後（第8回）夢洲等まちづくり事業調整会議

年度		2019年度（R1）	2020年度（R2）	2021年度（R3）	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	備考
工区								
夢舞 シールド	水道	道路・港湾 関西電力送配電 下水道（汚水・雨水） 上水道						
	下水（汚水）							
	関電送配電（特高）						4月1日から供給	
	関電送配電（高低圧）							
その他	此花処理場							・2024年12月末までに供用開始予定 ・2025年1月～3月は場内復旧予定
	水道	配水管						
		北港加圧 ポンプ場等						
