


夢洲関連事業の事業説明について

令和4年9月22日

大阪市建設局

夢洲関連事業の概要

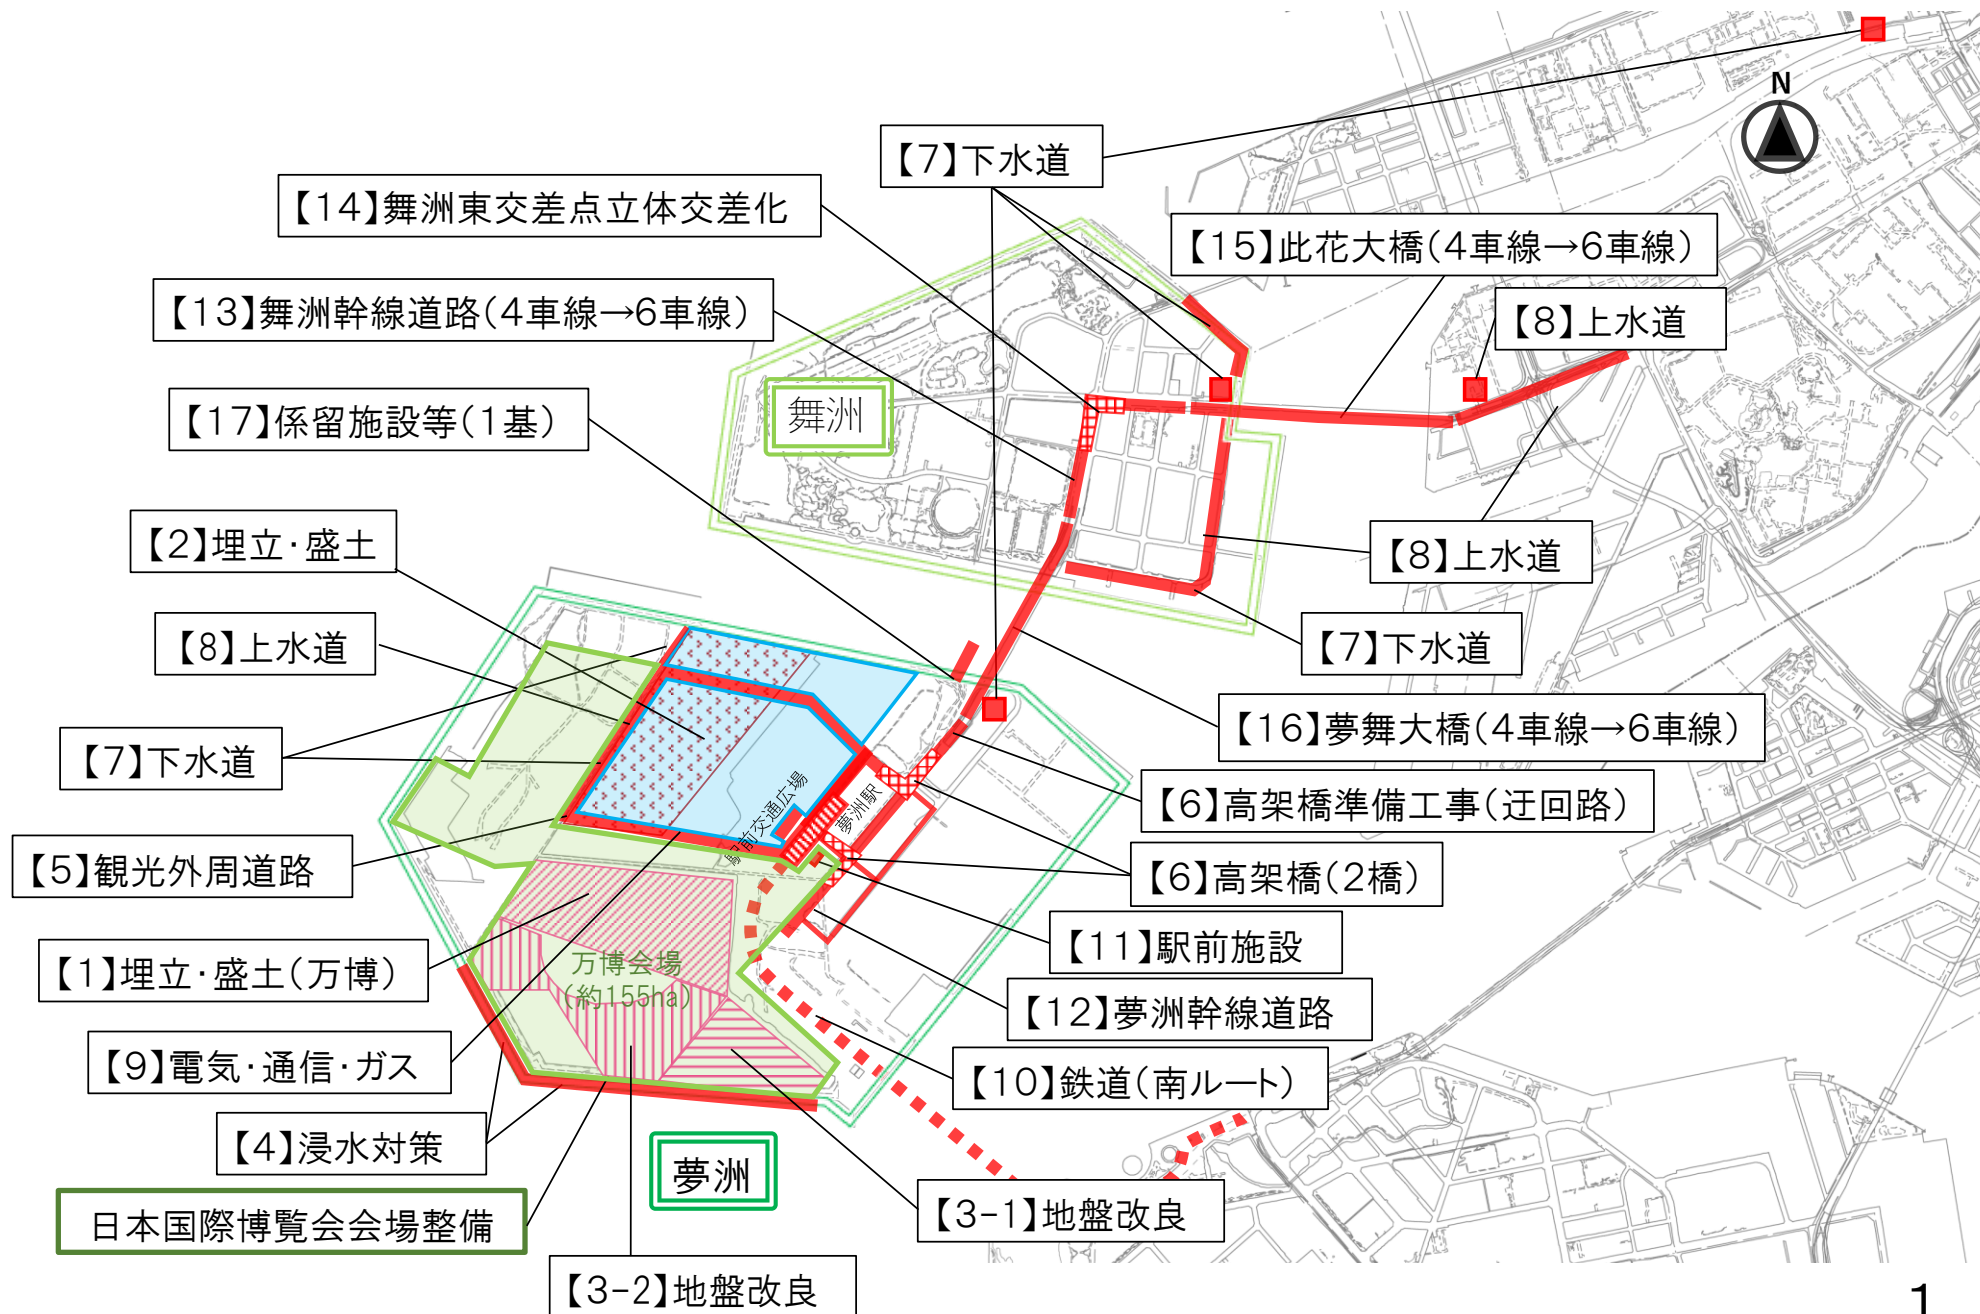

夢洲関連事業の計画工程表

▽R4年9月現在

インフラ整備 箇所図番号	項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況 (R4年6月末時点)	
			H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	～	工事契約	現場着手
万博	大阪・関西万博	開催期間：(始)2025年 4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積：155ha パビリオン等：約110区画		基本計画	検討・設計等			整地・インフラ工事		開催	撤去工事※				○	
				基本計画	検討・設計等			パビリオン等建築工事								
					●基本計画策定					●4～10月	※撤去工事完了時期未定					
IR	IR	敷地面積約49ha ※区域認定時期は国スケジュールによる ※諸般状況によって1～3年程度後ろ倒しになる可能性がある			公募・設計等										※開業(2029年秋～冬頃)	
						●事業者決定	●区域認定									
インフラ整備	[1]	埋立・盛土(万博)		地盤改良・盛土											○	完了
	[2]	埋立・盛土(IR)		埋立・盛土											○	完了
	[3-1]	地盤改良				地盤改良									○	○
	[3-2]	地盤改良					地盤改良								○	○
	[4]	浸水対策(G・H護岸)					工事								○	○
	[5]	観光外周道路		予備設計	詳細設計等		工事								○	○
	[6]	(仮称)夢洲北高架橋		迂回路 詳細設計等	迂回路 工事										○	○
				予備設計	詳細設計等		工事(下部工、上部工等)								○	○
		(仮称)夢洲南高架橋		予備設計	詳細設計等		工事(下部工、上部工等)								○	○
	[7]	下水道		詳細設計等			工事								○	○
		夢洲抽水所(新設)、舞洲抽水所(増設)		詳細設計等			工事								○	○
	[8]	上水道		詳細設計等			工事								○	○
		北港加圧ポンプ場等(機能増強)		詳細設計等			工事								○	○
	[9]	電気・通信・ガス		詳細設計等			工事								○	○
		配管等		詳細設計等			工事								○	○
	[10]	鉄道(南ルート)		基本検討 調査等											○	○
		駅前施設		設計等			工事(開業準備込)								○	○
	[11]	夢洲幹線道路(周辺道路含む)					工事(組立等)		工事(掘進工等)						○	○
	[12]	舞洲幹線道路					設計等		工事(開業準備込)						○	○
	[13]	舞洲東交差点立体交差化					設計等		工事						○	○
	[14]	此花大橋		予備設計	詳細設計等		工事(6車線化)		詳細設計等		工事(歩道設置)				○	○
	[15]	夢舞大橋					詳細設計等	工事							○	完了
	[16]	係留施設等					詳細設計等	工事(浮桟橋)	詳細設計等	工事(待合所)					○	○
	[17]	波除堤(L=60m)					詳細設計等		工事							
	[18]	消防拠点整備							設計等		工事					
物流・工事車両	[19]	CONPASの導入					概略・詳細設計、試験期間中の改修	試験運用開始	本格運用						○	完了
		車両待機場の整備					詳細設計	工事							○	○
		ターミナルゲートの時間延長					概略設計	詳細設計	工事							
		荷捌き地の拡張(ゲート増設)					社会実験			社会実験	実施				○	○
		咲洲ヘシフト					検討・協議等		システム導入							
		咲洲ヘシフト					検討・協議等		増設ゲート工事		運用					
物流・工事車両	工事車両対策	運搬日、時間帯等を調整					検討・協議等		ガントリークレーン整備	運行開始	本格稼働					
							社会実験									
							検討		本格実施							

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中

25件 24件
