

用地取得率・工事進捗率共に90%以上の事業の一覧(8事業)

No	年度 No	事業名等	対応 方針	進捗率	意見
1	H26 -03	街路[建設局] 大和川北岸線 (公園南矢田) 整備事業	事業 継続 (B)	事業費 [△] -入 96%[96%] 用地取得率 94%[94%] 工事進捗率 98%[98%]	H21意見 「重点整備路線」に位置付けられていないものの、事業進捗率が高く事業完了の 目途が立っており、残る歩道未整備区間 における歩行者の安全性の確保に向け、 着実に継続実施を図る必要があることから、 評価は「事業継続(B)：予算の範 囲内で着実に継続実施するもの」とす る。
2	H25 -06	街路[建設局] 田辺出戸線(長吉出戸) 整備事業	事業 継続 (B)	事業費 [△] -入 94%[94%] 用地取得率 98%[98%] 工事進捗率 99%[52%]	「事業の必要性」「事業の実現見通し」 「事業の優先度」の3つの視点での分析 も適切であり、事業継続(B)とする評 価案は妥当である。(全委員)
3	H25 -07	街路[建設局] 長吉線整備事業	事業 継続 (B)	事業費 [△] -入 99%[99%] 用地取得率 98%[98%] 工事進捗率 99%[99%]	「事業の必要性」「事業の実現見通し」 「事業の優先度」の3つの視点での分析 も適切であり、事業継続(B)とする評 価案は妥当である。(全委員)
4	H25 -15	都市公園[建設局] 鶴見緑地事業	事業 継続 (B)	事業費 [△] -入 99.8%[98%] 用地取得率 100%[99.8%] 工事進捗率 97%[97%]	「事業の必要性」「事業の実現見通し」 「事業の優先度」の3つの視点での分析 も適切であり、事業継続(B)とする評 価案は妥当である。(全委員)
5	H25 -18	都市公園[建設局] 中之島西公園事業	事業 継続 (C)	事業費 [△] -入 98%[98%] 用地取得率 97%[97%] 工事進捗率 95%[95%]	「事業の必要性」「事業の実現見通し」 「事業の優先度」の3つの視点での分析 も適切であり、事業継続(C)とする評 価案は妥当である。(全委員)
6	H25 -22	河川[建設局] 城北川改修事業	事業 継続 (A)	事業費 [△] -入 99%(87%)[85%] 護岸工100%(92%)[91%] 築堤工100%(64%)[60%] 浚渫工 93%(68%)[47%] 橋梁工 92%(48%)[44%] 水門工100%(100%)[100%] ()は前回評価時の事業 規模に対する進捗	「事業の必要性」「事業の実現見通し」 「事業の優先度」の3つの視点での分析 も適切であり、事業継続(A)とする評 価案は妥当である。(全委員)
7	H23 -12	公園[建設局] 津守中央公園	事業 継続 (B)	事業費ベース99.7% 工事進捗率：95.7%	・ 前回再評価の結果および一部供用して いる区域において既に大勢の人々に広く 利用されていることから、投資効果があ り、事業の必要性は高い。 ・ 厳しい財政状況の中で長期化している が、用地取得は完了し工事進捗率は 95.7%と高いことから、事業完了時期の 実現可能性が高い。 ・ 既に大勢の人々に広く利用されている 一方で、交通量が多く幅員の大きい新た にわ筋に面した側にフェンス等で囲まれ た未整備区域が残り景観上問題があるた め、事業遅延による影響は大きい。 ・ 以上より、所管局の自己評価「事業継 続(B)：着実に継続実施するもの」は 妥当である。
8	H22 -07	公園[建設局] 扇町公園	事業 継続 (B)	事業費ベース95.5% 用地取得率 100 % 工事進捗率 95.3% (面積ベース)	できるだけ早期に公園機能を回復し、事 業を完了させる必要性は認められると ころであり、ホームレスの自立支援、自主 撤去に向け取り組み、平成24年度までに 事業を完了させる見通しを立てているこ とから、評価としては、「事業継続 (B)：予算の範囲内で着実に継続実施 するもの」とする。


1 大和川北岸線（公園南矢田）街路[建設局]

図2 進捗状況


(4 事業の実現見通しの視点 ③事業規模)

残事業の内容

- 用地取得 3件 (391㎡)
- 道路工事(延長 63m、面積 190㎡)
- 残事業費 約 1億円

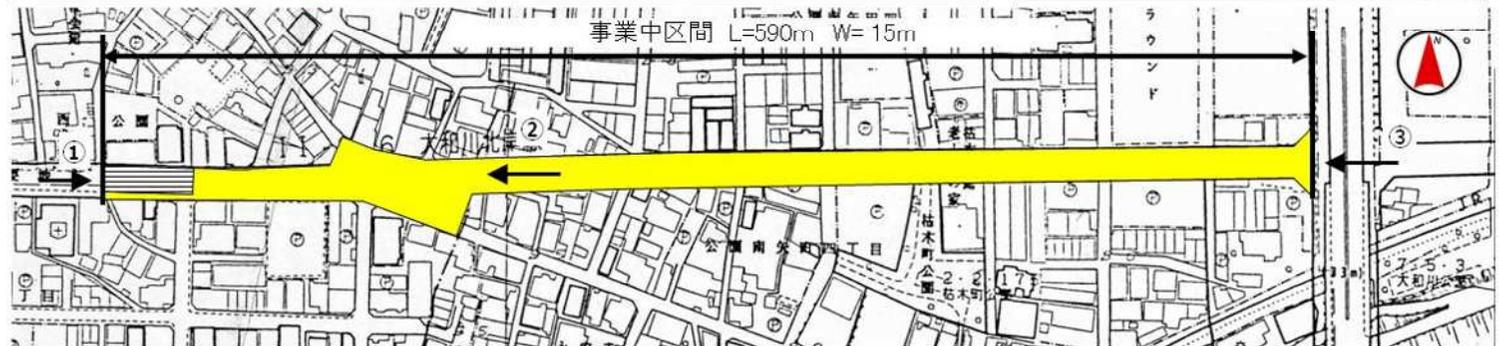

計画断面図
15.00



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率：94%（面積ベース）
工事進捗率：98%（面積ベース）


事業費ベース進捗率：96%

※ 残用地取得物件には、建築物等がなく、車両等の安全な通行を確保するため、権利者と調整の上、車道を整備している。


※このため、工事進捗率が用地取得率を上回っている。

2 田辺出戸線(長吉出戸)整備事業 街路[建設局]

大阪都市計画道路 田辺出戸線

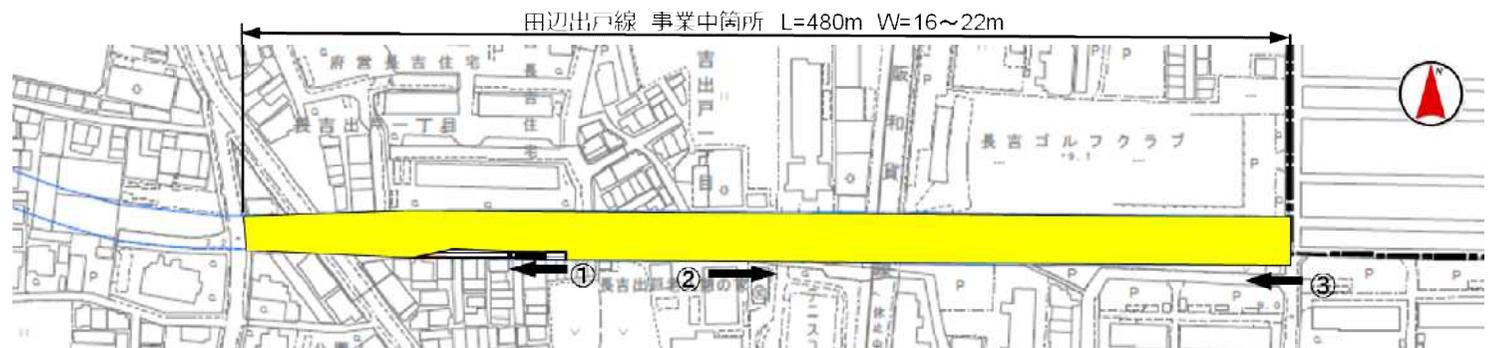

田辺出戸線 標準横断面図



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率：98% (面積ベース)
 工事進捗率：99% (面積ベース)
 事業費ベース進捗率：96%

3 長吉線整備事業 街路[建設局]


大阪都市計画道路 長吉線(旧瓜破長吉線)



長吉線(旧瓜破長吉線) 事業中箇所 L=665m W=16m



長吉線 標準横断面図



凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所

用地取得率：98%（面積ベース）
 工事進捗率：99%（面積ベース）
 事業費ベース進捗率：99%

4 鶴見緑地事業 都市公園[建設局]

鶴見緑地事業の進捗



5 中之島西公園事業 都市公園[建設局]

中之島西公園事業の進捗





6 城北川改修事業 河川[建設局]

事業概要・事業目的



7 津守中央公園 公園[建設局]

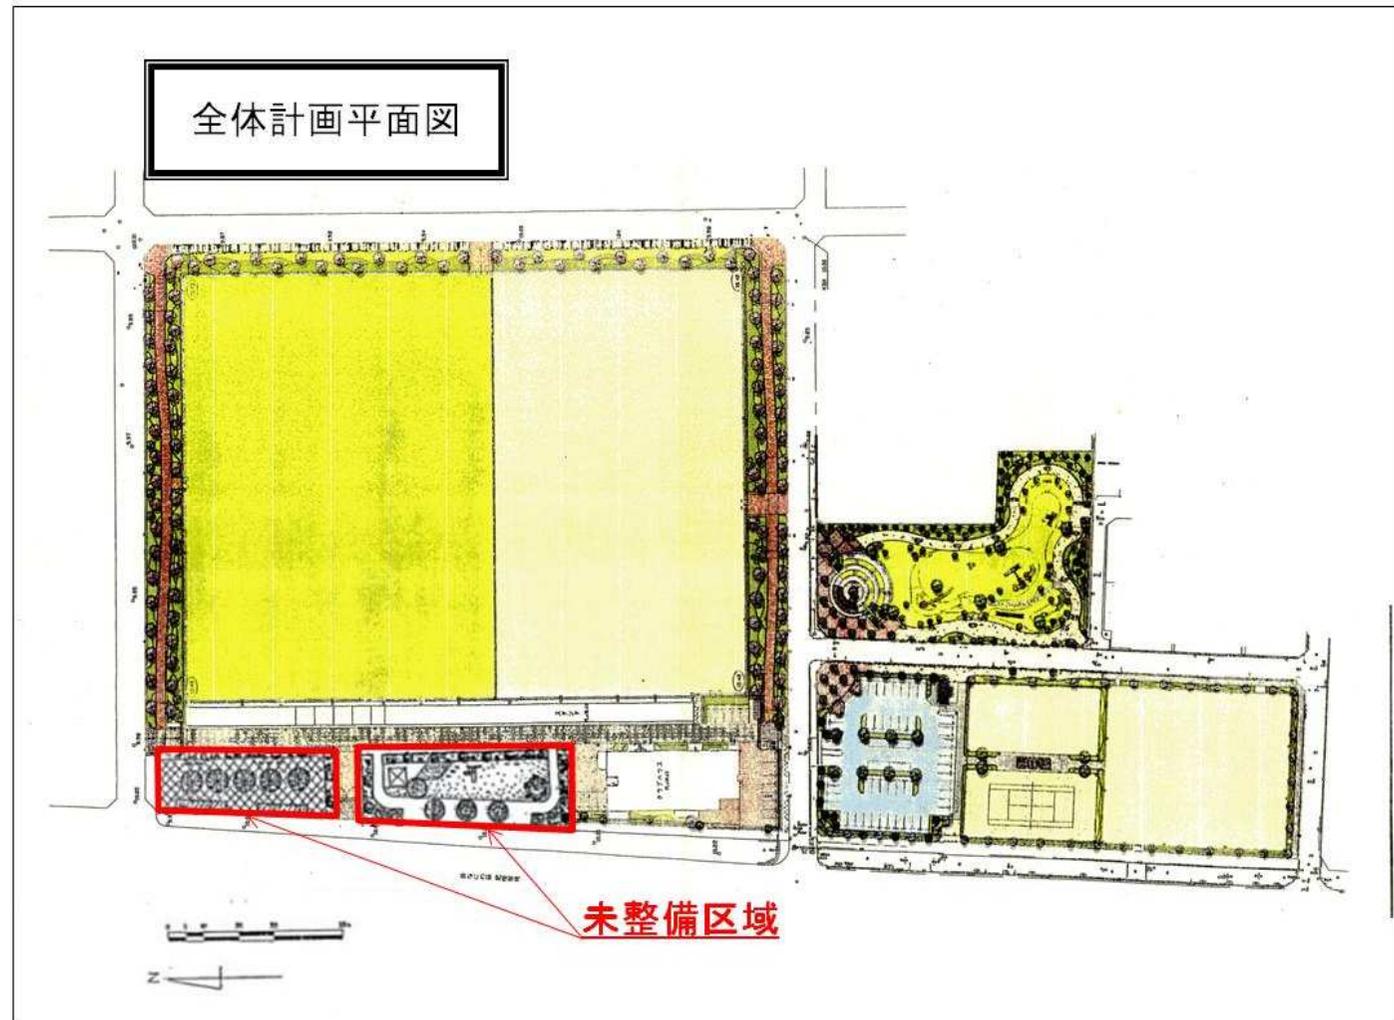

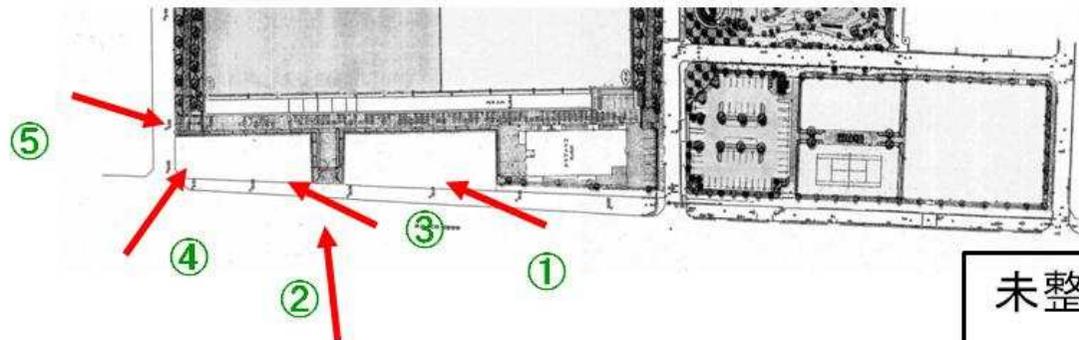

未整備区域

8 扇町公園

公園[建設局]

扇町公園施設整備状況

