



## 循環洗浄イメージ図



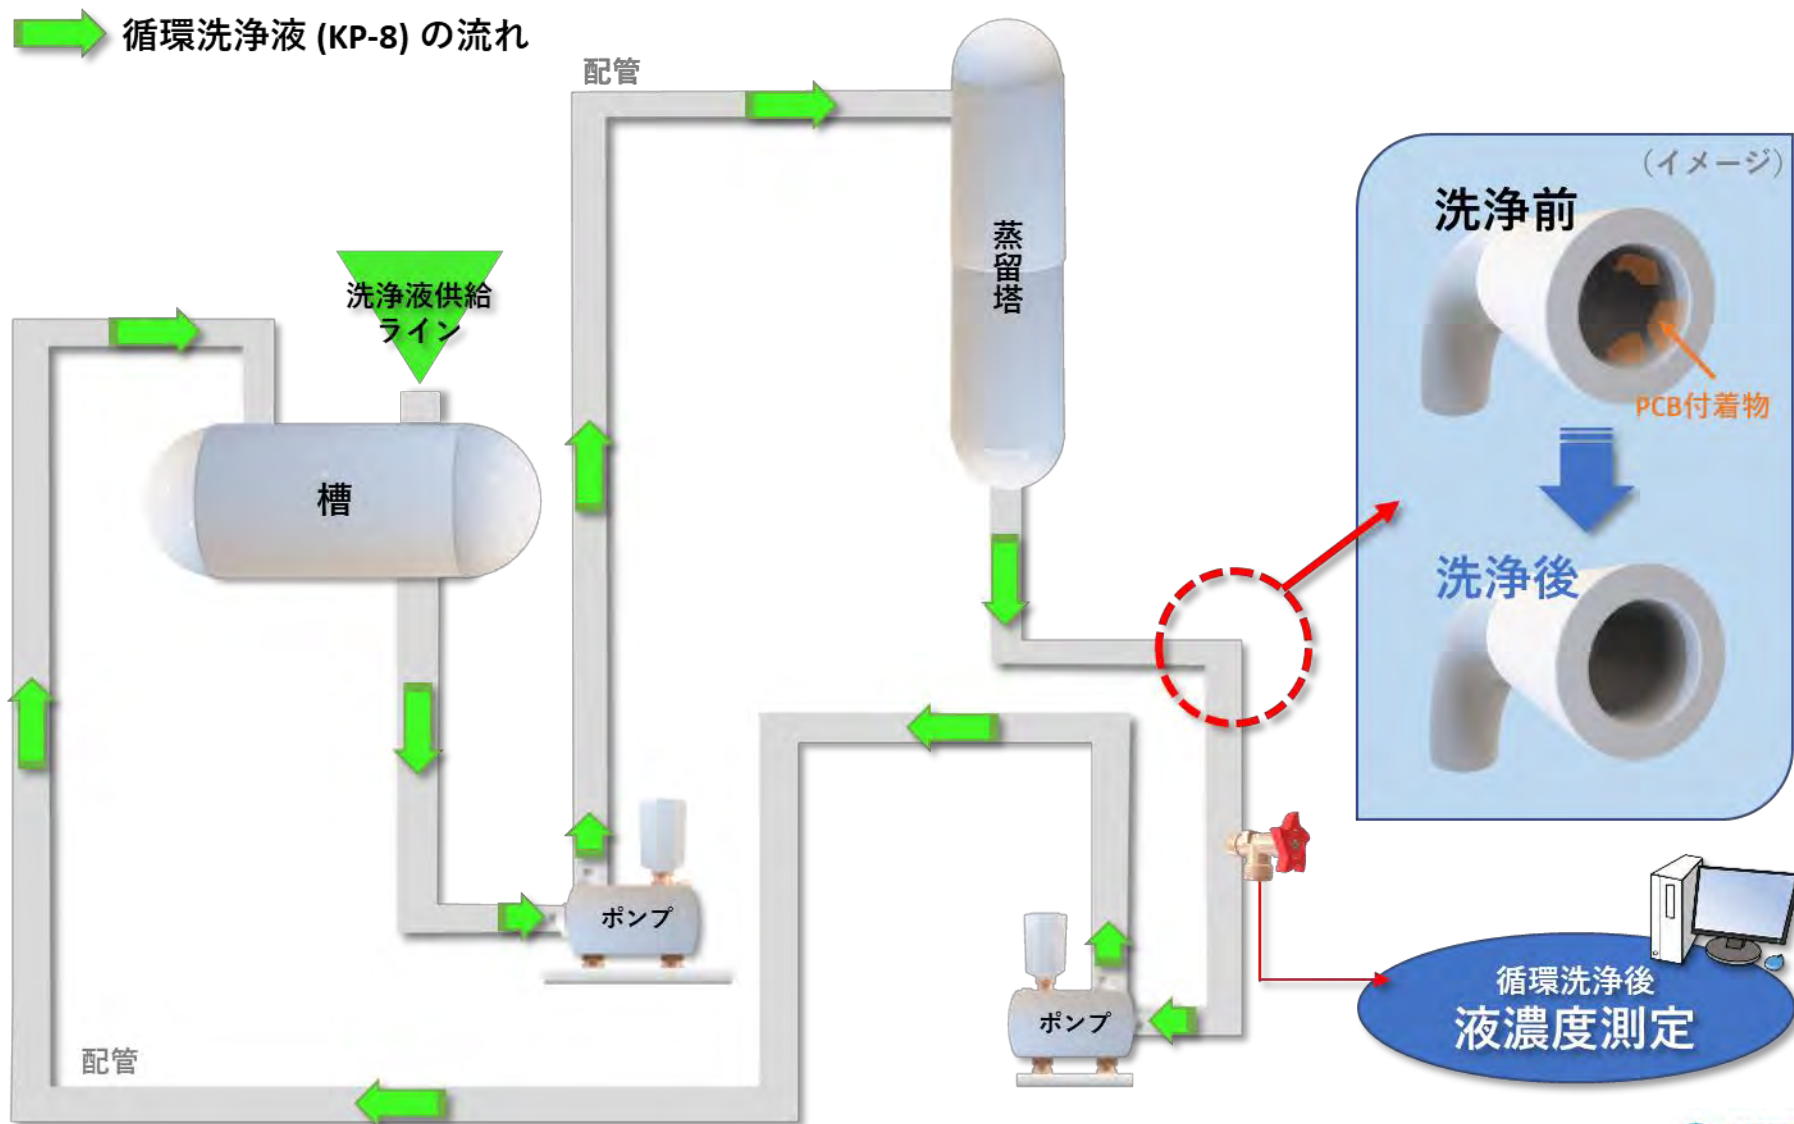


## 浸漬洗浄イメージ図

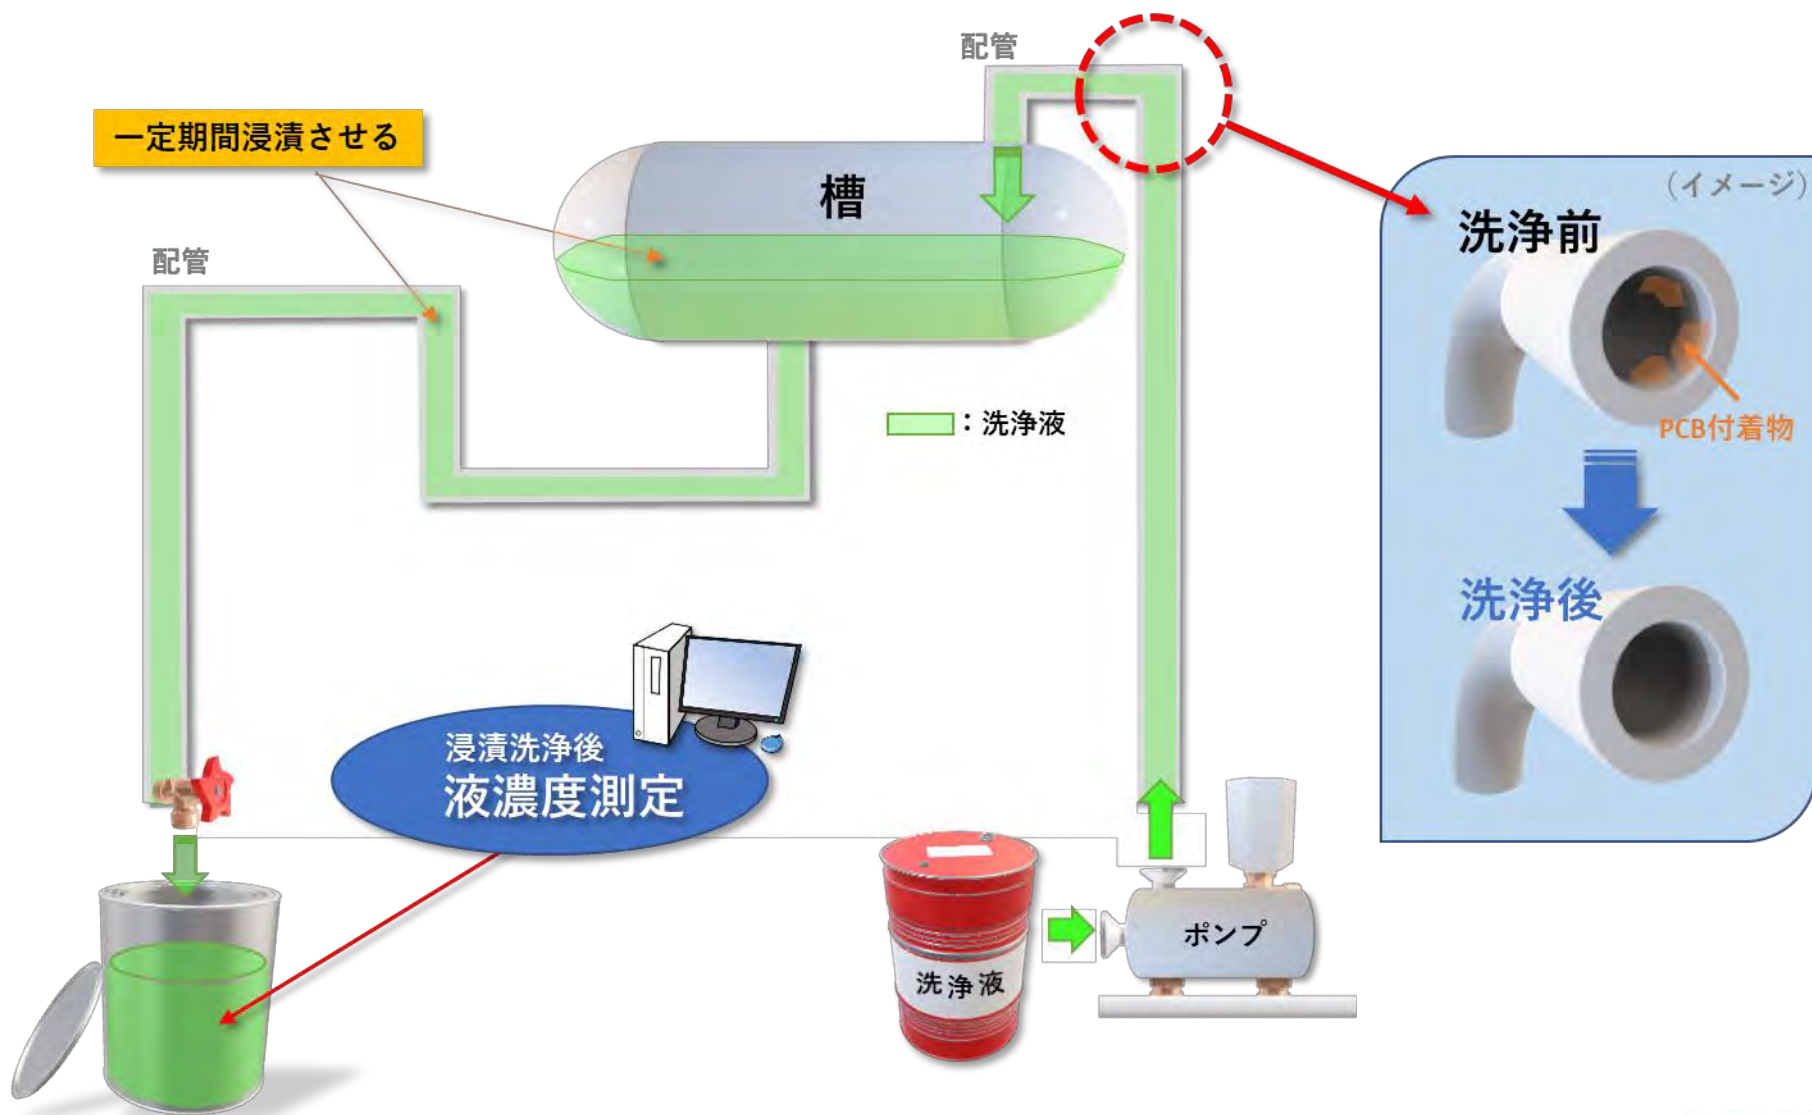

# 小型解体室解体撤去工事（その2）解体撤去前後の写真

- 小型解体室に残存している装置・機器類 約76t を令和6年5月末に解体撤去済み。



# 小型解体室解体撤去工事（その2）解体撤去作業から無害化处理認定施設への払い出しまで

## 解体撤去前




## 解体撤去作業中

### セーバーソーによる切断



### 切断後

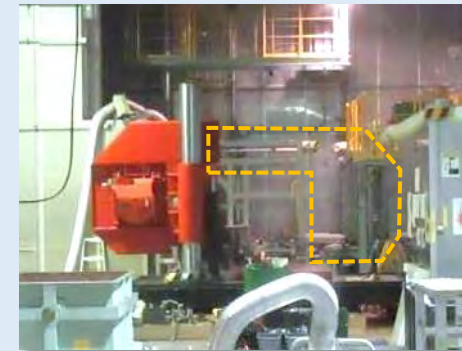

## 払い出し




トラックに積み込み覆い施し払い出しを行う

## ラッピング作業等



ラッピング材で密封した撤去品は専用トレイに入れたまま払出す

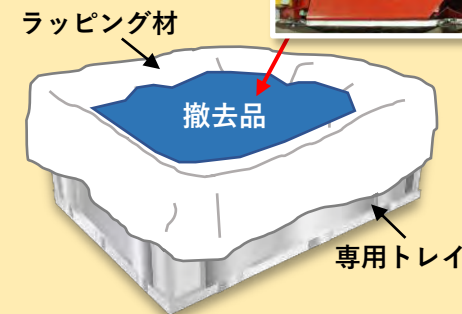


切断した撤去品をラッピング材を敷いた専用トレイに詰める

# 大型解体室解体撤去工事

- 令和6年度において、大型解体室の装置・機器類約177tを解体撤去工事を実施します。



## 大型解体室 解体撤去装置配置図及び主な装置写真

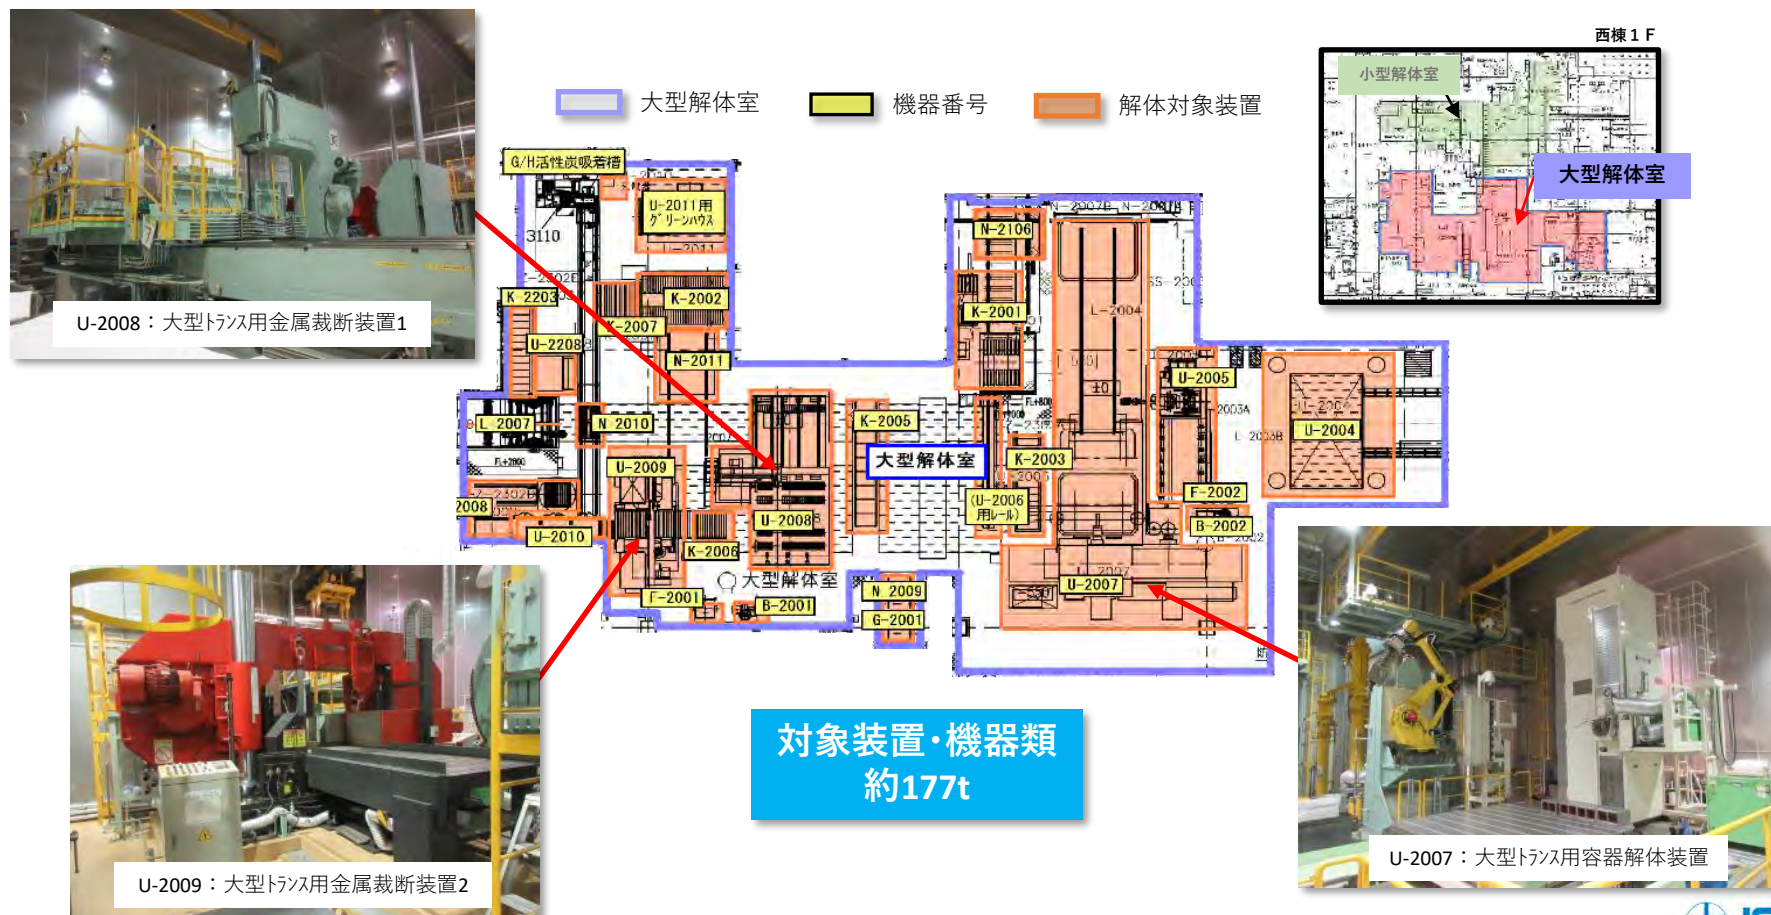

# 大型解体室解体撤去工事 進捗状況


大型解体室
  機器番号
  解体対象装置
  解体撤去装置

解体撤去（一例）

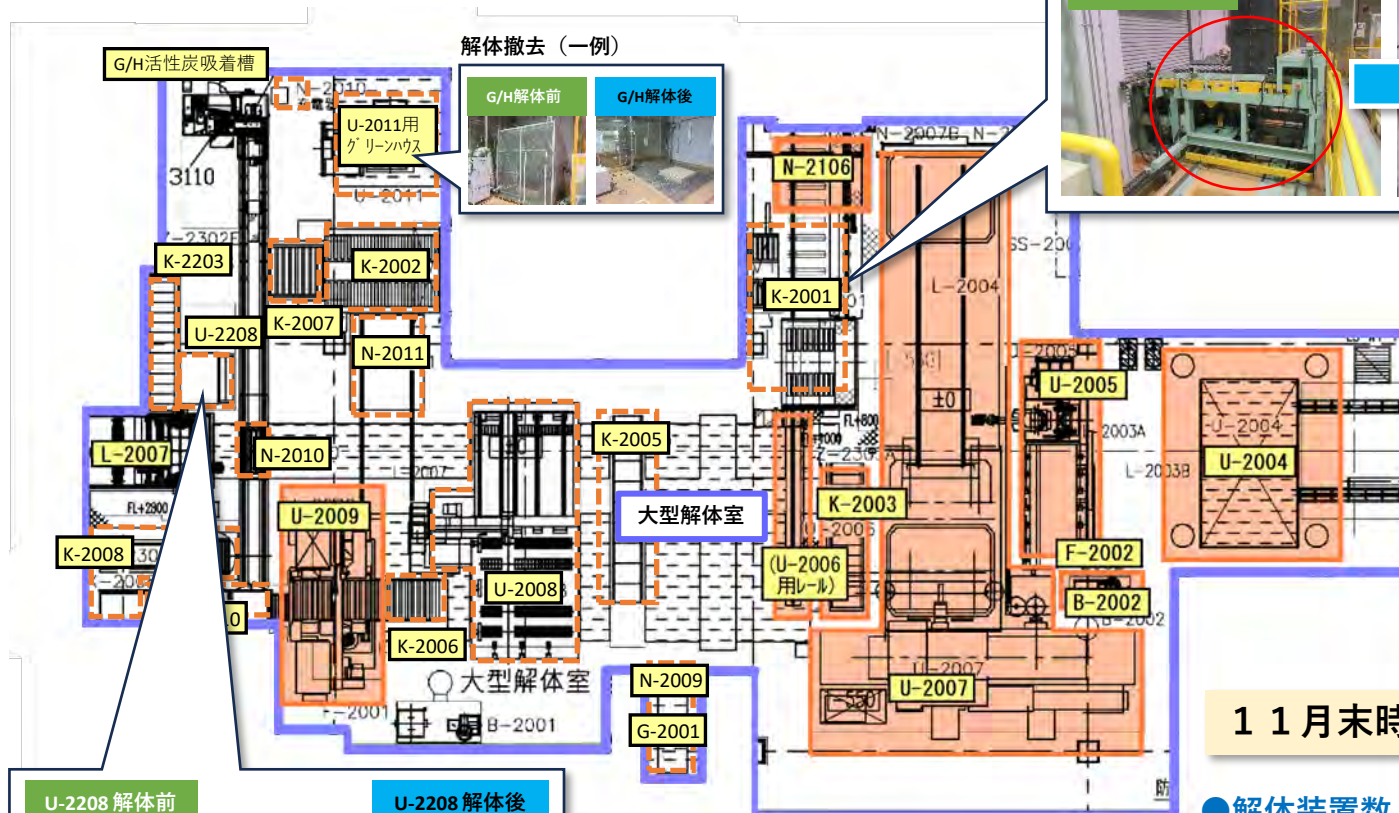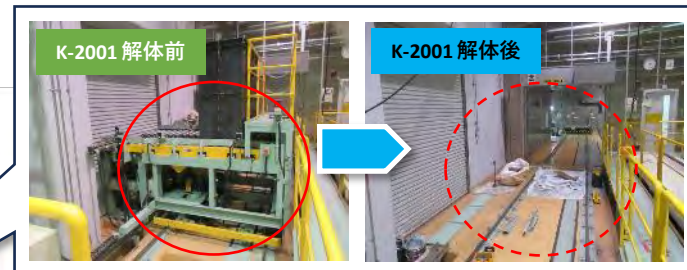

## 11月末時点での進捗状況

- 解体装置数：18基済（残13基）
- 払出し重量：68.1 ton
- 進捗率：38.5%




解体撤去（一例）

# 保温材等払出し イメージ

保温材の取外し

配管から保温材を取る

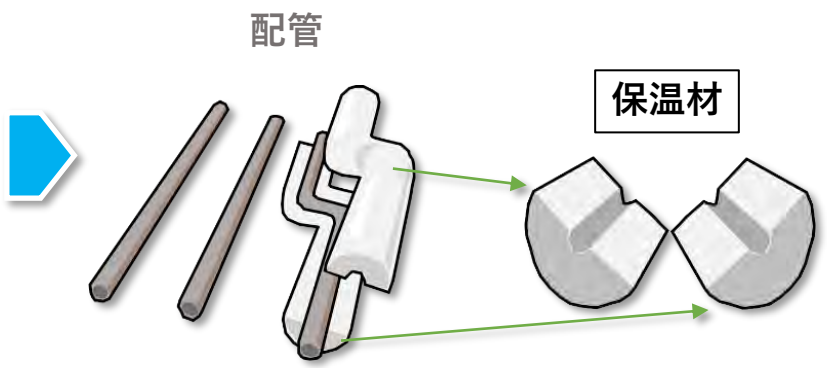


取り外した保温材をビニール袋に入れる。

フレコンバッグをトラックに積み込む



トラックにて払出し

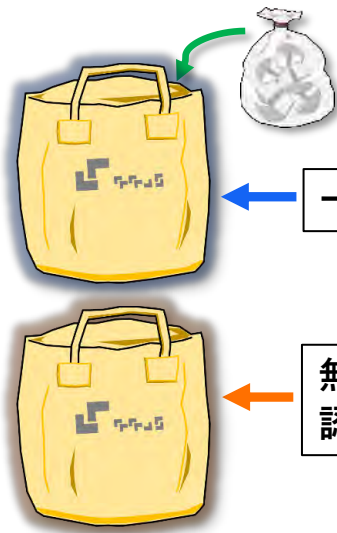

一般産廃

無害化処理認定施設

$\leq 0.5\text{mg/kg}$

分析結果

$> 0.5\text{mg/kg}$



採取したサンプルの分析

ビニール袋に入れた保温材をフレコンバッグに入れる。

# プラント設備解体撤去工事

項目		令和6年度											令和7年度											
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	月																							
	抜油設備	設備撤去工事																						
	蒸留設備			保温材撤去工事										設備撤去工事										
	中間処理設備				保温材撤去工事								設備撤去工事											
VTR設備	D号機									設備撤去工事														
	C号機																		設備撤去工事					
	B号機	設備稼働																						
	A号機	設備稼働																						

