



5 今後のスケジュール


工事全体工程

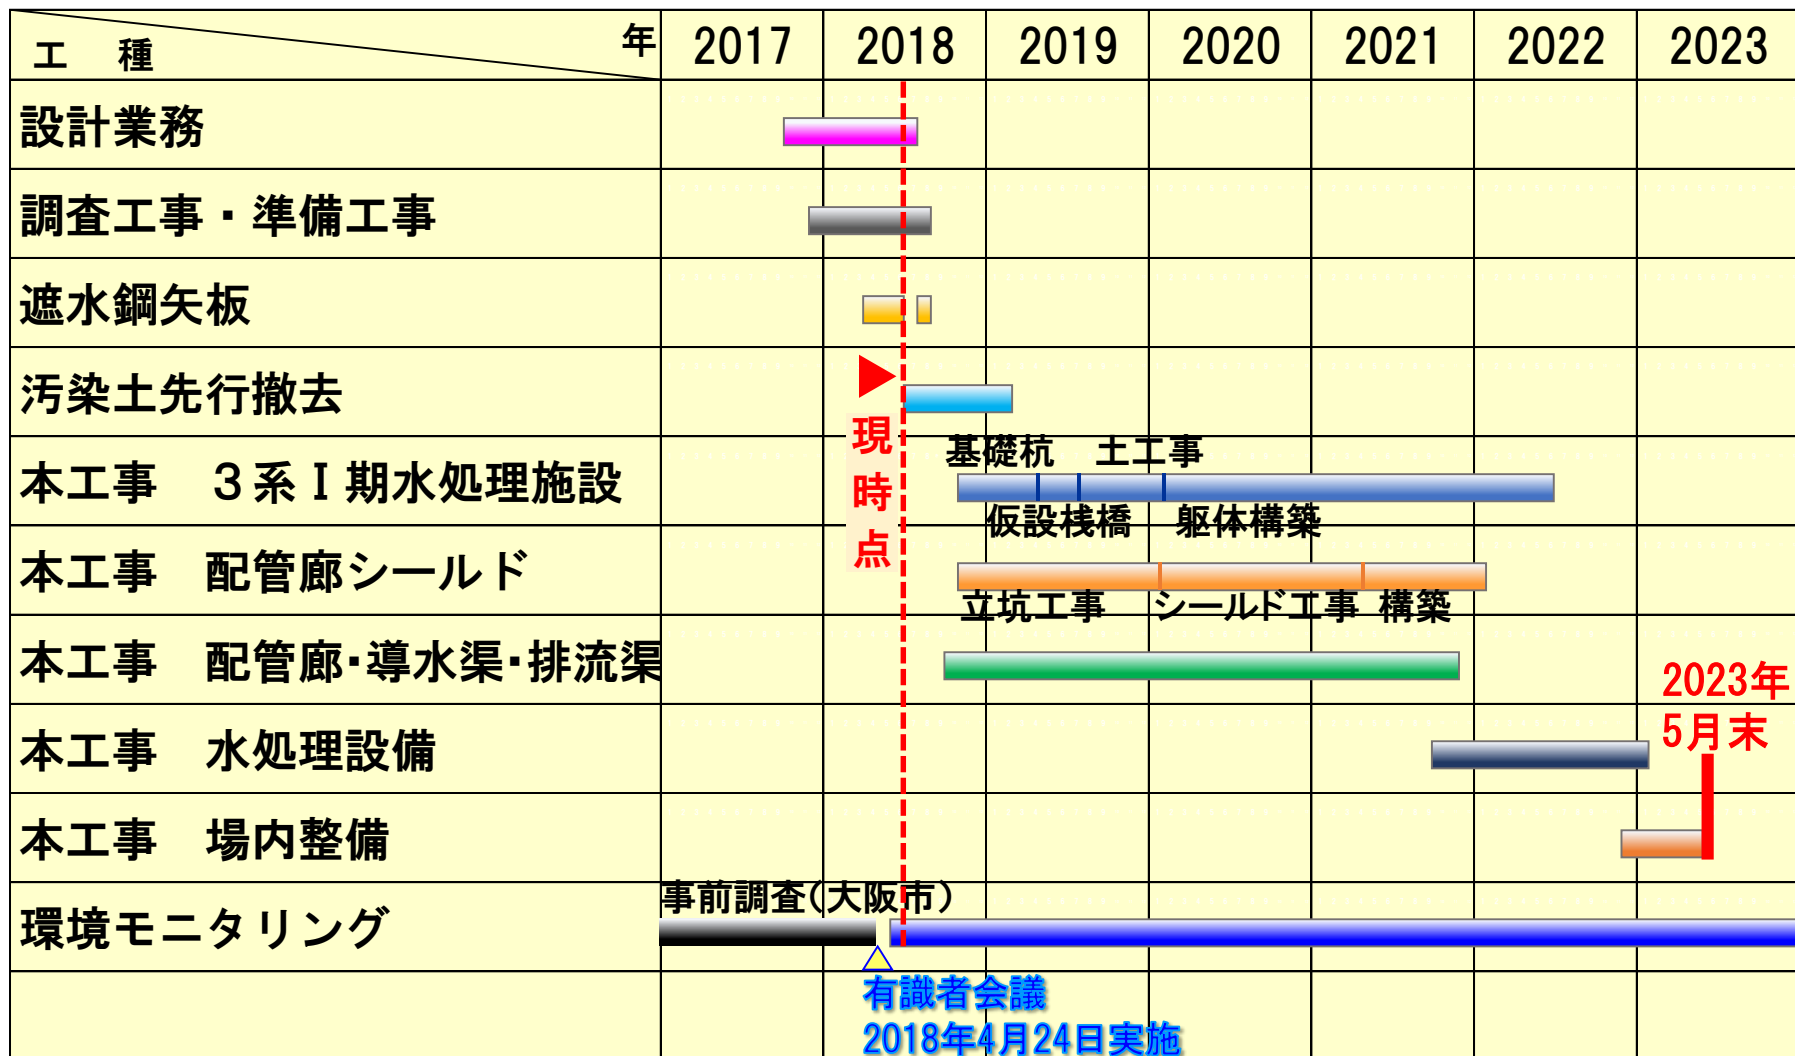

当面の工事工程

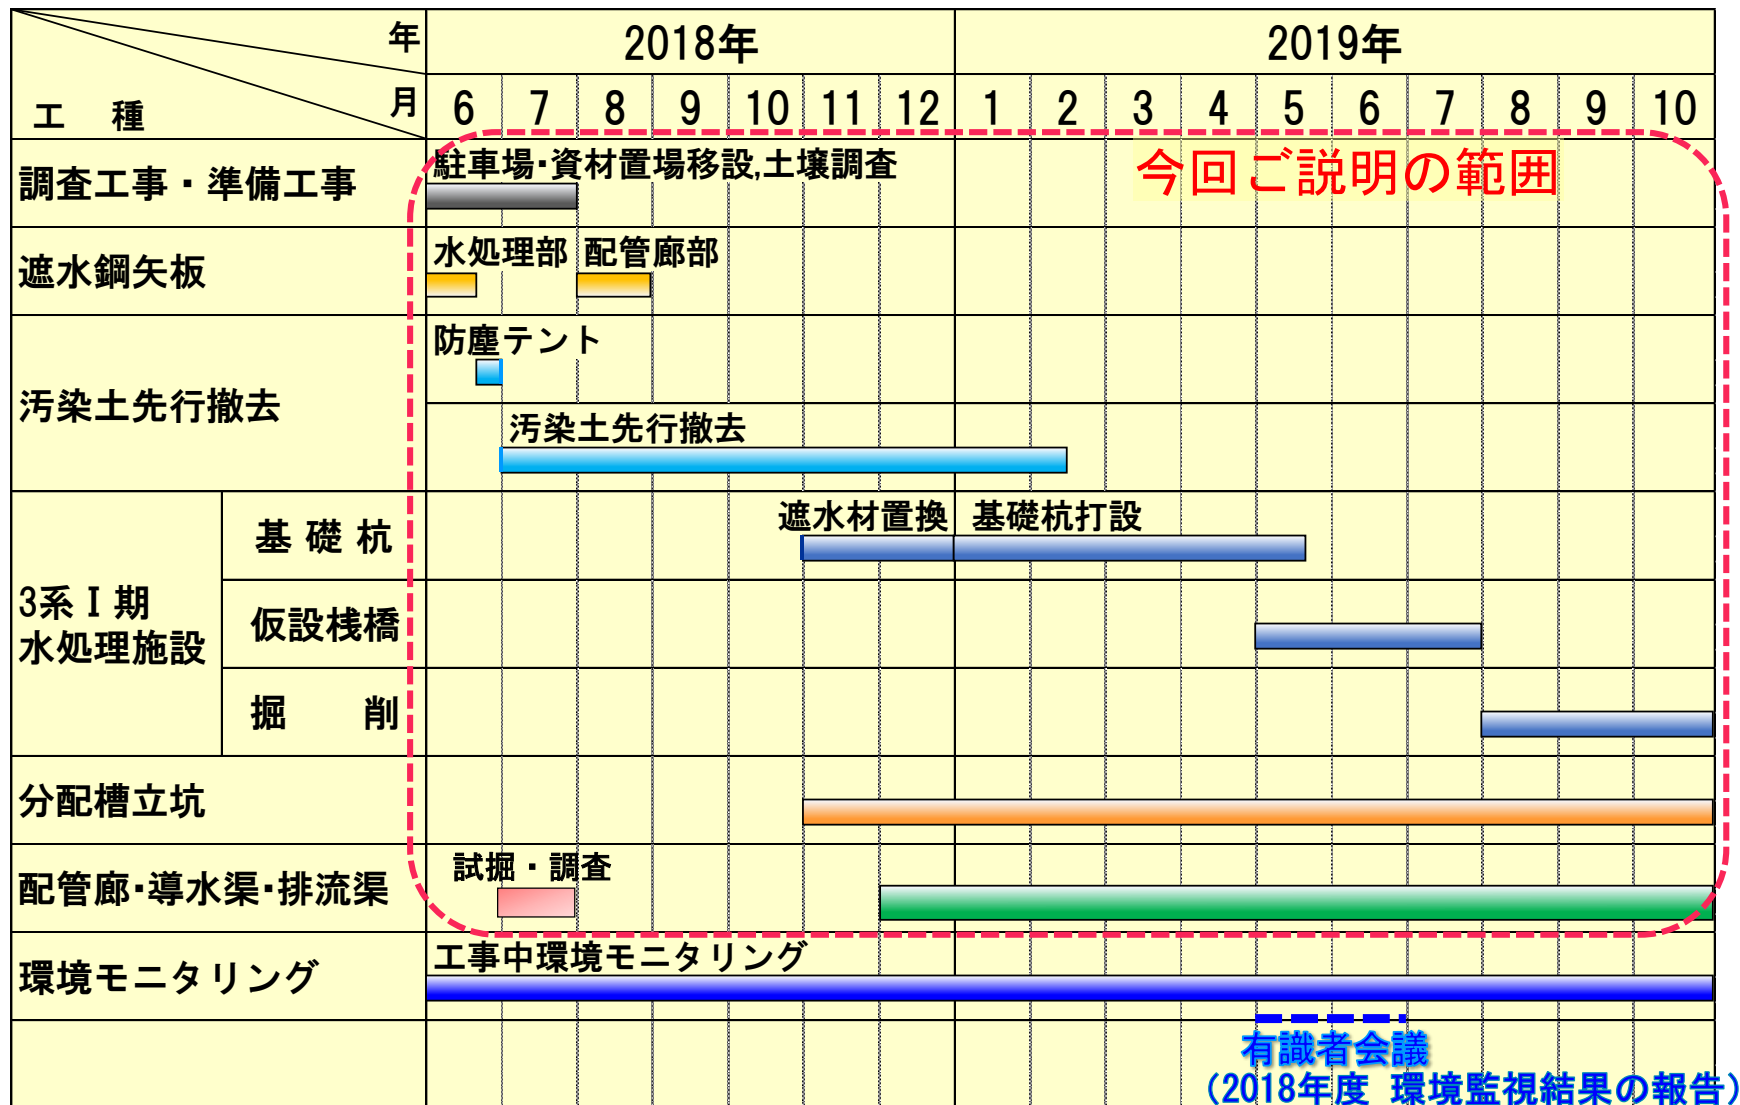

※道路横断部の工事については、11月頃に事前工事説明を予定

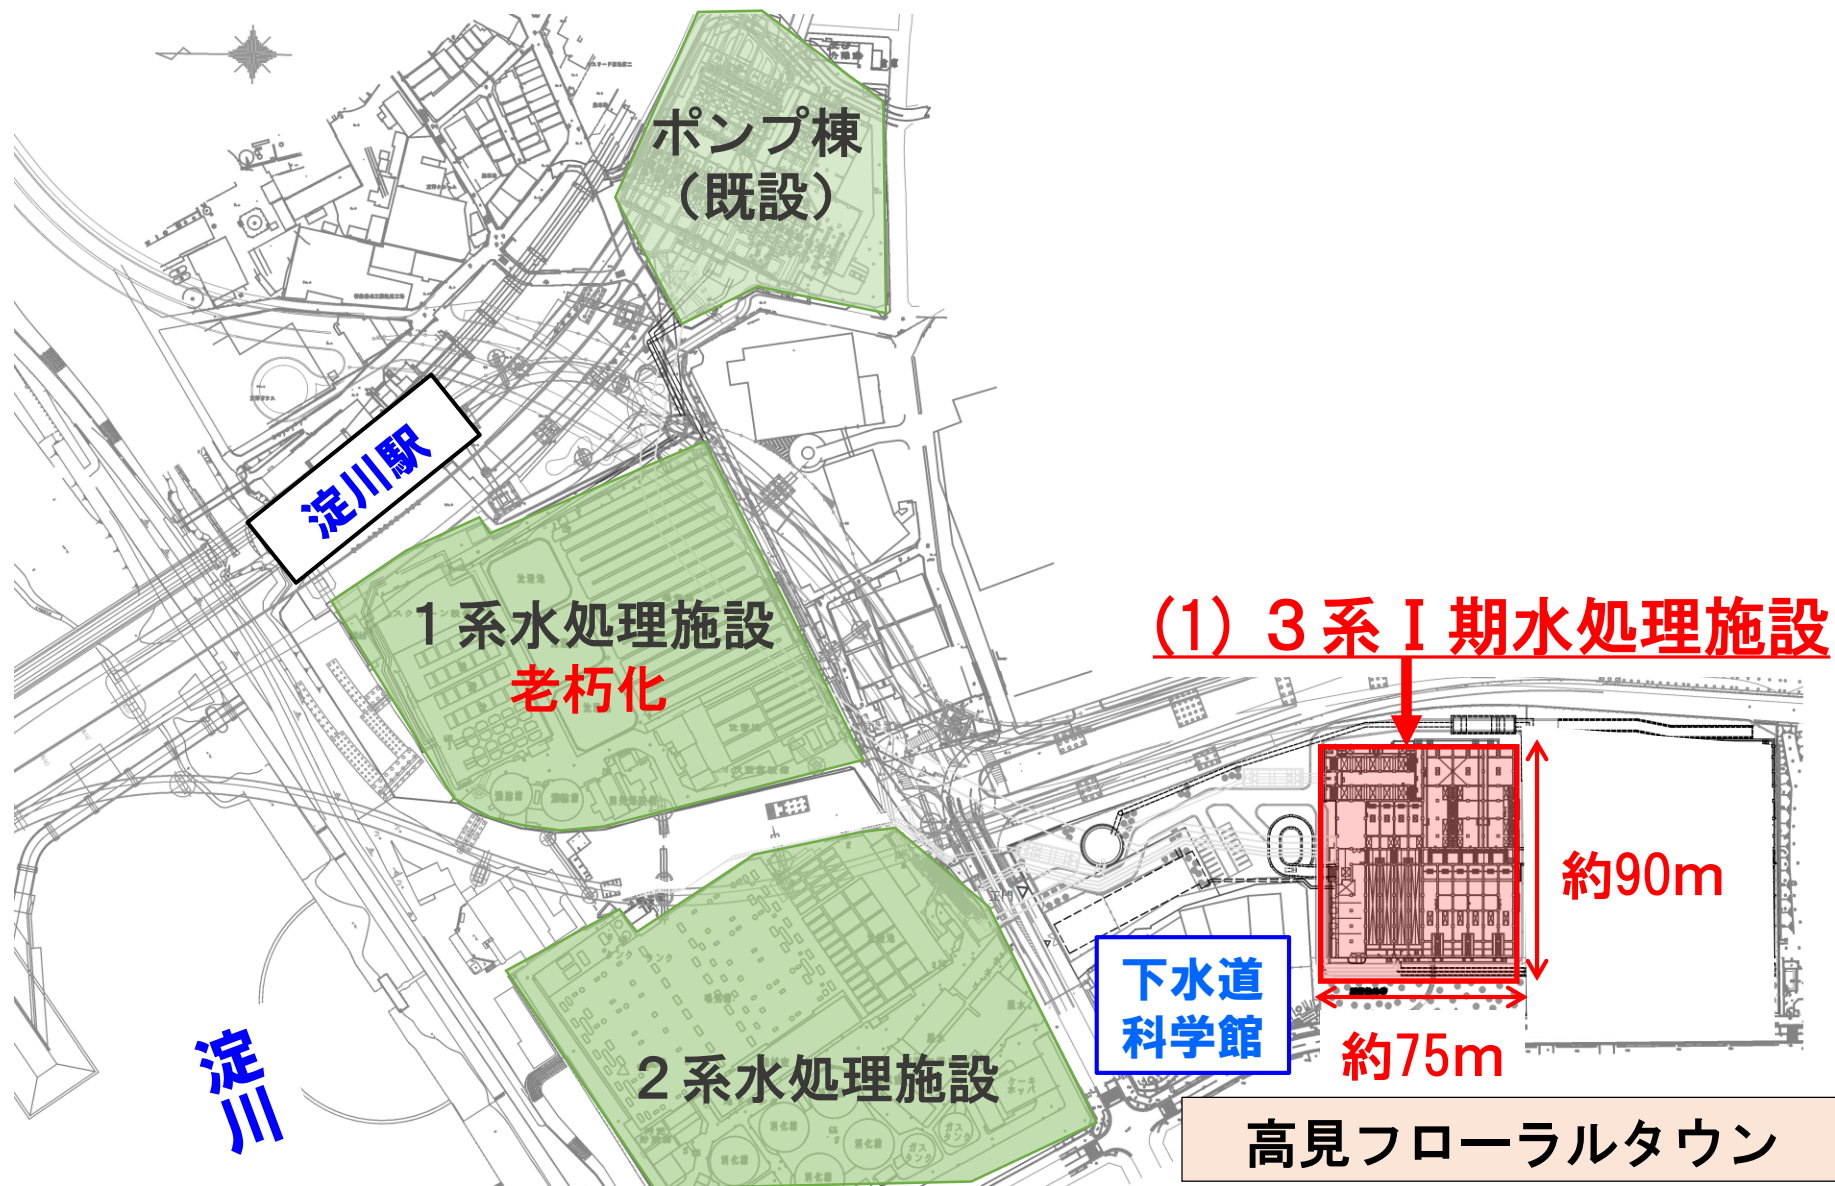


5-2. 作業概要（1）水処理施設

71


①遮水鋼矢板

※現在施工中～2018年8月（予定）

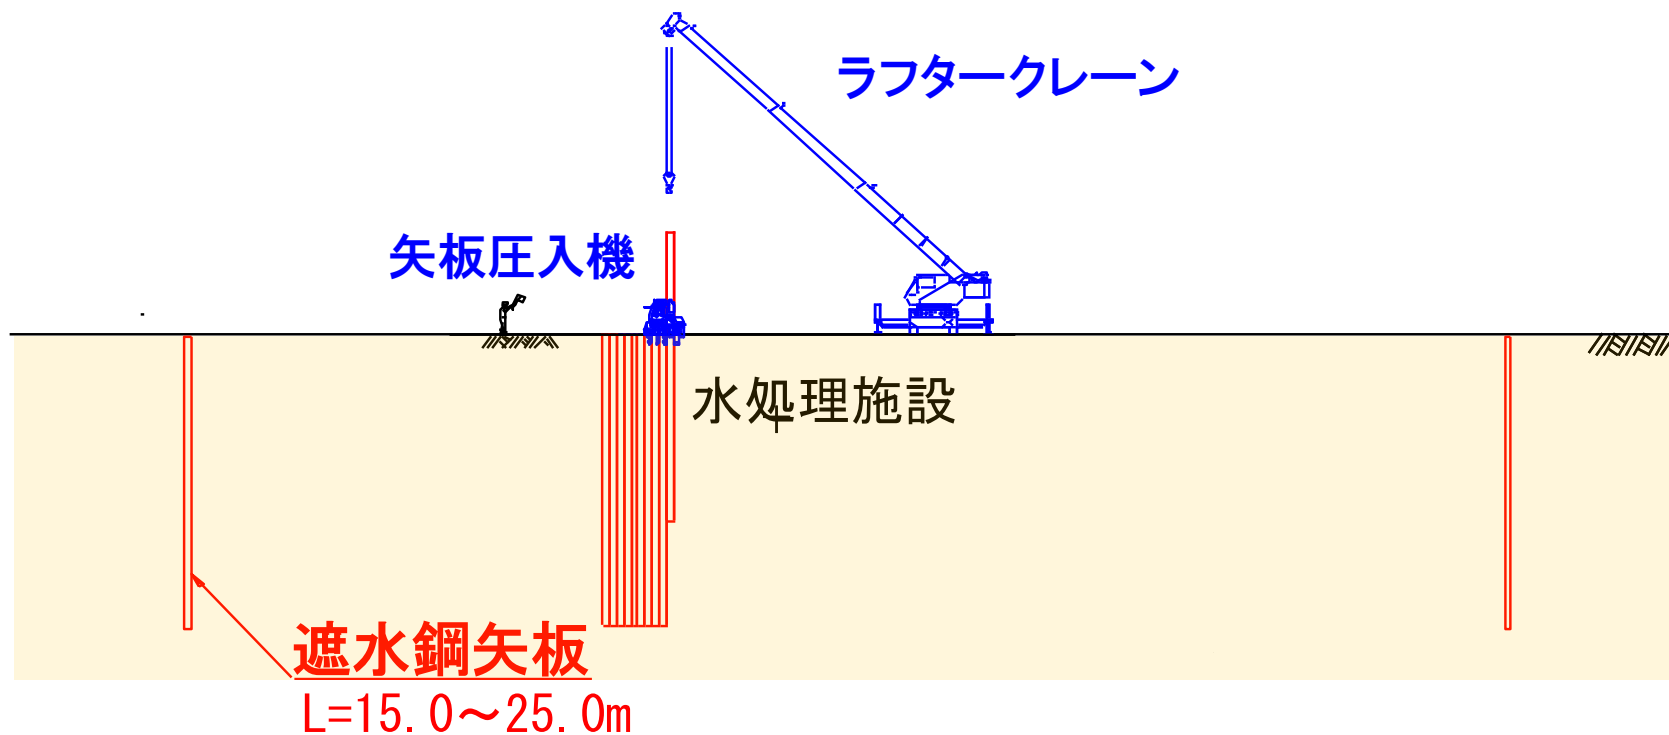

②揚水工

2018年6月, 7月（予定）

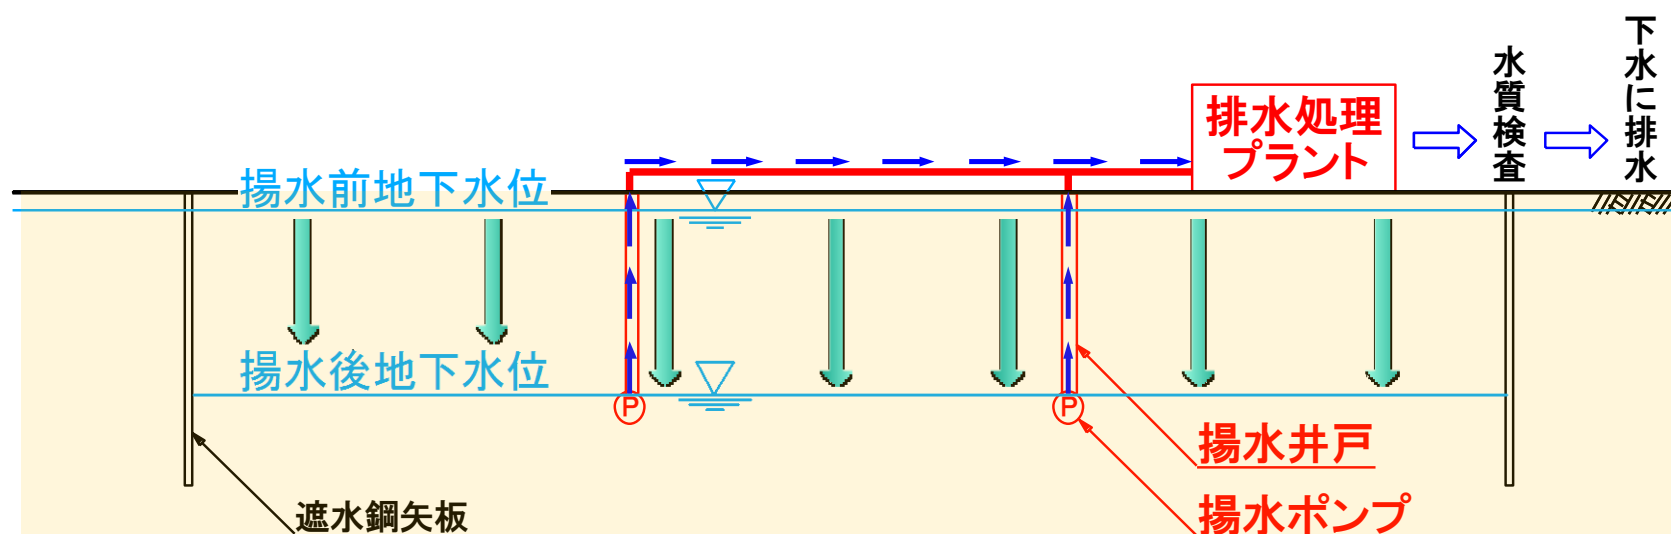


※汚染区画ではない箇所に観測井戸を設ける。

③汚染土先行撤去


2018年6月～2019年2月（予定）

汚染土拡散防止対策


防塵テント

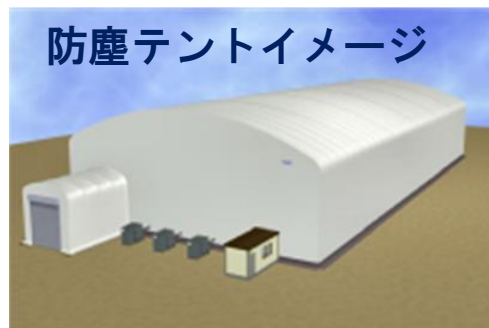


遮水鋼矢板

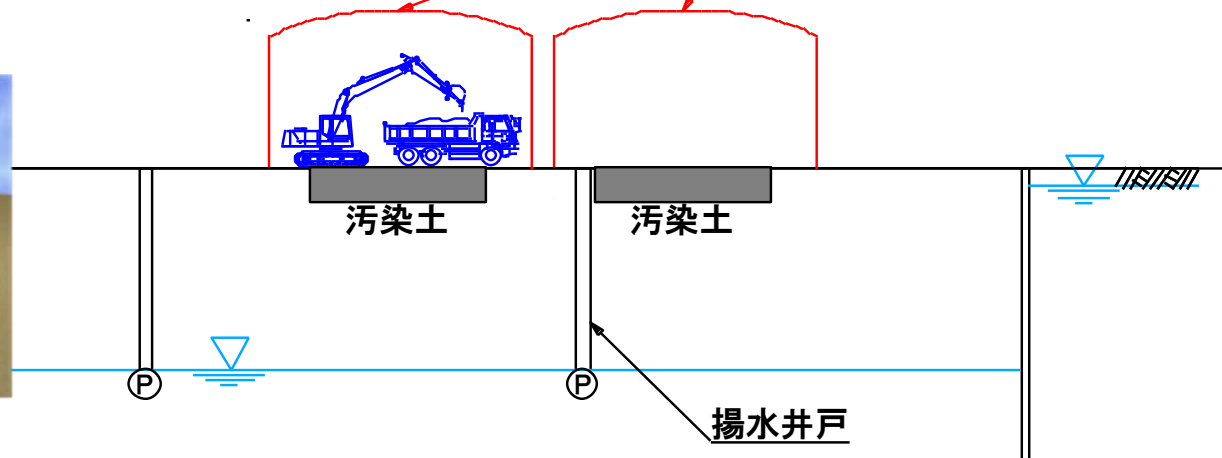


① 汚染土積込→搬出



② 良質土埋戻し




③ 防塵テント移設

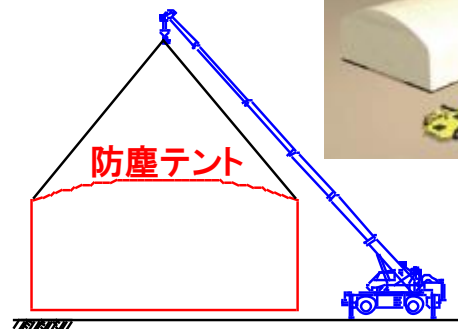

④基礎杭用遮水材置換

2018年11月, 12月 (予定)

掘削 遮水材置換

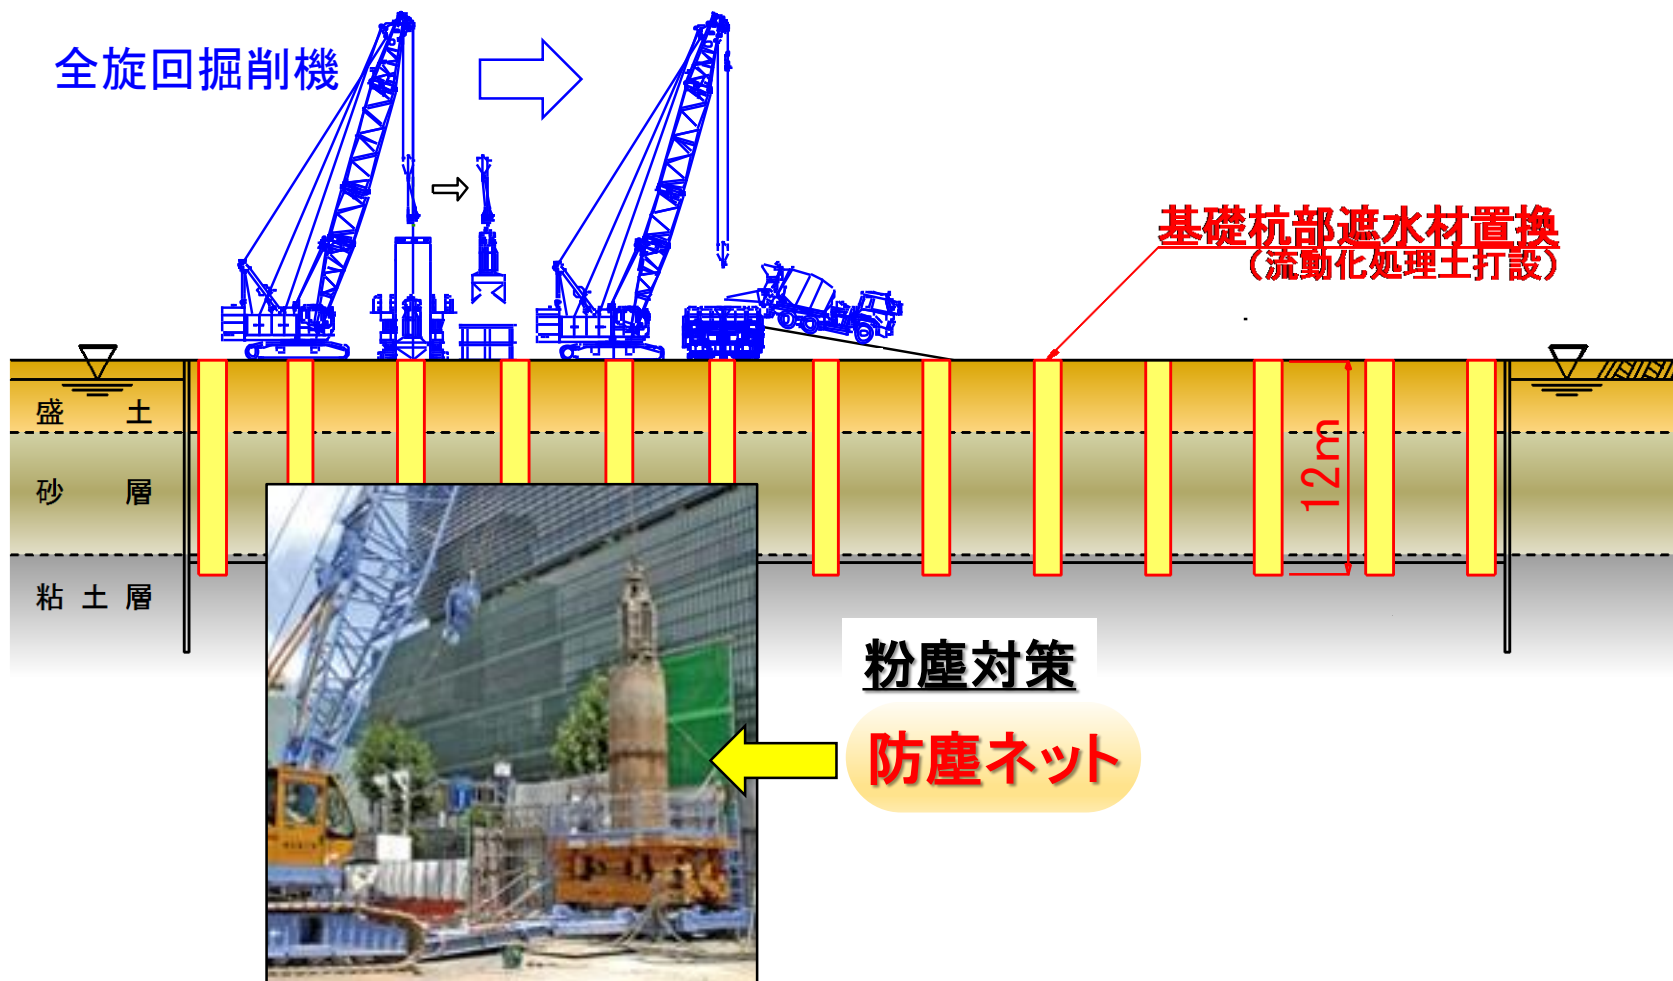

⑤基礎杭

2019年1月～5月 (予定)

騒音対策

防音シート

杭打機

基礎杭

φ 1,000(上杭:SC杭,中・下杭:PHC杭)

基礎杭部遮水材置換



粉塵対策

←騒音源

基礎杭


養生シート

杭打機

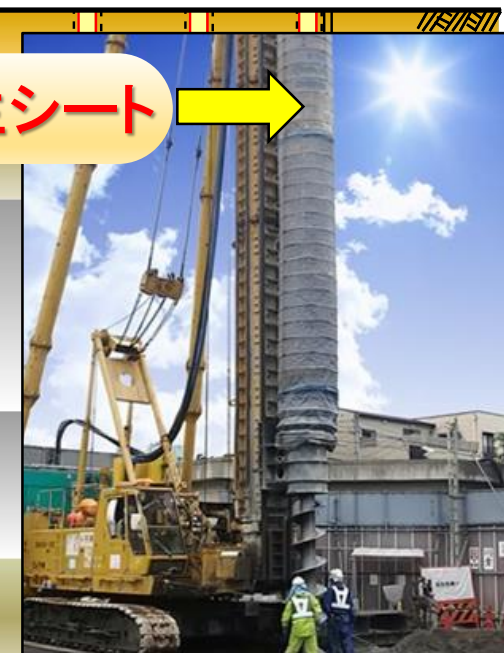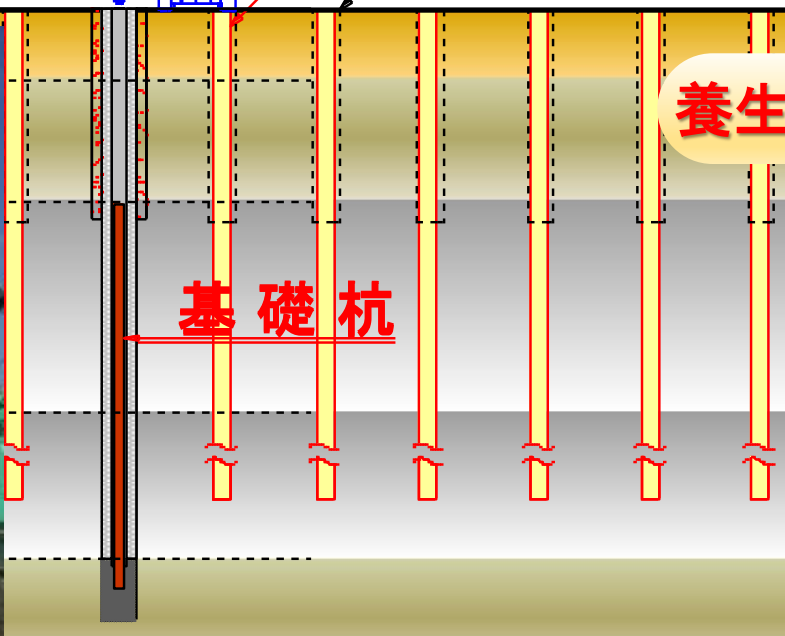

⑥中間杭・棧橋支持杭・仮設棧橋

2019年5月～7月（予定）

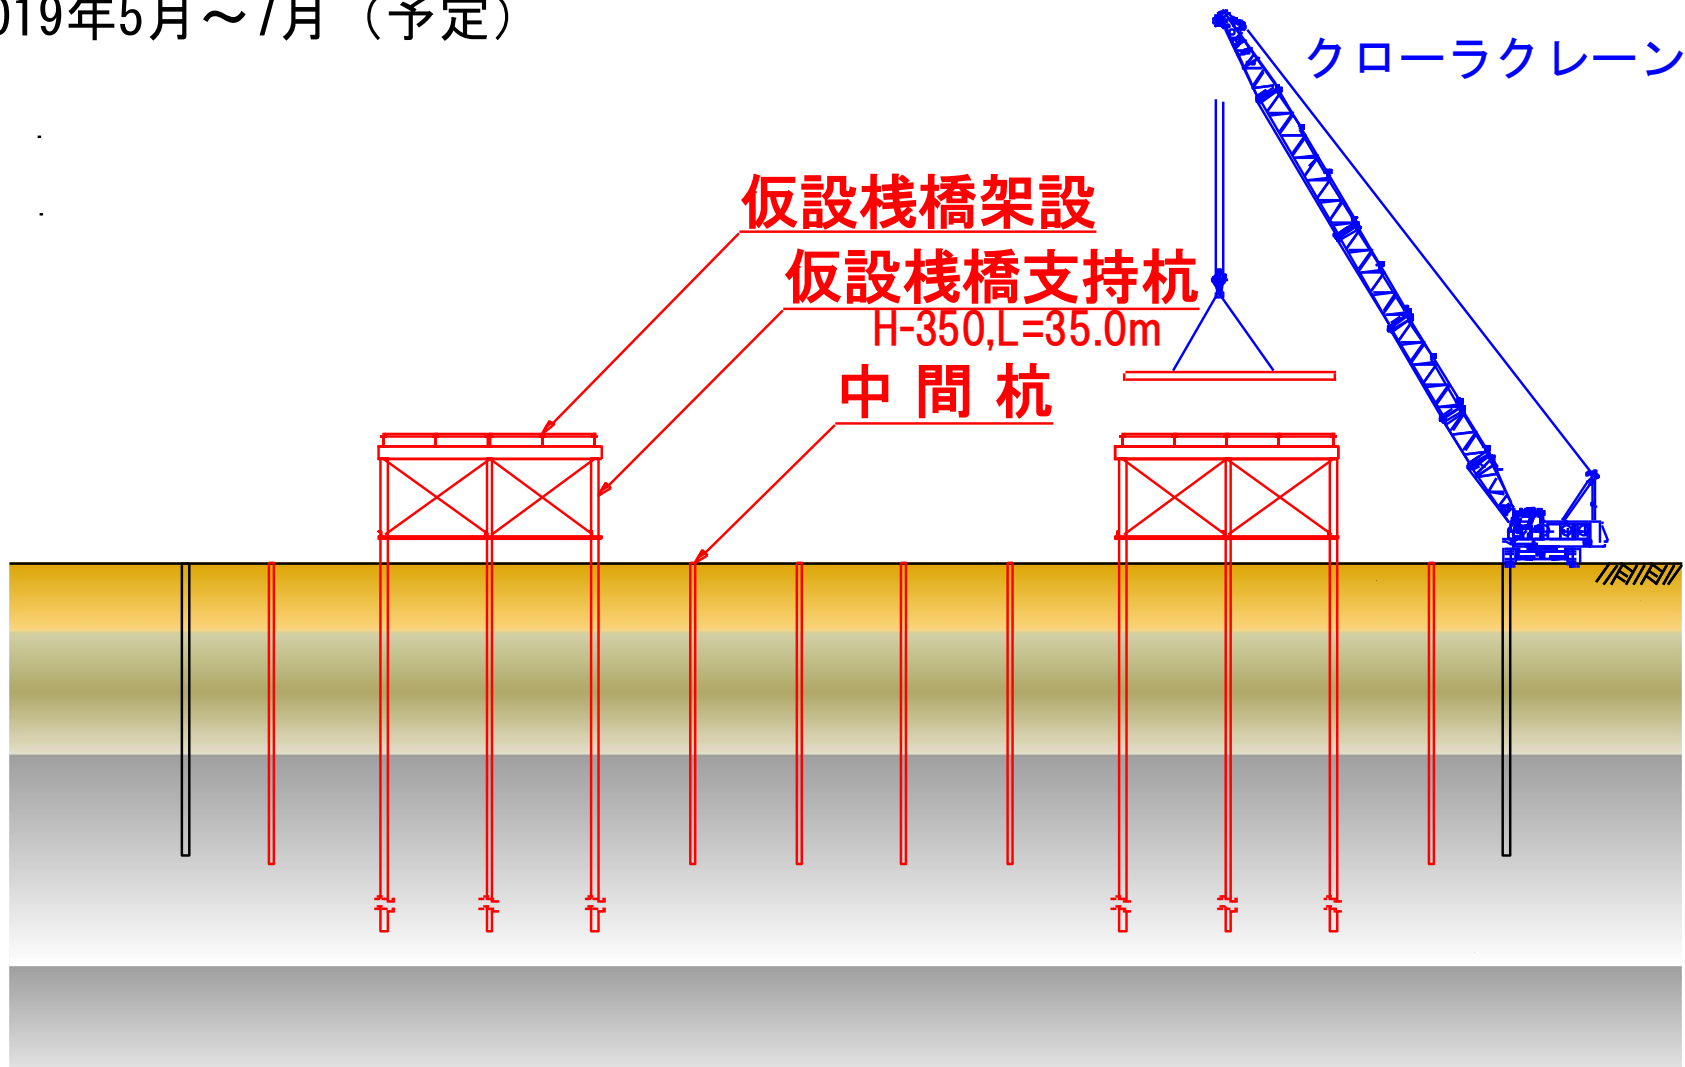

5-2. 作業概要（1）水処理施設

77


⑦1次掘削

2019年8月～10月（予定）


汚染土拡散防止対策

全面防塵ネット

ミスト散布

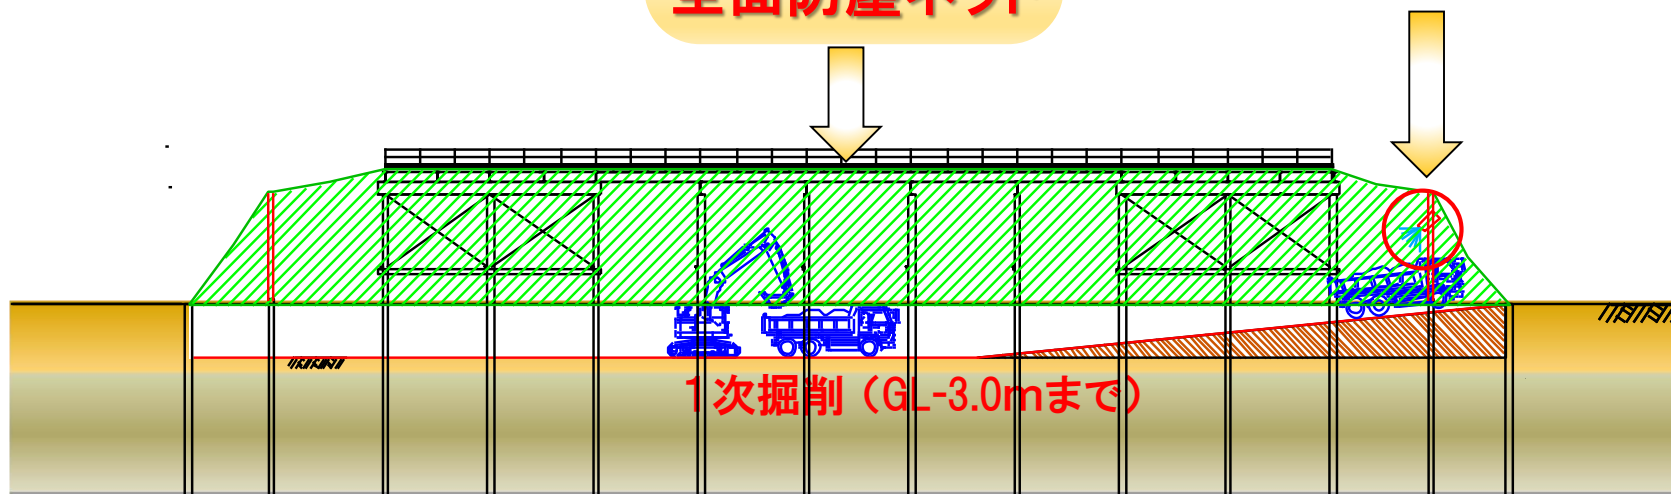

《掘削土運搬》 **粉塵対策** **飛散防止シート**

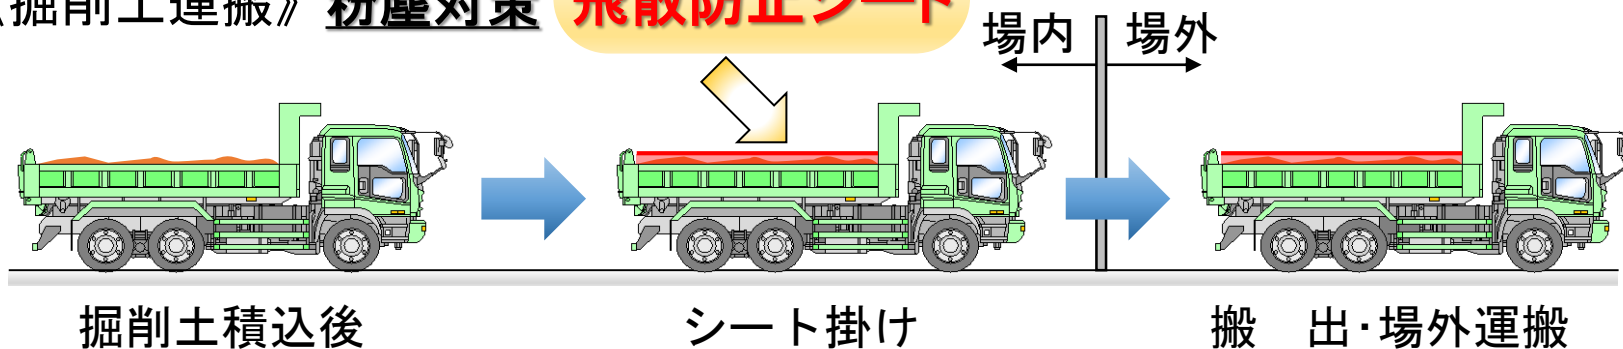



⑧2次掘削

2019年10月

～2020年1月（予定）

汚染土拡散防止対策

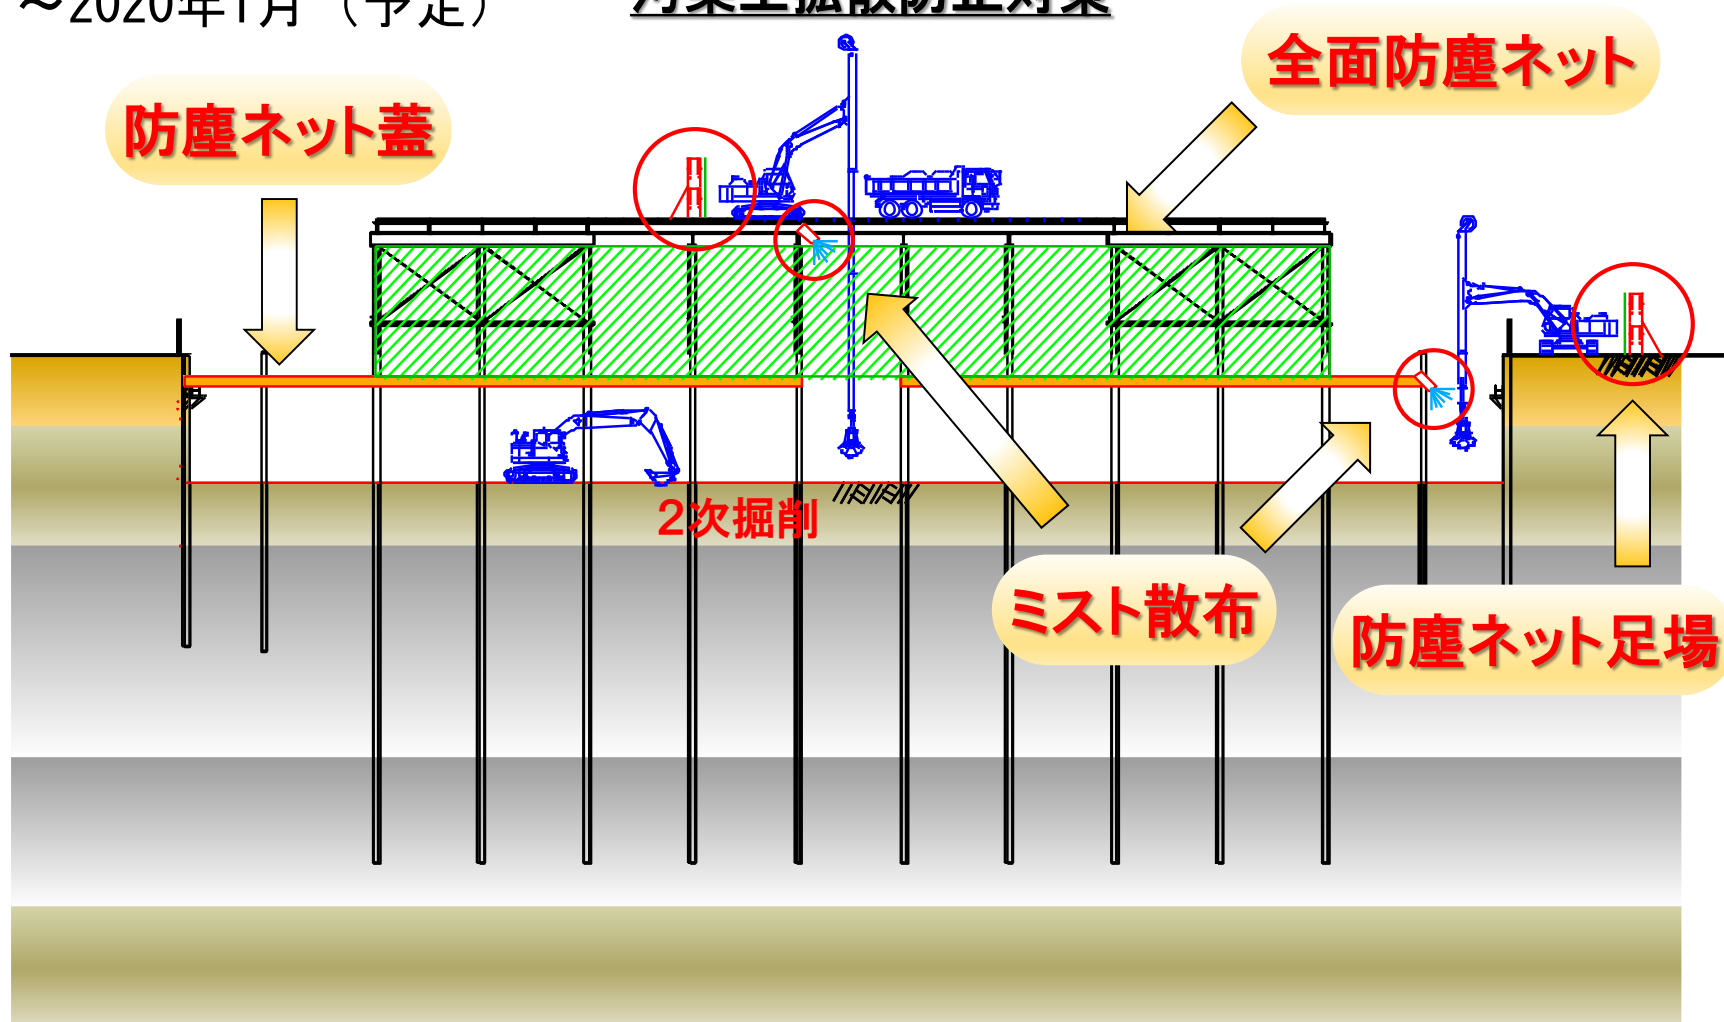


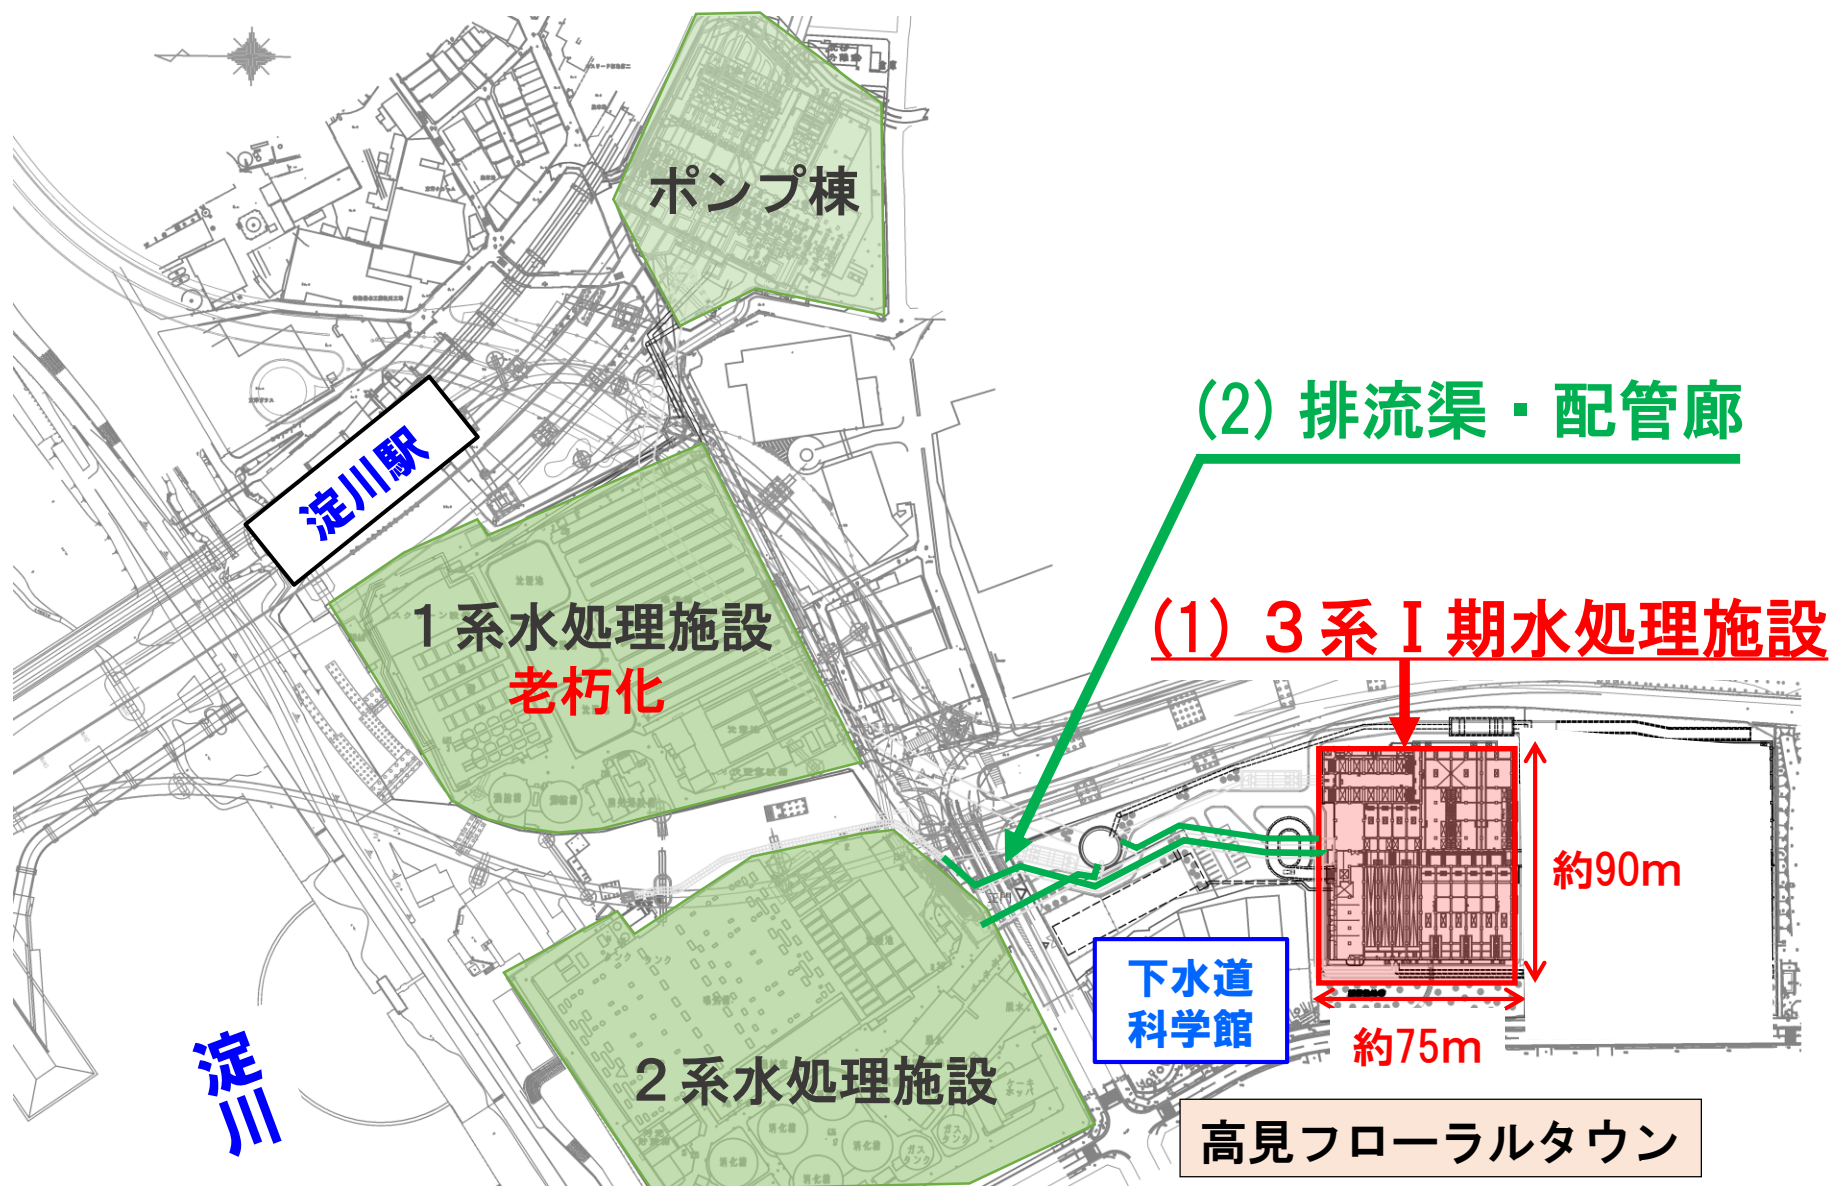


5-2. 作業概要 (2) 排流渠・配管廊 (道路横断部)

80

縦断図

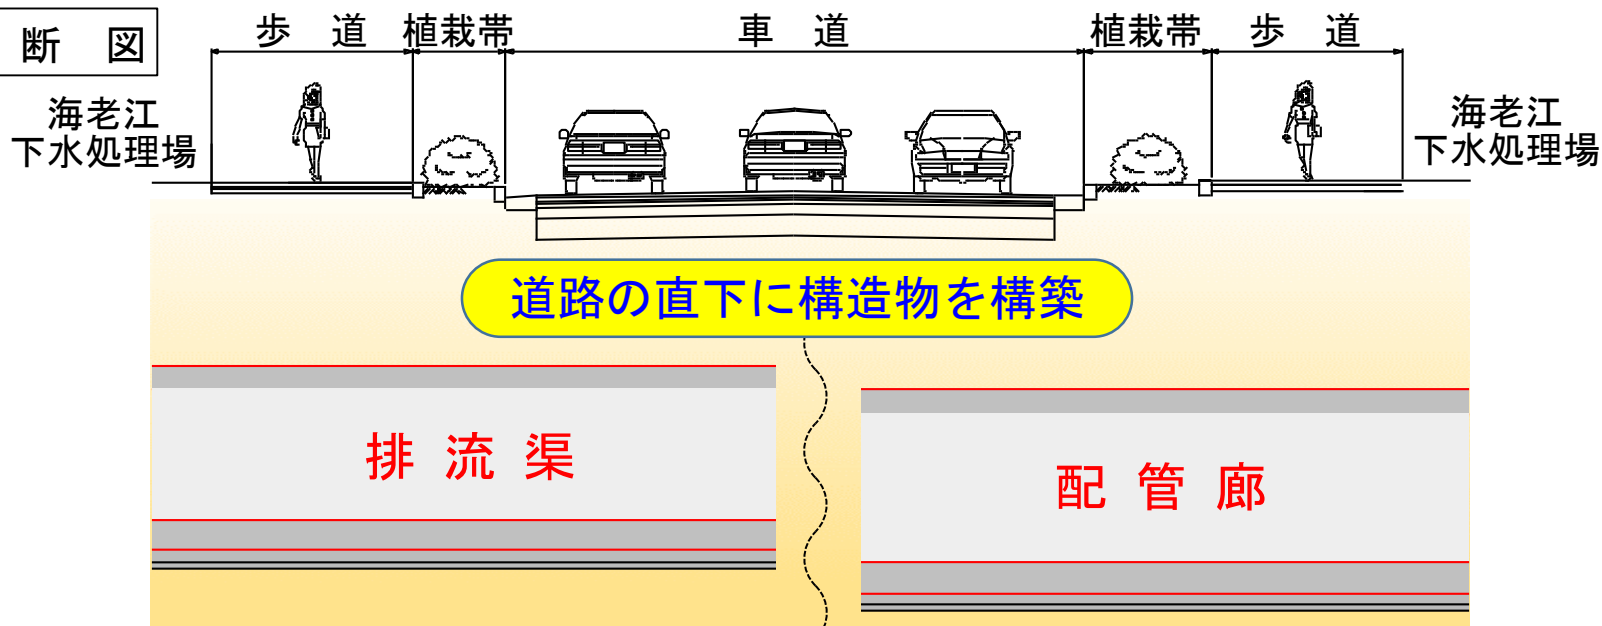


横断図

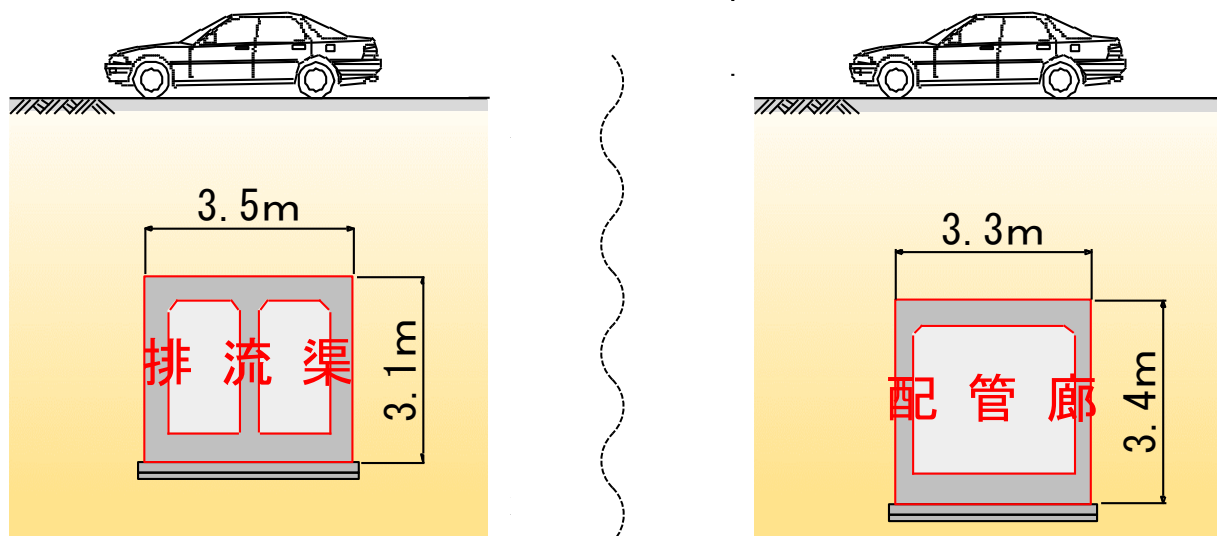

(1) 含有量規準超過範囲の試掘


2018年7月頃 (予定)

- ① ネットフェンスに養生シートを設置し、粉じんの飛散防止
- ② 掘削時のウォーターミスト散布で、粉じんの発生を抑制
- ③ 掘削土はその場で、袋詰めを行い粉じんの飛散を防止


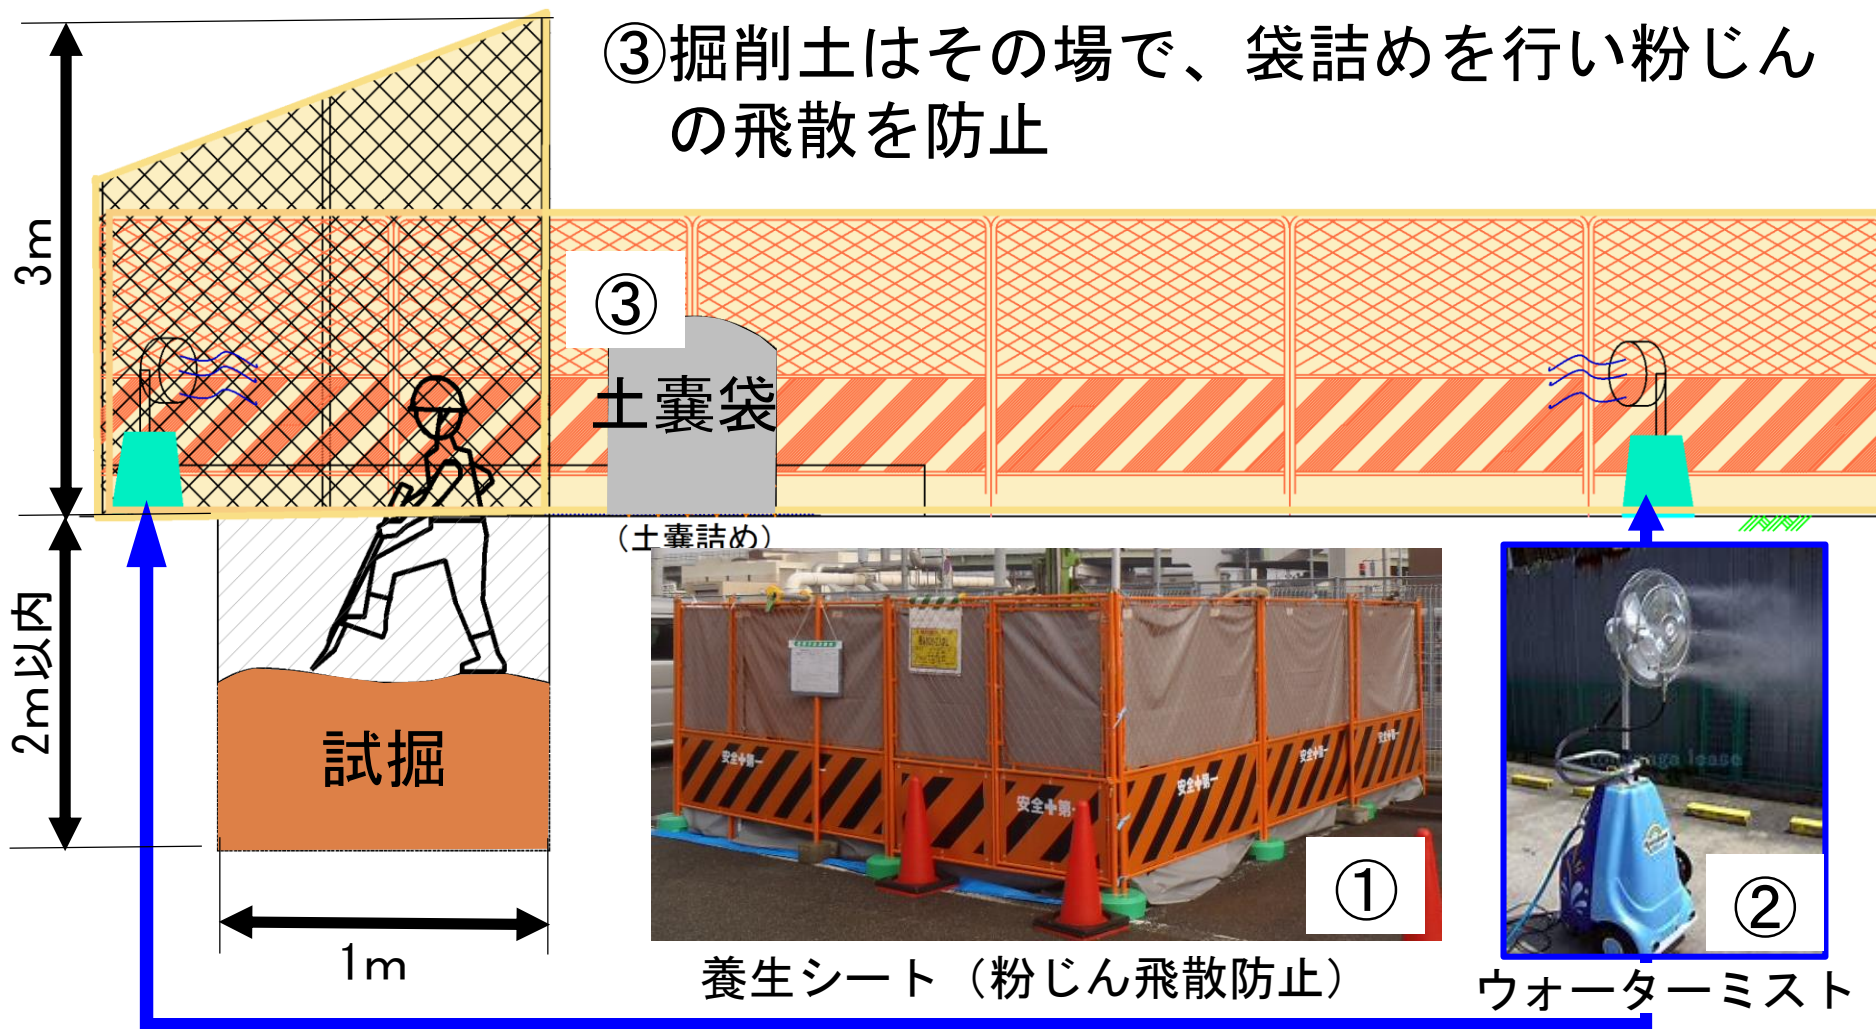



(2) 道路横断部の躯体構築

2018年12月頃～ (予定)




- ・ 歩道、車道の迂回を伴います。
- ・ 道路使用形態は警察との協議によって決定します。

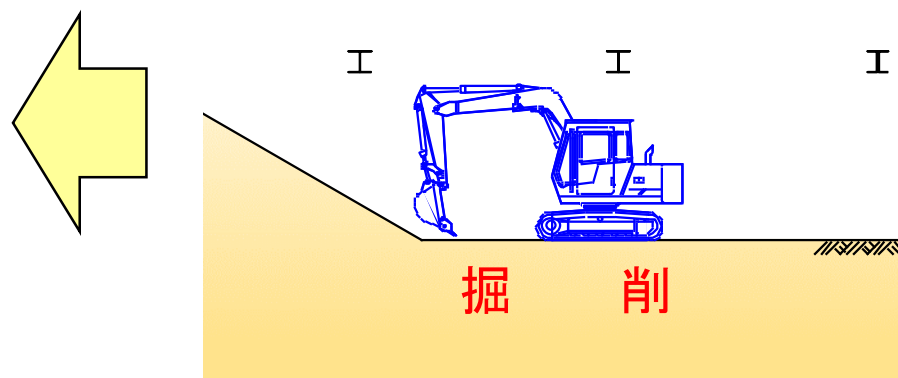

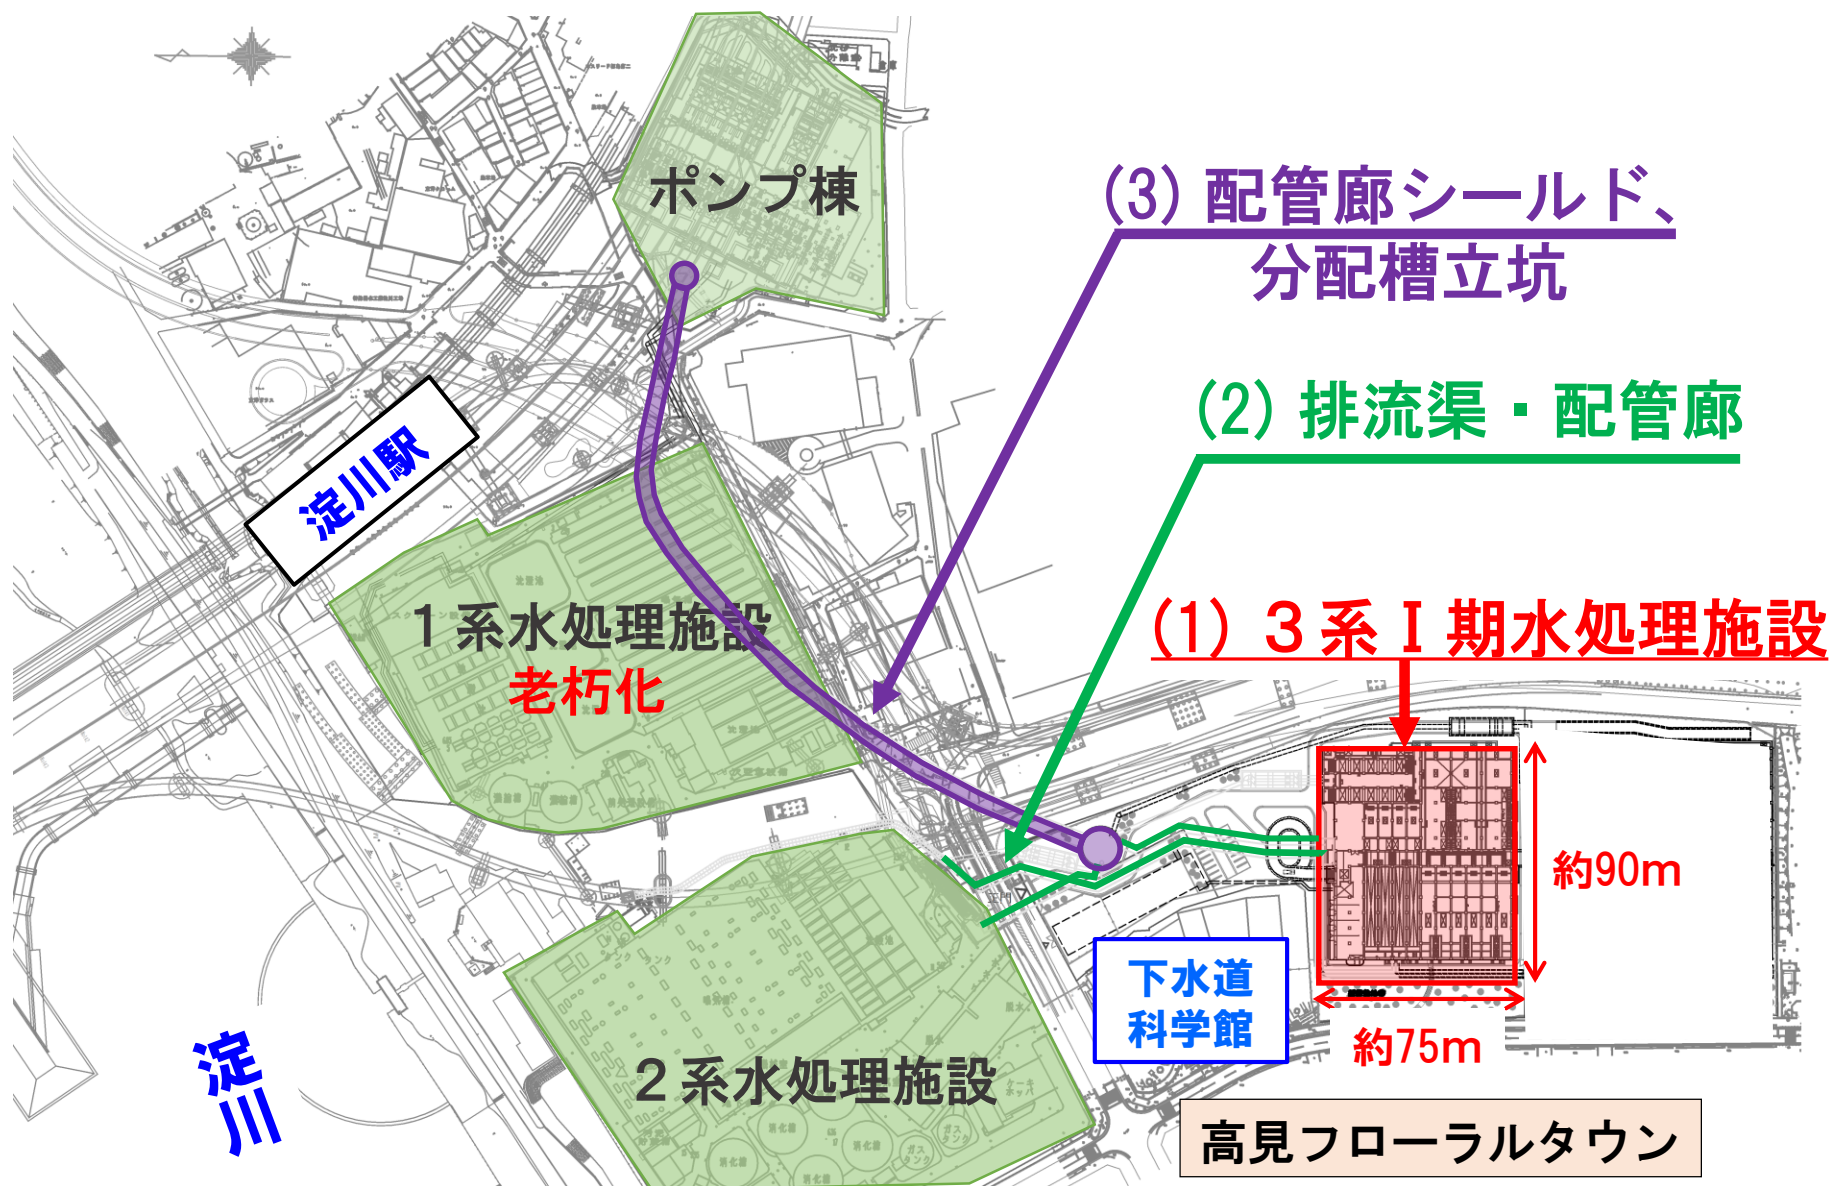


配管廊シールド工事

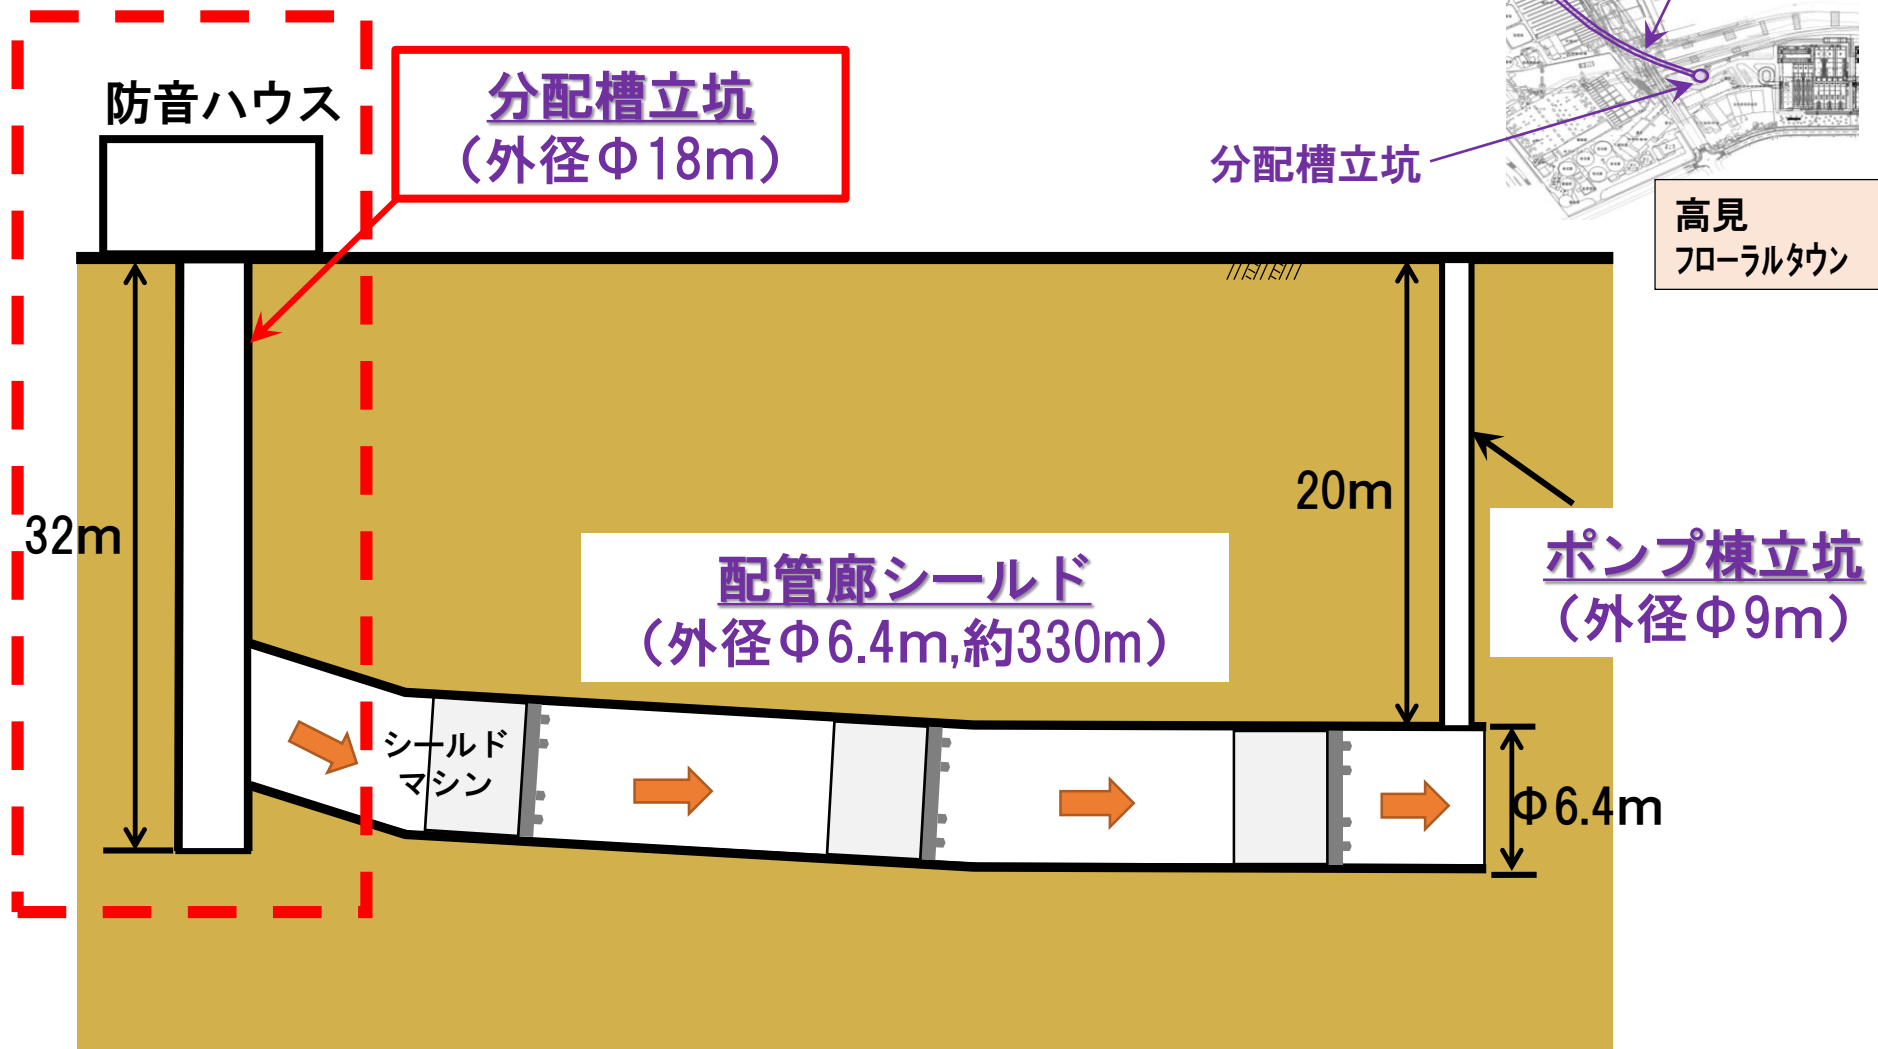


分配槽立坑（オープンケーソン工法）

2018年11月
～2020年1月（予定）


① 圧入設備セット

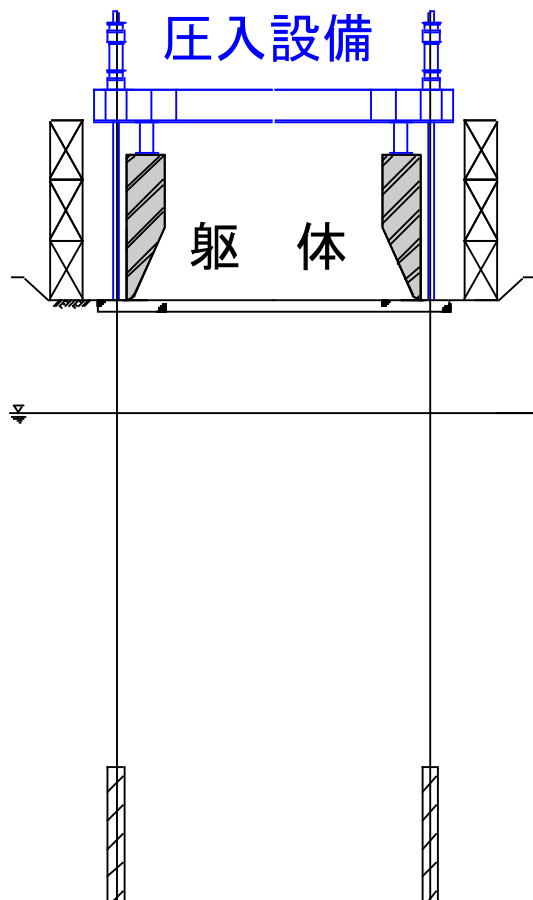

② 掘削・圧入, 躯体

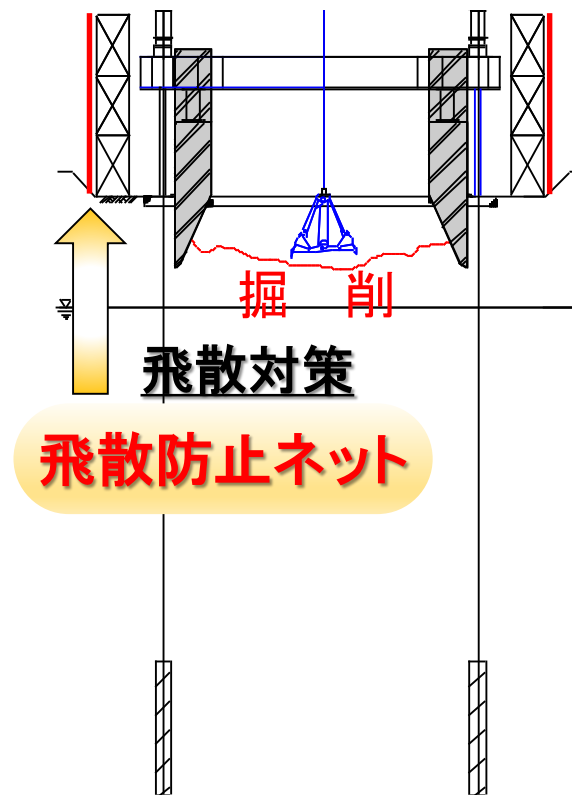

③ 立坑構築完了

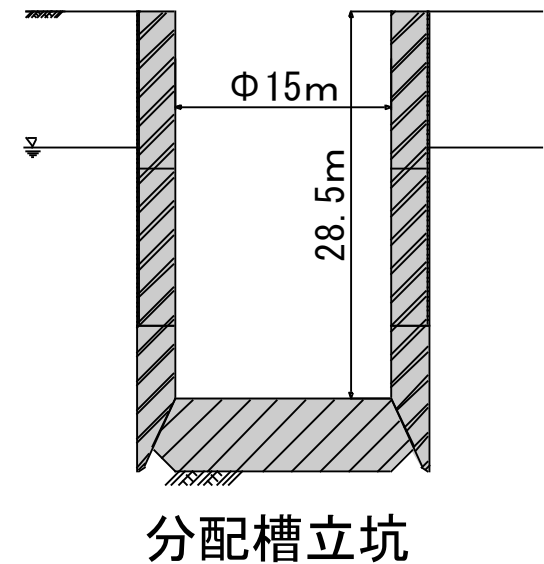


5-2. 作業概要 (3) 配管廊シールド、分配槽立坑

86

配管廊シールド工事

2020年2月
～2021年4月（予定）

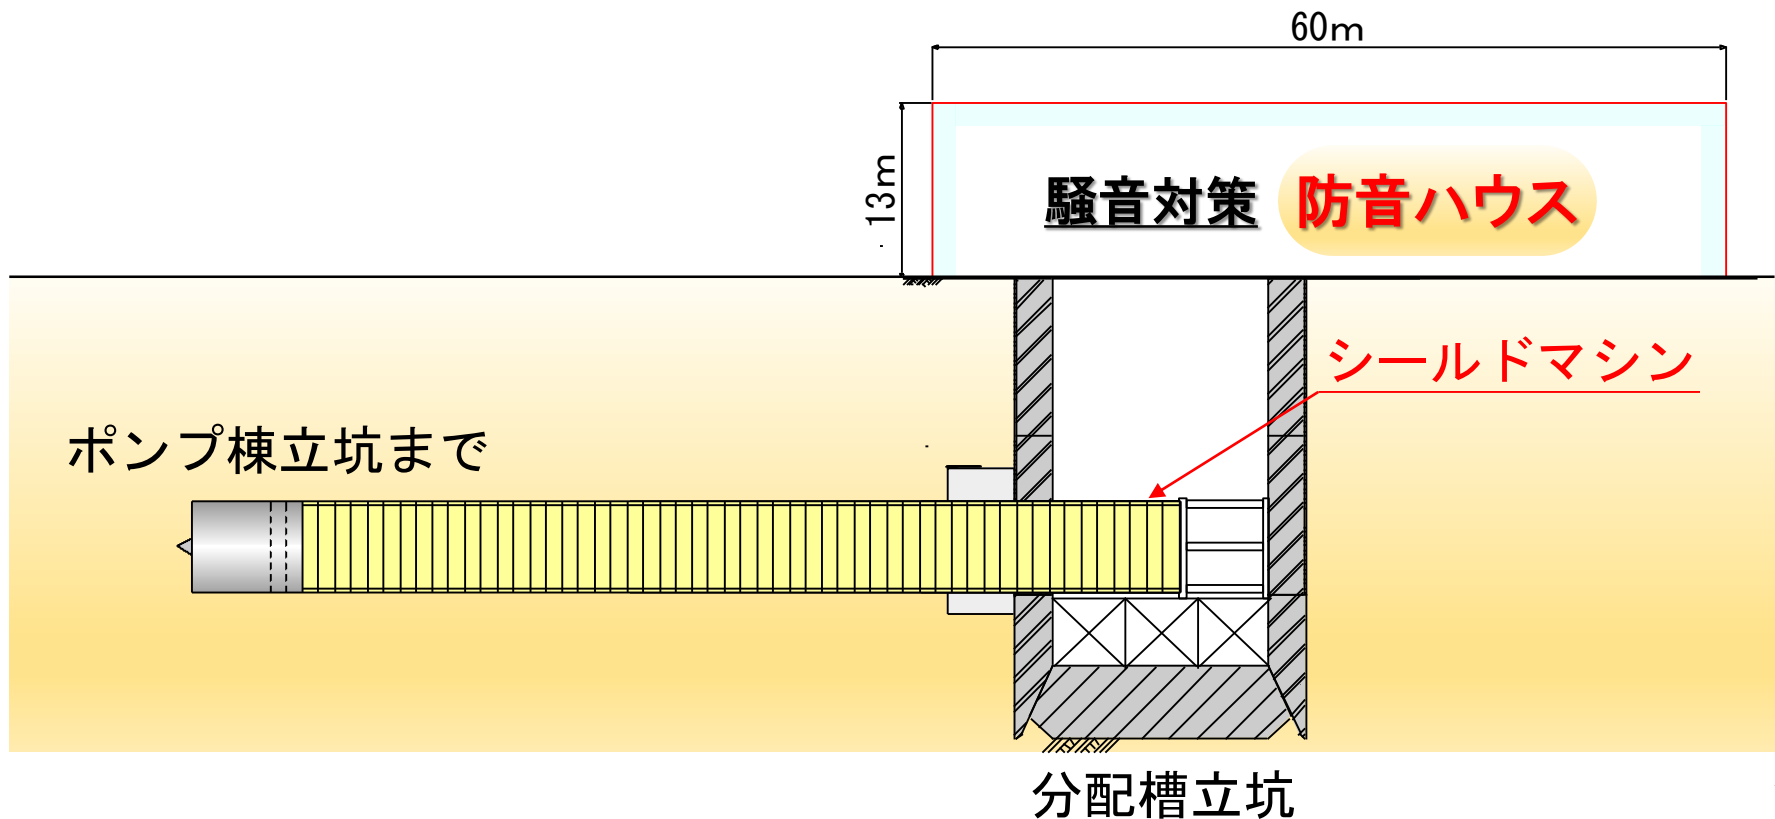

地域の皆さまとの交流の場

コミュニケーションルーム 2018年7月開設（予定）

- ・ 工事の**工程表**や**進捗写真**の掲示
- ・ 環境モニタリング測定値の**リアルタイム表示**
- ・ 工事に関するご意見，ご要望を伺う**ご意見箱**の設置
- ・ 現場を見渡せる**見学台**の設置

ホームページの開設

- ・ 当事業に関するホームページを開設しています。

<http://www.ebie-waterlink.com/contents/>

- ・ 事業説明，工程表，工事通信，お問合せ窓口等の情報を掲載しています。



海老江ウォーターリンク(株) 作業所連絡先

Tel: 06-6131-9626
