


夢洲関連事業の工事進捗

令和 7 年 1 月 24 日
大阪市建設局

夢洲における関連事業の工事調整

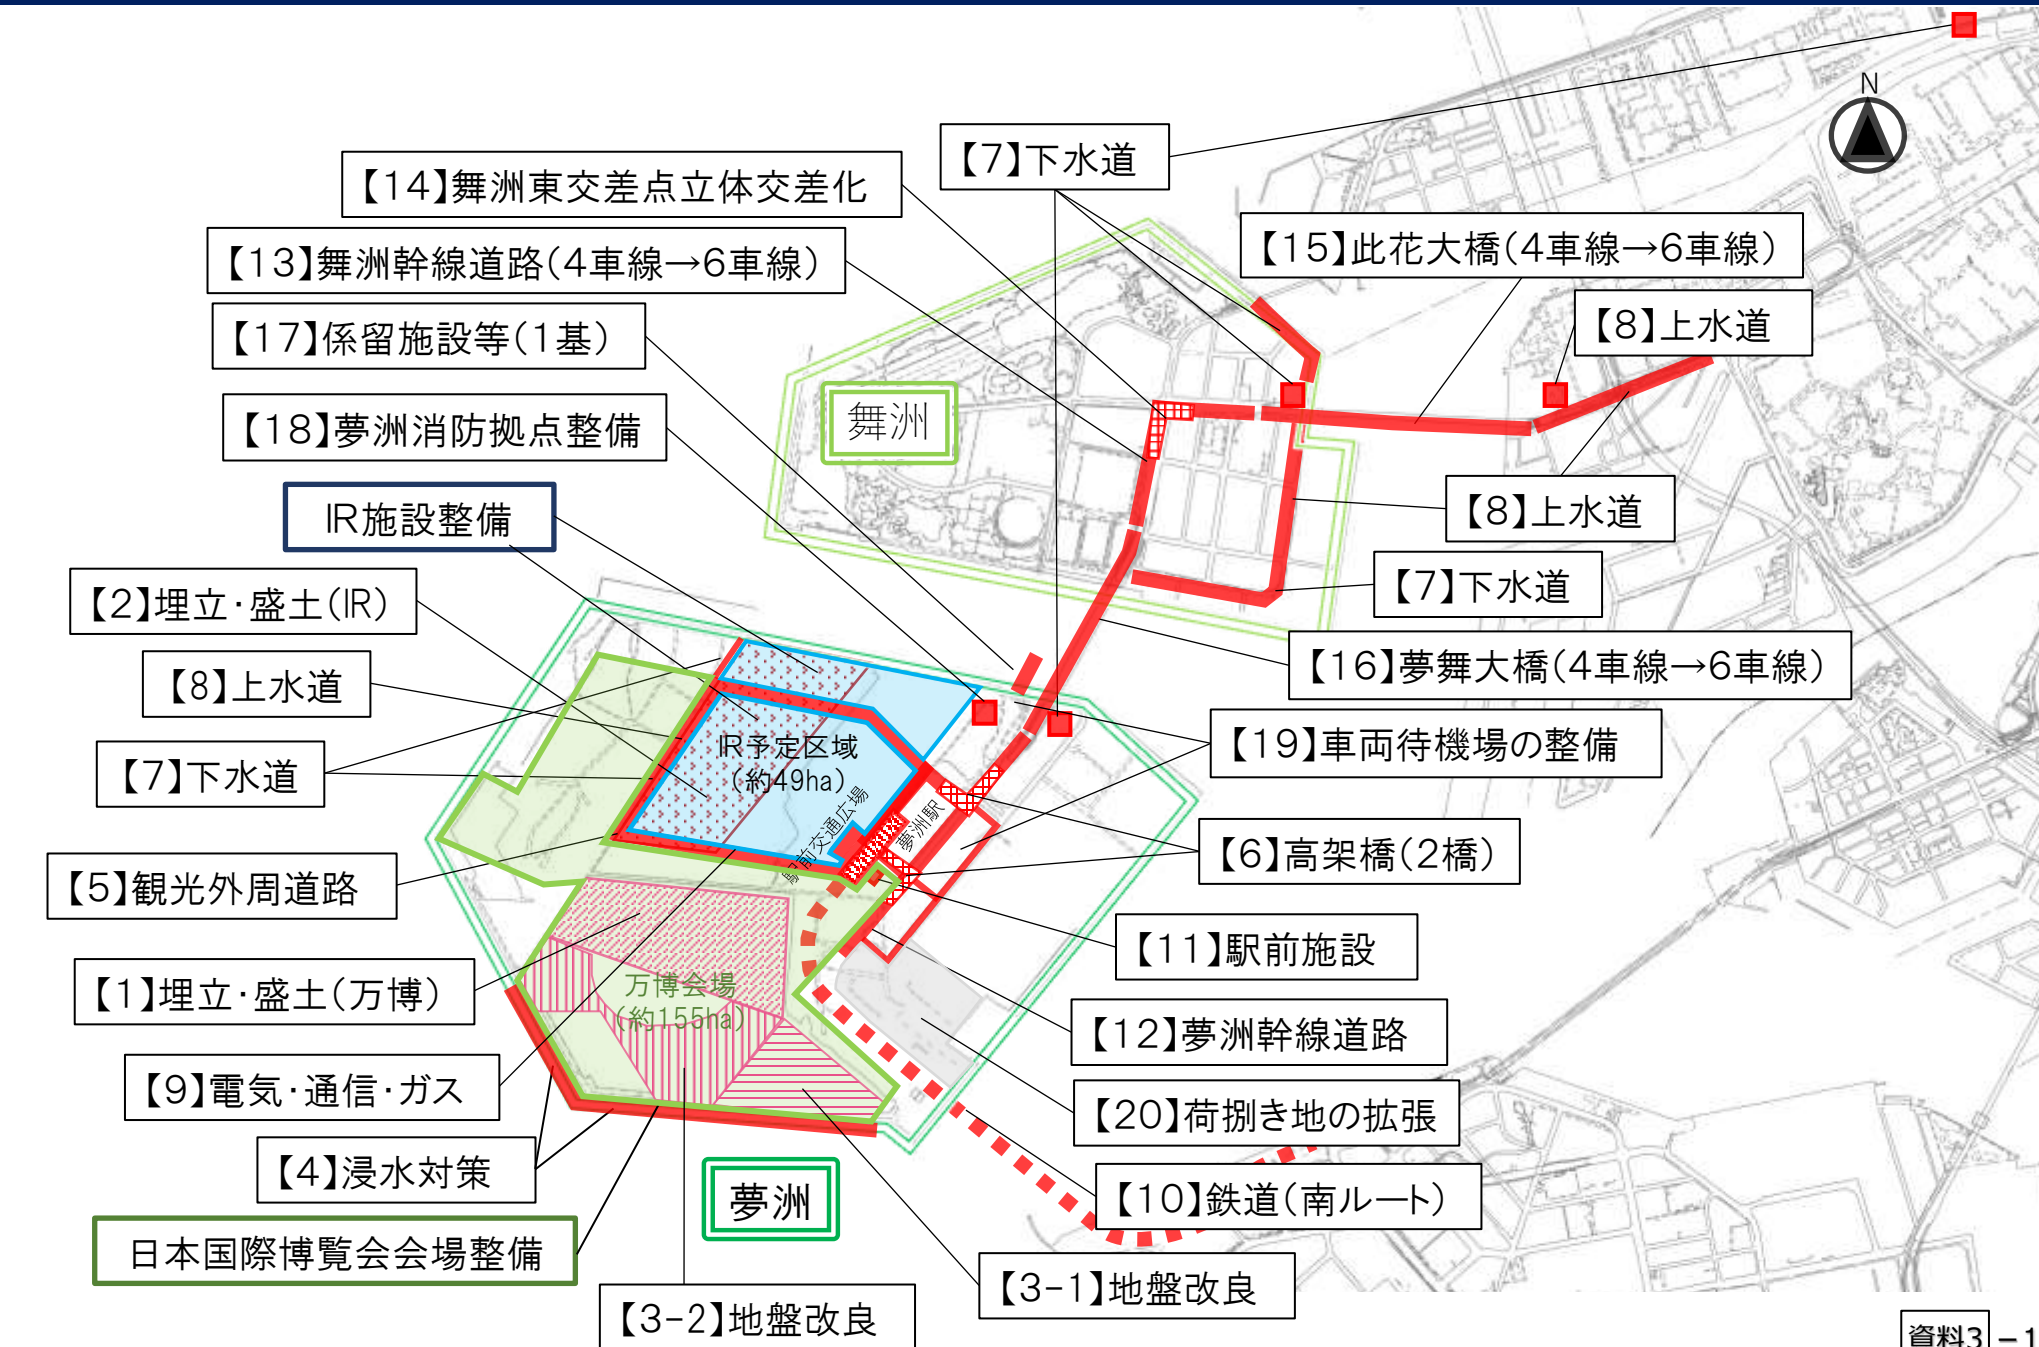

夢洲における関連事業の工事調整

		▼ 2025年1月末時点												進捗状況 (R6年12月時点)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
インフラ整備 箇所図番号	項目	概要	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	～ ～																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
万博	大阪・関西万博	開催期間: (始)2025年 4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積: 155ha パビリオン等: 約110区画			基本計画	検討・設計等		整地・インフラ工事		開催	撤去工事※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															基本計画	検討・設計等	パビリオン等建築工事	●4～10月	※撤去工事完了時期未定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IR	IR	敷地面積約49ha ※諸般状況によって1～2年程度後ろ倒しになる可能性がある			●基本計画策定			●区域認定	●実施協定等締結	●液状化対策工事の着手(2023年12月)	●IR準備工事の着手(2024年10月)	●IR建設工事の着手(2025年春頃)		※工事の完了(2030年夏頃) ※IR施設の開業(2030年秋頃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															公募・設計等	工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
インフラ整備	【1】 【2】 【3-1】 【3-2】 【4】 【5】 【6】	埋立・盛土(万博) 埋立・盛土(IR) 地盤改良 浸水対策(G・H護岸) 観光外周道路 (仮称)夢洲北高架橋 (仮称)夢洲南高架橋	約30ha(約90万m3) 約42ha(約42万m3) 2区南東部 約12ha 2区南西部 約19ha 約1.7km L=約2.6km、W=30～34m 3径間連続鋼床版桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m 3径間連続鋼床版桁橋 L=195m、W=約16.4m～22.7m	地盤改良・盛土 埋立・盛土		地盤改良	工事	工事	工事					完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															予備設計	詳細設計等	工事(1期)	工事(2期)	工事(1～17期本整備)	予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工、舗装等)	予備設計	詳細設計等	工事(下部工、上部工、舗装等)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
インフラ整備	【7】 【8】 【9】	下水道 上水道 電気・通信・ガス 電気	此花処理場の機能増強 夢洲抽水所(新設)、舞洲抽水所(増設) 管渠(φ250～φ2200mm、L=約17km) 北港加圧ポンプ場等(機能増強) 配水管(φ600mm他、L=約8.5km) 配管等 変電所	詳細設計等	詳細設計等	工事	工事	工事	工事					完了 完了 完了 完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															詳細設計等	工事	工事	工事	工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
インフラ整備	【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 【16】 【17】 【18】	鉄道(南ルート) インフラ部 インフラ外 駅前施設 夢洲幹線道路(周辺道路含む) 舞洲幹線道路 舞洲東交差点立体交差化 此花大橋 夢舞大橋 係留施設等 消防拠点整備	事前調査 駅舎部 L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m シールドトンネル部 L=761m、Φ6,800×2 レール・電気設備等 一式 地下広場・階段・昇降機等 L=約2.2km、W=60m L=約0.8km、W=60m 4径間連続鋼床版桁橋 L=約220m、W=約8.9m～11.7m 6車線化(歩道撤去等) L=約1.1km 6車線化(ガードレール撤去等) L=約1.0km 浮桟橋(1基、L=40m、W=10m)等 波除堤(L=60m) ※IR開業に合わせ供用開始	基本検討 調査等	設計等	工事(開業準備込)	工事(組立等)	工事(掘進工等)	設計等	工事(開業準備込)	設計等	工事	完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														予備設計	詳細設計等	工事	工事	予備設計	詳細設計等	工事	工事	予備設計	詳細設計等	工事(6車線化)	詳細設計等	工事(歩道設置)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
物流・工事車両	【19】 【20】	車両待機場の整備 荷捌き地の拡張(ゲート増設) CONPASの導入 ターミナルゲート時間延長 咲洲ヘシフト 工事車両対策	夢洲での追加整備 咲洲での追加整備 C12コテナミナル拡張※、ゲート増設 (※増設ゲート周辺部分) 新・港湾情報システム(CONPAS) 早朝等ゲートオープン時間の延長 空コンテナ返却場所一時移転 運搬日、時間帯等を調整	概略設計	詳細設計	工事	供用開始	設計	工事	供用開始	設計	工事	供用開始	完了 完了 完了 完了 完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															概略・詳細設計、試験設備等の整備	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等	試験設備等

夢洲関連事業の工事進捗について



交通インフラ整備の進捗状況【舞洲】



舞洲東高架橋
(夢舞大橋→此花大橋)
■令和6年12月供用済



此花大橋
(4車線⇒6車線)
■令和4年10月供用済

此花大橋



舞洲

舞洲東
交差点

舞洲幹線道路
(4車線⇒6車線)
■令和4年7月供用済

平面左折常時左折可
(此花大橋→夢舞大橋)
■令和6年2月供用済



至：夢舞大橋

交通インフラ整備の進捗状況【夢洲】

鉄道（夢洲駅）

■令和7年1月19日 開業

観光外周道路

■令和6年12月完成

係留施設等

■令和6年12月完成

万博会場

IR事業用地

夢洲駅

（仮称）夢洲南高架橋

■令和6年12月暫定利用

（仮称）夢洲北高架橋

■令和6年8月暫定利用

夢舞大橋

（4車線⇒6車線）

■令和4年8月供用済

夢洲コンテナ
ターミナル

凡例

万博交通



一般交通



舞洲方面 →
