


第8回 あいりん地域まちづくり会議（平成30年7月5日開催）のまとめ



新病院イメージ図 →

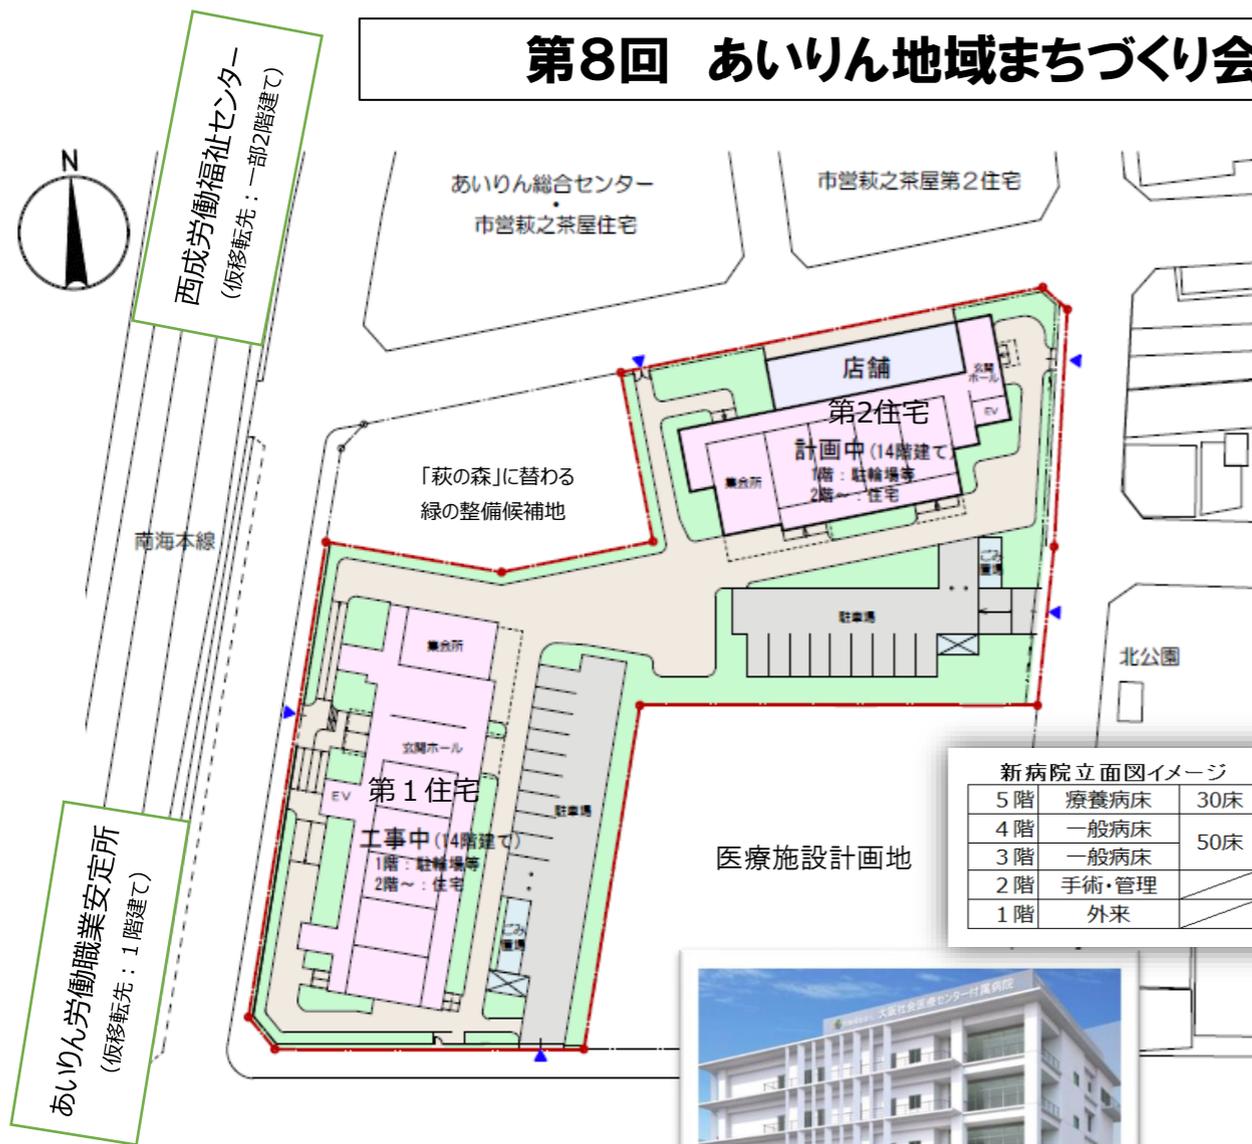

各施設別検討会議の進捗状況

市営住宅検討会議

- ・第1住宅・・・平成31年2月の完成に向けて、現在は11階部分の躯体工事を行っている。
- ・第2住宅・・・萩小跡地の北東側での配置計画が確定し、来年春頃の着工に向けて、実施設計を行っている。

医療施設検討会議

- ・無料低額診療は維持する。
- ・移転先(配置場所)は萩小跡地の南東側(約2,000㎡)。
- ・(福)大阪社会医療センターが主体となり80床(外来機能と一般50床、療養30床)の病院を整備する。
- ・平成30年度実施設計、平成31年度～32年度建設工事予定。
- ・大阪社会医療センターでの診療状況や地域での取組み状況、機能のあり方について、地域などへ丁寧な説明を行う。

駅前活性化検討会議

- ・新今宮駅周辺の状況について、浪速区側も含めた状況把握が必要。
- ・地域へわざわざ来る人を増やす空間、降りたくなる空間、多目的に使用できるオープンスペースにした使い方など、場所・規模に限らず空いたスペースの利用のあり方、あるべき姿を検討。

労働施設検討会議

- ・労働施設の耐震化については、利用者の安全・安心確保を最優先に、いったん外部に仮移転し、現地で建て替えることを確認した。
- ・仮移転先については、南海電鉄高架下とする多くの意見があったことを労働施設検討会議として第5回あいりん地域まちづくり会議(平成28年7月26日)に報告し、大多数の委員の了解を得て、南海電鉄高架下に決定した。
- ・現地での建て替えを前提に、新施設の機能に合せた規模の議論に向け、現在、検討を行っている。
- ・仮移転施設は今年度中に整備工事を行い、移転する予定。

公園検討会議

- ・あいりん地域内の4公園(萩之茶屋北公園、萩之茶屋中公園、萩之茶屋南公園、花園公園)などに関する意見交換を行い、出された意見を基に、あいりん地域のまちづくりにおける公園の使い方やあり方について議論を深めていく。
