


R 7年度 プラント設備解体撤去工事スケジュール

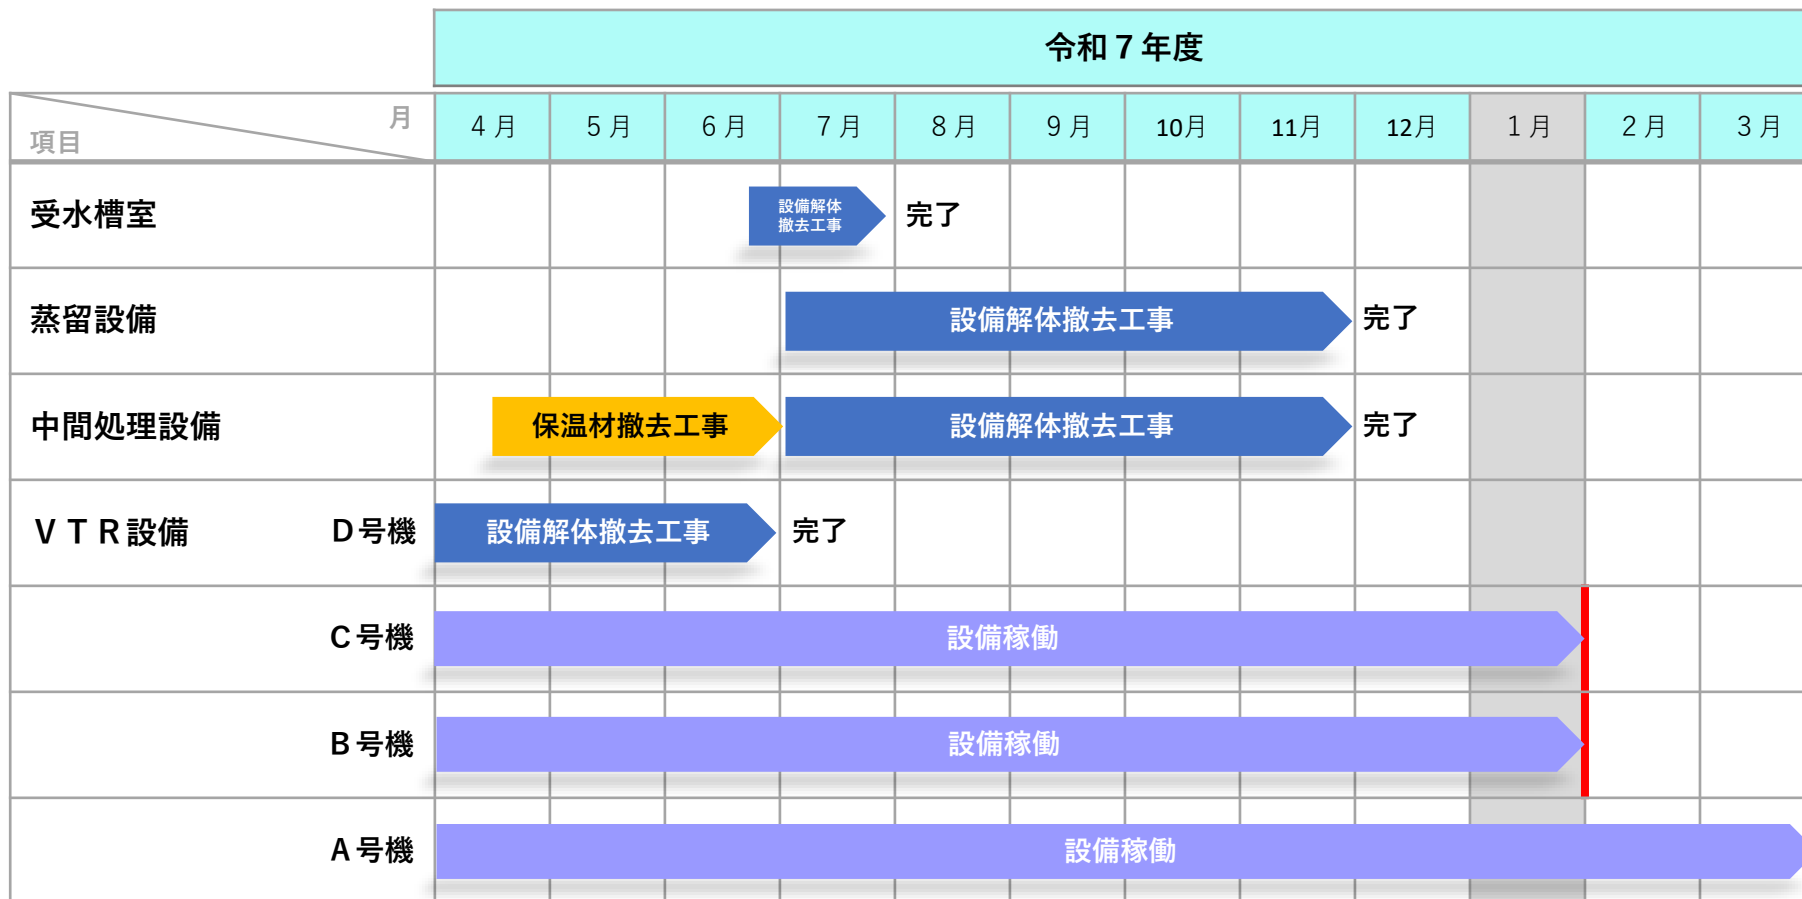


※ V T R 設備 B、C号機の安全弁ラインに高濃度が判明したため、B、C号機を令和8年1月末に停止。当該配管は撤去しA号機にて処理することとする。

別紙1


受水槽室 タンク類解体撤去工事

受水槽室 タンク類解体撤去工事

西棟 1 F

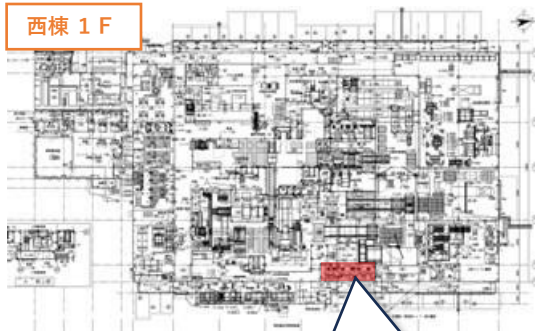

受水・貯槽室・緊急時シャワー受水槽室



受水槽室内に設置されているタンク、配管類の解体撤去（7.6 ton）を、令和7年6月末より7月25日で解体撤去工事完了。

解体撤去前



解体撤去後



別紙 2-1

受水槽室 タンク類解体撤去工事

解体撤去対象機器等について

	機器番号	機器名称
1	TK-2609	KC1000相当貯槽1
2	TK-2610	KC1000相当貯槽2
3	TK-2611	KC500相当貯槽3
4	TK-2612	KC300相当貯槽2
5	TK-2613	KC500相当貯槽1
6	TK-2614	KC500相当貯槽2
-	-	配管類 等


解体機器数：6基

撤去重量：7.6 t（配管類等含む）


蒸留設備解体撤去工事

蒸留設備解体撤去工事

西棟 4 F

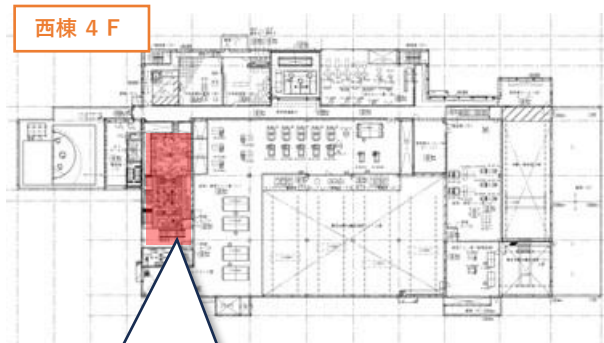


蒸留室 4 F

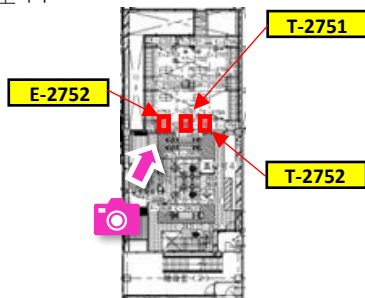

蒸留室(1F~5F)内に設置されている槽、配管類の解体撤去(約37.2ton)を、令和7年7月より11月末で解体撤去工事完了。

解体撤去前

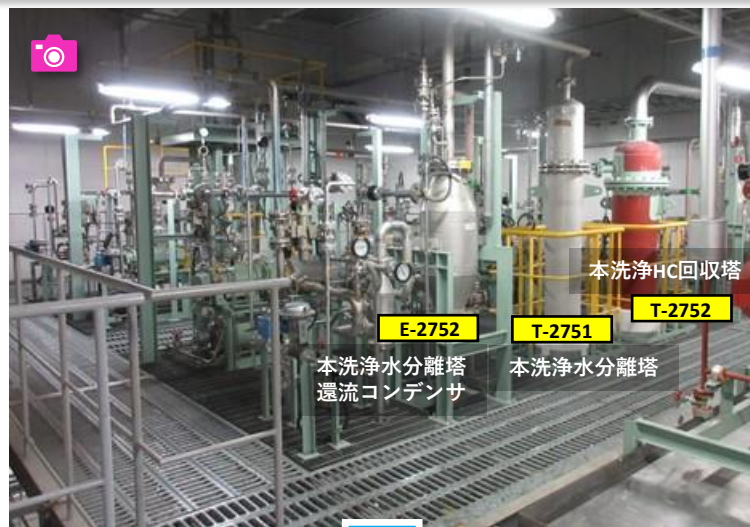

解体撤去後



蒸留設備解体撤去工事

解体撤去対象機器等について

	機器番号	機器名称
1	E-2601	貯槽ベントコンデンサ8
2	E-2609	貯槽ベントコンデンサ16
3	E-2701	粗洗浄水分離塔リボイラ
4	E-2702	粗洗浄水分離塔還流コンデンサ
5	E-2703	粗洗浄水分離塔ベントコンデンサ
6	E-2704	粗洗浄HC回収塔リボイラ
7	E-2705	粗洗浄HC回収塔還流コンデンサ
8	E-2706	粗洗浄HC回収塔ベントコンデンサ
9	E-2708	蒸留装置ベントガスクーラ
10	E-2751	本洗浄水分離塔リボイラ
11	E-2752	本洗浄水分離塔還流コンデンサ
12	E-2753	本洗浄水分離塔ベントコンデンサ
13	E-2754	本洗浄HC回収塔リボイラ
14	E-2755	本洗浄HC回収塔還流コンデンサ
15	E-2756	本洗浄HC回収塔ベントコンデンサ

	機器番号	機器名称
16	E-2902	TCB分離塔リボイラ
17	E-2903	第1蒸留塔コンデンサ
18	E-2904	第1蒸留塔リボイラ
19	T-2701	粗洗浄水分離塔
20	T-2702	粗洗浄HC回収塔
21	T-2751	本洗浄水分離塔
22	T-2752	本洗浄HC回収塔
23	T-2901	TCB分離塔
24	T-2902	第1蒸留塔
25	TK-2601	蒸留回収PCB/TCB貯槽
26	TK-2618	蒸留廃液回収貯槽1
27	TK-2619	蒸留廃液回収貯槽2
28	V-2701	粗洗浄水分離塔リフラックスタック
29	V-2702	粗洗浄水分離塔中間タンク
30	V-2703	粗洗浄HC回収塔フィードフラッシュドラム

	機器番号	機器名称
31	V-2704	粗洗浄HC回収塔リフラックスタック
32	V-2751	本洗浄水分離塔リフラックスタック
33	V-2752	本洗浄水分離塔中間タンク
34	V-2753	本洗浄HC回収塔フィードフラッシュドラム
35	V-2754	本洗浄HC回収塔リフラックスタック
36	V-2903	TCB分離塔還流槽
37	V-2904	第1蒸留塔還流槽
38	—	TCBドラム缶充填装置
—	—	配管類等

解体機器数：38基

撤去重量：37.2 t（配管等含む）


中間処理設備解体撤去工事

中間処理設備解体撤去工事

東棟 4 F



中間処理室 4-(1)

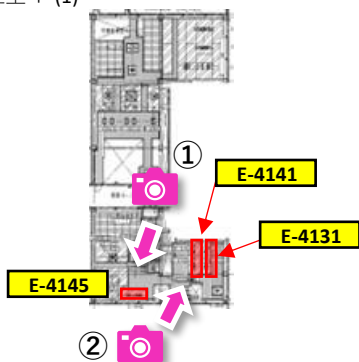

中間処理室内に設置されているタンク、配管類の解体撤去（約76.5ton）を、令和7年7月より11月で解体撤去工事完了。

解体撤去前



解体撤去後



中間処理設備解体撤去工事

解体撤去対象機器等について

	機器番号	機器名称
1	T-4131	第1低沸蒸留塔
2	T-4141	第2低沸蒸留塔
3	V-4132	第2低沸蒸留塔供給槽
4	V-4133	混入水受槽
5	V-4173	廃アルカリ蒸留塔還流槽
6	E-4111A	静置分離槽ベントコンデンサA
7	E-4111B	静置分離槽ベントコンデンサB
8	E-4112A	静置分離槽加温器A
9	E-4112B	静置分離槽加温器B
10	E-4121	抽出用溶媒加温器
11	E-4131	第1低沸蒸留塔凝縮器
12	E-4132	第1低沸蒸留塔サブクーラ
13	E-4133	第1低沸蒸留塔塔底加熱器
14	E-4141	第2低沸蒸留塔凝縮器
15	E-4142	第2低沸蒸留塔サブクーラ
16	E-4143	第2低沸蒸留塔塔底加熱器
17	E-4144	PCB処理油冷却器
18	E-4145	低沸蒸留塔真空ポンプアフタークーラ
19	E-4153A	調整槽ベントコンデンサA
20	E-4153B	調整槽ベントコンデンサB
21	E-4171	廃アルカリ蒸留塔凝縮器

	機器番号	機器名称
22	E-4211A	PCB脱気槽ベントコンデンサA
23	E-4211B	PCB脱気槽ベントコンデンサB
24	E-4521A	コンデンサ抜油中間槽ベントコンデンサA
25	E-4521B	コンデンサ抜油中間槽ベントコンデンサB
26	E-4531A	洗浄回収油中間槽ベントコンデンサA
27	E-4531B	洗浄回収油中間槽ベントコンデンサB
28	E-4191	高濃度ベントガススクラバー冷却器
29	E-4192	低濃度ベントガススクラバー冷却器
30	E-4291A	PCB脱気ガススクラバー冷却器A
31	E-4291B	PCB脱気ガススクラバー冷却器B
32	F-4152A	活性炭チェックフィルタA
33	F-4152B	活性炭チェックフィルタB
34	F-4153	廃活性炭フィルタ
35	VP-4141A	低沸蒸留塔真空ポンプA
36	VP-4141B	低沸蒸留塔真空ポンプB
37	V-101	留出水貯槽
38	F-100	留出水バックフィルタ
39	F-101	留出水ろ過フィルタ 1
40	F-102	留出水オイルセパレータ 1
41	F-103	留出水ろ過フィルタ 2
42	F-104	留出水オイルセパレータ 2

	機器番号	機器名称
43	F-105	留出水チェックフィルタ
44	F-106	活性炭フィルタ
45	F-107	活性炭除去チェックフィルタ
46	P-01	活性炭処理水受槽移送ポンプ
47	P-03	処理水貯槽移送ポンプ
48	M-8113	分離回収・廃PCB排出機
49	M-8114	コンデンサ抜油PCB排出機
50	M-8115	洗浄回収PCB排出機
51	M-8116	VTR洗浄水・緊急シャワー水排出機
52	P-8101	分離回収及び廃PCB排出ポンプ
53	P-8102	コンデンサー抜油PCB排出ポンプ
54	P-8103	洗浄回収PCB排出ポンプ
55	P-8104	VTR洗浄水及び緊急シャワー水排出ポンプ
56	M-8121	蓋移載装置
57	M-8122	ドラム缶昇降装置
58	M-8123	充填機
59	M-8131	蓋移載装置
60	M-8132	ドラム缶昇降装置
61	M-8133	充填機
-	-	配管類等

解体機器数：61基

撤去重量：76.5 t (配管類等含む)

解体撤去工事に係る全体スケジュール

