

事業名：  
十三吹田線

所在地：  
東淀川区淡路2丁目～西淡路5丁目

目的：

本路線は、淀川区から東淀川区を東西に結び、隣接する吹田市に至る幹線道路である。本路線北側の吹田市では、当該区間に通じる阪急電鉄千里線部分において、アンダーパスの建設が進められており、当該区間を整備することにより、大阪市の北東部から吹田市域へのネットワークが形成されることになる。

また、当該地区周辺は、6m未満の狭幅員道路が多く、防災上の課題を解決する上でも重要な事業である。






本路線を整備することにより、機能的な道路ネットワークを構築し、住宅市街地における交通安全の確保を図るものである。また、併せて電線類を地中化し、無電柱化することにより、安全で快適な道路空間の整備を図る。

事業内容

- ・ 道路整備（新設）
  - 延長 L=780m
  - 幅員 W= 25m（両側2車線 歩道有）



凡例

-  当該路線
-  事業中区間
-  完成区間
-  未整備区間
-  未拡幅区間

吹田市

十三吹田線

L= 780m  
W= 25m

阪急京都線東付属街路  
1号線外7路線

歌島豊里線

新庄長柄線

淀川北岸線

西淡路南方線


御堂筋線

庄内新庄線

# 社会経済情勢等の変化

## 事業開始時（14年前）

- ・ 地下鉄御堂筋線と阪急京都線・千里線で囲まれた当該エリアにおいて、道路整備を行うことにより、鉄道による地域分断を解消する南北方向の幹線道路が不足している。
- ・ 当該地区の現況道路は、幅員6m未満の道路が多く、道路整備することにより、防災上の問題の解消を図る。



## 現在

- ・ 本路線は、淀川区から東淀川区を東西に結び、隣接する吹田市に至る幹線道路であり、吹田市では当該区間に通じる阪急電鉄千里線部分において、アンダーパスの建設が進められており、整備することにより、大阪市の北東部から吹田市域へのネットワークが形成される。
- ・ 当該地区の現況道路の状況は変わっておらず、幅員6m未満の道路が多く、道路整備することにより、防災上の問題の解消を図る。

本路線の整備により、淀川区から吹田市に至る幹線道路ネットワークの形成、また、現況道路が狭い道路が多い当該地区の歩行者等の安全性の向上、防災性の向上が図られることから道路整備の必要性は高まっている。

# 事業費の見込み

## ■建設局運営方針

### 【局の目標（何を指すのか）】

- 安全・安心で快適な市民生活、活力あふれる都市活動を支える都市空間の実現
- 地域主権確立の視点に基づく市民協働、都市間水平連携などの仕組みづくり


### 【経営課題】

- まちの渋滞の解消、道路ネットワークの向上など、都市活動を支える都市計画道路の整備、ボトルネック踏切の解消などが長期化し、効果の発現に時間を要している。


### 【戦略・取組】

- JR東海道線支線連続立体交差事業
- 淀川左岸線2期整備
- 連続立体交差事業（阪急京都線・千里線）
- 都市計画道路の整備

## ■建設局事業費の見込み（単位：億円）

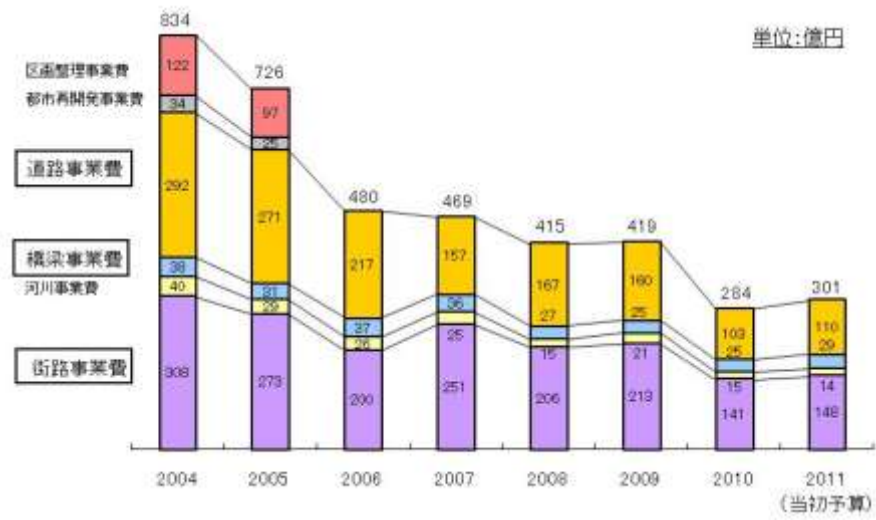

## 街路事業費の見込み（単位：億円）

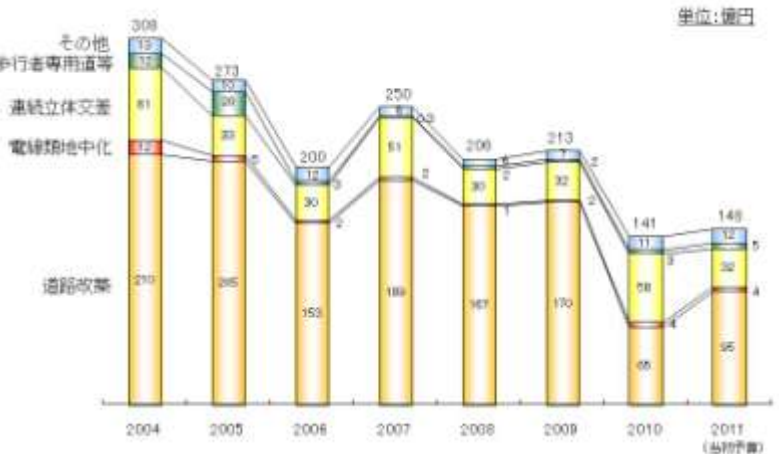

## 街路事業の進め方

### 【重点整備路線・完了期間宣言防災路線】

- 用地取得率が高く、整備効果が早期に発現できる路線として重点的に整備する。
- 地震時における重点密集市街地の被害を軽減するため、防災環境軸の核となる路線を重点的に整備する。

### 【他事業関連路線、鉄道・立体交差事業関連路線】


- 他事業と連携して進めることが事業進捗上有利な箇所や、他事業の進捗に合わせる必要がある路線に重点的に投資する。

### 【その他路線】

- 積極的に買収は行わないが権利者の買取要望には対応。
- 重点整備路線が完了しだい、次期重点整備路線として路線を抽出する。

# 事業の進捗状況、今後の進捗の見込み

## 進捗率の推移（単位：％）

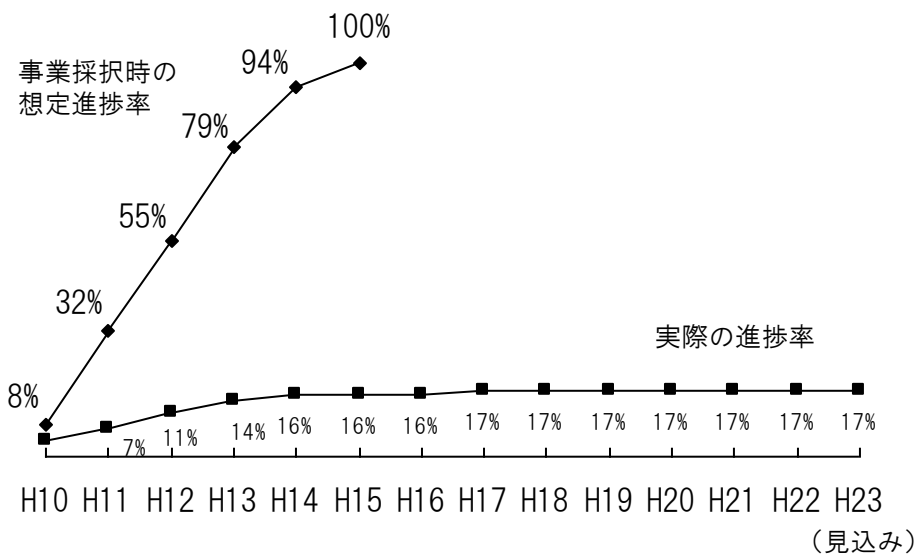

## 事業が遅延した原因とその状況

・再評価時点（H18）に比べ、財政状況はさらに悪化し、年次計画どおりの予算確保が難しく地権者からの買取要望に対応している状況であり、残る事業用地の取得が長期間に及んでいる。



## 残事業の内容

- ・用地取得40件（5,141㎡）
- ・道路工事（延長780m、面積19,500㎡）
- ・残事業費約55.6億円

## 今後のスケジュール（見込み）


- ・平成27年度 事業完了予定

## 対応と解消の目途及びその根拠

・幹線道路ネットワークの形成、現道が狭い道路が多い当地区の歩行者の安全性の向上、防災性の向上が図られることから、事業実施の必要性は高い状況にあるが、限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しく、限定的な事業実施となるため、事業完了するには長期間を要する。

# 重点化の考え方

各路線の進捗率（単位：％）

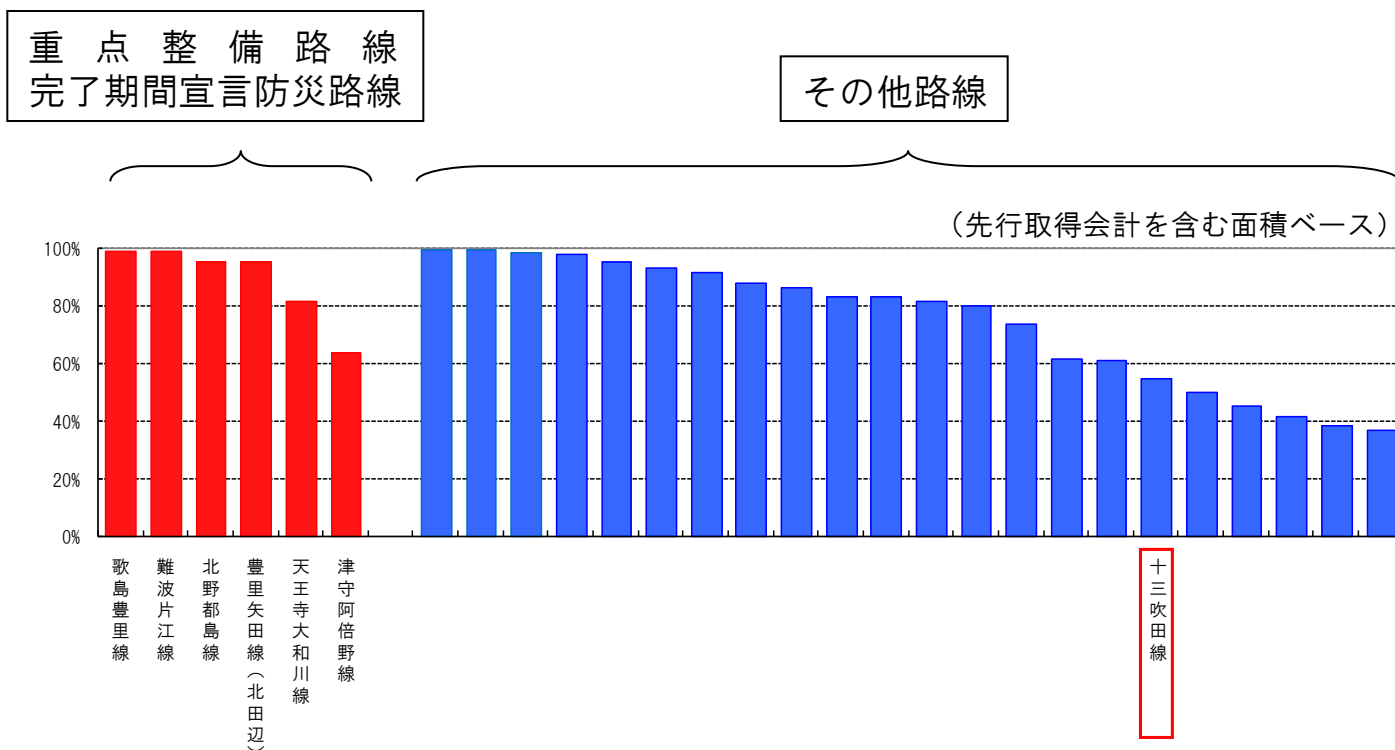

用地取得率が高く、整備効果が早期に発現できる路線を重点整備路線に位置付け、完了時期を宣言し、重点的に財源を投入する。

重点整備路線以外のその他の路線のうち、進捗率が高い、あるいは事業遅延による影響が大きい路線については、予算の範囲内で継続的に事業実施を行うものとし、それ以外の路線については、限定的な事業実施にとどめる。

# 事業が遅れることによる影響

## 事業が遅延する理由（財政面以外）

- ・さらなる土地価格の下落等により、用地買収交渉が難航すると、残る事業用地の取得ができず、道路整備が遅延する。

## 事業が遅延することで発生が想定される課題

### （事業者の視点）


- ・淀川区から吹田市に至る大阪市北東部から吹田地域に繋がる機能的な道路ネットワークの形成が遅れる。  
現況道路は、幅員6m未満の道路が多く、防災上の問題の解消できない。

### （利用者の視点）

- ・歩行空間の確保による歩行者の安全安心の享受や、沿道環境改善による周辺地域への事業効果の享受が遅れる。

### （権利者等事業関係者の視点）

- ・都市計画法第65条により、長期にわたって制限をかけられることとなる。



## 課題への対応

- ・今後限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しく、早期事業効果の発現は困難な状況にあるが、機能的な道路ネットワーク形成、防災上の問題解消のためにも重要であることから、限定的な対応ではあるが、事業進捗を図る。

- ・現況道路は、幅員6m未満の道路が多く、道路整備することにより、交通安全上の問題も解消することから、今後限られた予算の中で本路線への重点的な予算の配分は難しいが、予算の範囲内で着実に事業進捗を図る。

- ・買取要望への対応などにより、権利者への影響を最小限に抑えていくとともに、早期の道路整備着手を目指す。

# 大阪都市計画道路 十三吹田線

①




②



③



計画幅員 25.0m



凡例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:gray;"></span>	用地取得済箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	整備済箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>	残用地取得物件

工事進捗率：0.3%（事業費ベース）  
 用地取得進捗率：19.8%（事業費ベース）  
 55.3%（面積ベース（先行取得会計を含む））



## [費用便益分析について]

### ◆路線名：都市計画道路 十三吹田線

#### 1. 費用便益分析の基本的な考え方（新規道路整備）

- 費用便益分析は、ある年次を基準年として道路整備が行われる場合と行われない場合について、一定期間の便益額、費用額を算定し、道路整備に伴う便益の増分と費用を比較することにより分析、評価を行う。
- 新規道路整備に伴う効果としては、様々な効果が存在するが現時点における知見により十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について便益を算出する。
- 費用としては、道路整備に要する事業費および、維持管理に要する費用が挙げられる。

$$\text{費用便益比} = (\text{総便益の現在価値}) \div (\text{総費用の現在価値})$$

- 総便益の現在価値 = 走行時間短縮便益 + 走行経費減少便益 + 交通事故減少便益
- 総費用の現在価値 = 事業費 + 維持管理費

#### 2. 費用および便益算出の前提

- 費用便益分析にあたっては、算出した各年次の便益、費用の値を割引率を用いて現在価値に換算し分析する。
  - 現在価値算出のための割引率 : 4% (基準年次以前については、最新のGDPデフレーターを適用し、基準年次の実質価格に変換)
  - 基準年次 : 評価時点
  - 検討年数 : 50年
- 計画道路が供用される年次における周辺道路の交通量については以下の仮定を前提として設定する。
  - 計画道路のある場合とない場合で設定した断面の総交通量は変化しない。
  - 計画道路の交通量はこの道路整備により影響を受ける道路（競合道路）から転移する。

#### 3. 便益の算定

##### 1) 便益算定の考え方

- 各便益は、道路の整備・改良がない場合の費用（損失額）から、道路整備・改良がある場合の費用（損失額）を減じた差として算定する。

##### 2) 「走行時間短縮便益」

- 総走行時間費用は、各路線の走行時間に時間価値原単位を乗じて算定する。

##### 3) 「走行経費減少便益」

- 走行経費は、走行距離単位当たりで計測した原単位を用いて算定する。

##### 4) 「交通事故減少便益」

- 交通事故による社会的損失は、事故率を基準とした算定式を用いて算定する。

##### 5) 総便益の現在価値の算定

- 計画道路の供用開始年を起算年として検討期間の各年次の各便益を基準年価格に割戻しそれらを合計した額が総便益の現在価値となる。

#### 4. 費用の算定

##### 1) 道路整備に要する事業費

- 道路整備に要する事業費は「工事費」、「用地費」、「補償費」が対象となる。


##### 2) 道路の維持管理に要する費用

- 道路維持管理に要する費用としては「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「オーバーレイ費」等が考えられる。
- 道路維持管理費の設定にあたっては、既存の路線での実績を参考に設定する。

##### 3) 総費用の現在価値の算定

- 事業費については事業期間、維持管理費については検討期間の各年次の費用を基準年価格に割戻しそれらを合計した額が総費用の現在価値となる。

費用便益分析の算定フロー

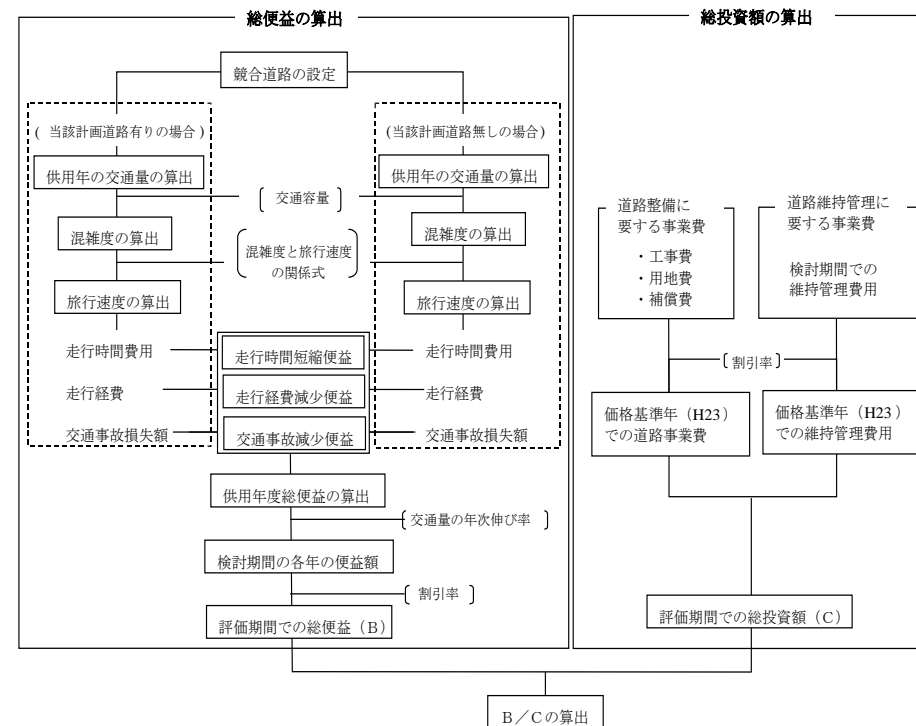

[費用便益の算定]

◆路線名:都市計画道路 十三吹田線 (L=780m、W=25m)


1. 各種の時点及び期間

供用年	平成 28 年度
交通量観測年	平成 17 年度
交通量推計年	平成 42 年度
価格基準年	平成 23 年度
検討期間	供用年から 50 年間

2. 計画道路と競合道路の概要

・ネットワークが格子状に形成されており、当該計画道路に並行した道路が存在するため、競合道路は下記を想定する。

新庄長柄線  
新御堂筋

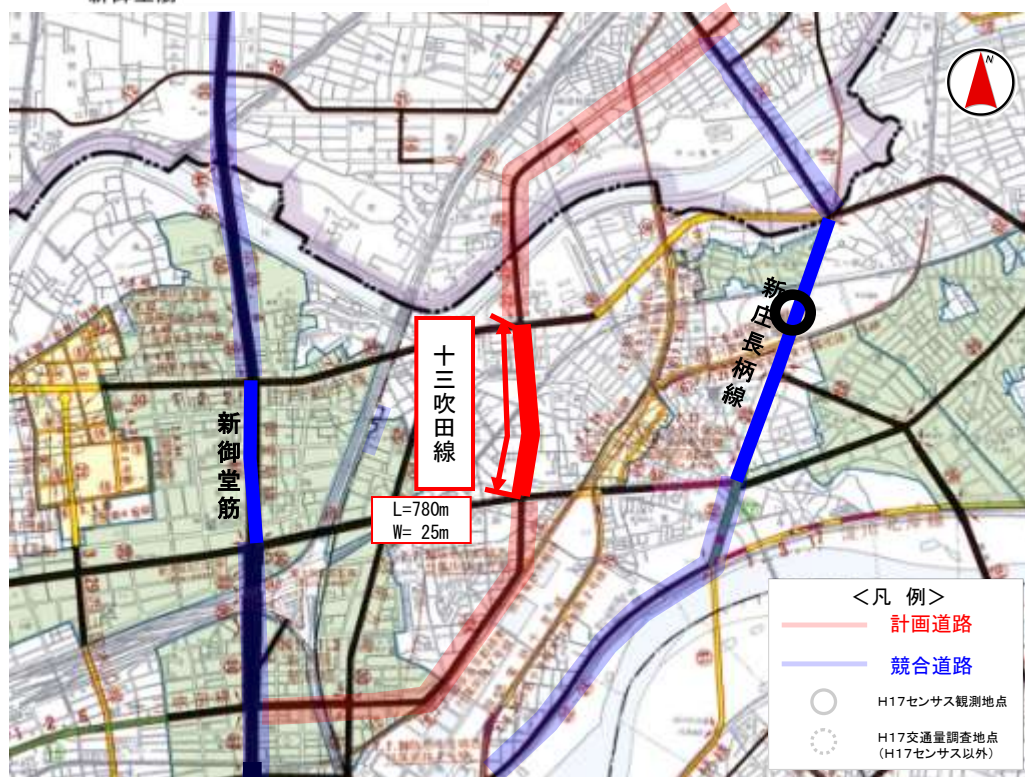

3. 費用便益分析の結果

①旅行速度の算定

◆計画道路整備なしの場合

	計画道路 (新規計画)	競合道路	競合道路
	十三吹田線	新庄長柄線	新御堂筋
交通量 (台/日)	0	28,927	133,164
交通容量 (台/日)	0	28,800	48,000
混雑度	0	1.00	2.77
走行速度 (km/h)	0	36.89	7.00

◆計画道路整備ありの場合

	計画道路 (新規計画)	競合道路	競合道路
	十三吹田線	新庄長柄線	新御堂筋
交通量 (台/日)	6,736	27,723	127,634
交通容量 (台/日)	28,800	28,800	48,000
混雑度	0.23	0.96	2.66
走行速度 (km/h)	36.00	37.56	7.00

②路線別の初年便益

[供用年] 平成 28 年度

	計画道路 (新規計画)	競合道路	競合道路	合計
	十三吹田線	新庄長柄線	新御堂筋	
走行時間費用 (億円)	-1.6	0.4	6.6	5.4
走行経費 (億円)	-0.5	0.1	0.7	0.3
交通事故損失額 (億円)	-0.3	0.1	0.1	-0.2

③便益 (B) の算定

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成 23 年度			
供用年	平成 28 年度			
初年便益 (億円)	5.4	0.3	-0.2	5.5
便益総額の現在価値 (億円)	92.7	4.7	-2.8	94.6

④費用 (C) の算定

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成 23 年度		
投資総額の単純合計 (億円)	68.5	1.3	69.7
投資総額の現在価値 (億円)	62.3	0.5	62.8

⑤評価指標の算定結果

社会費用便益比 CBR	$B/C = 1.51$
-------------	--------------

注) 便益額、費用額については単位 (億円) 下一桁を四捨五入しているため、合計値の端数が合致しない場合もある。

図一十三吹田線と競合路線
