

公園事業実施状況説明資料

◆建設局運営方針(平成25年度)の概要

- 都市基盤施設の高齢化が進んでいるのに対し、区と連携して計画的な管理を行い、効果的・効率的に活用するとともに、その機能を着実に維持
- 安全・安心の喫緊の課題として、地域特性にあった局地的な浸水対策の実施、通学路の安全確保や交通事故抑止に向けた取組みの推進
- 活力あふれる都市活動を支える都市空間の実現に向け、都市交通の円滑化、市街地の一体化を促進する連続立体交差事業、観光拠点となる大阪城の公園の魅力向上などへの取組み
- 市政改革プランに沿って、歳入の確保や経常経費の削減等に取り組むとともに、府市統合本部や府市カウンターパートでの検討を踏まえ、都市魅力あふれる大阪市大阪の実現に繋がる施策の展開

◆公園事業の大阪市の全体計画の中での位置付け

○公園事業全般

緑の基本計画－緑のまちをつくる基本方針

(1)安全・快適な都市生活をささえる緑の基盤をつくる－緑のベースエリアの整備にて位置づけ
H25年度業再評価対象公園のうち、下記3公園については、別途特徴的に位置づけ

○毛馬桜之宮公園，中之島西公園

緑の基本計画－緑のまちをつくる基本方針

(2)大阪らしさを創出する緑の風景をつくる－H. アメニティ豊かな大川・中之島ゾーンの整備にて位置づけ

○鶴見緑地


緑の基本計画－緑のまちをつくる基本方針

(3)活気あふれるまちを創出する緑の拠点をつくる－L. にぎわいのある緑の交流拠点の整備にて位置づけ


事業計画一覧

	番号	種別	公園・緑地名	行政区	事業面積 (ha)	未整備面積 (ha)	着手年度	状況	残 事 業
都市計画による公園	1	街区	南生野	生野区	0.68	0.68	1998	全域	用地取得、教育用地管理替、施設整備
	2	街区	中之島西	北区	0.63	0.04	1978	全域	用地取得、施設整備
	3	街区	淡路2号	東淀川区	0.17	0.17	2005	全域	用地取得、施設整備
	4	街区	海老江東	福島区	0.24	0.24	2010	全域	用地取得、施設整備
	5	特殊	天王寺	天王寺区	26.00	0.00	2011	一部	施設再整備
	6	近隣	御幣島中央	西淀川区	2.30	2.30	1985	全域	施設整備
	7	近隣	南港東	住之江区	1.10	1.10	1985	全域	施設整備
	8	近隣	阿倍野再開発2号	阿倍野区	1.10	0.57	2003	全域	施設整備
	9	地区	高見	此花区・福島区	3.70	0.11	1987	全域	施設整備
	10	地区	津守中央	西成区	3.70	0.16	1997	全域	施設整備
	11	地区	巽	生野区	2.50	1.00	1988	一部	用地取得、施設整備
	12	総合	毛馬桜之宮	北区・都島区	40.40	5.10	1967	一部	用地取得、施設整備
	13	風致	大和川	住之江区・住吉区・東住吉区	6.70	2.10	1992	一部	用地取得、施設整備
	14	歴史	大阪城	中央区	20.00	2.78	2004	一部	施設整備
	17	歴史	難波宮跡公園	中央区	11.20	10.10	2001	一部	用地取得、施設整備
	15	緑地	鶴見緑地	鶴見区・城東区・旭区	127.00	3.90	1966	一部	施設整備
16	緑地	正蓮寺川公園	福島区・此花区	16.50	16.50	2007	全域	施設整備	
小 計				16箇所	263.92	46.85			
都市計画によらない公園	17	街区	三国東6号	淀川区	0.11	0.11	2011	全域	用地取得、施設整備
	18	街区	三国東1号	淀川区	0.10	0.10	2010	全域	用地取得、施設整備
	19	街区	幸町	浪速区	0.15	0.15	2011	全域	施設整備
	20	街区	山王太子	西成区	0.50	0.37	1997	全域	施設整備
	21	緑地	阪和線緑地	阿倍野区	1.46	1.46	1998	全域	用地取得、施設整備
小 計				5箇所	2.32	2.19			
合 計				21箇所	266.24	49.04			


事業箇所図

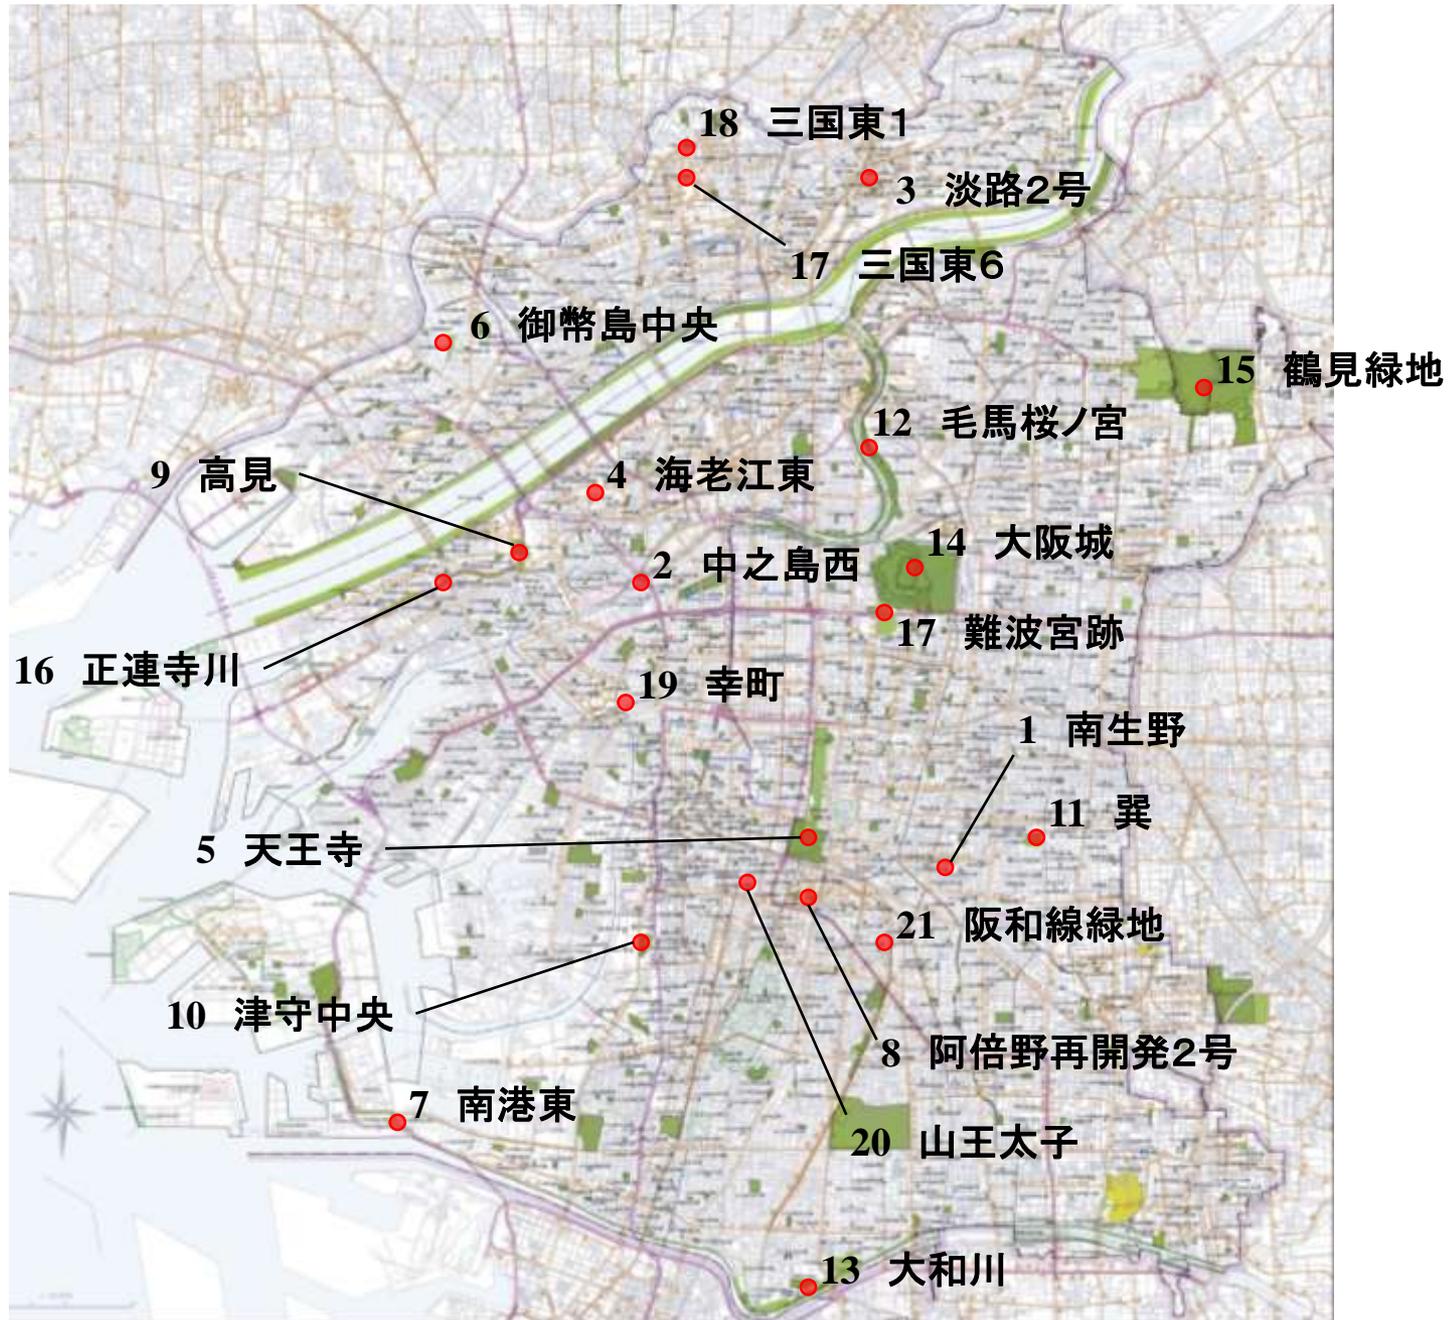


鶴見緑地事業の進捗

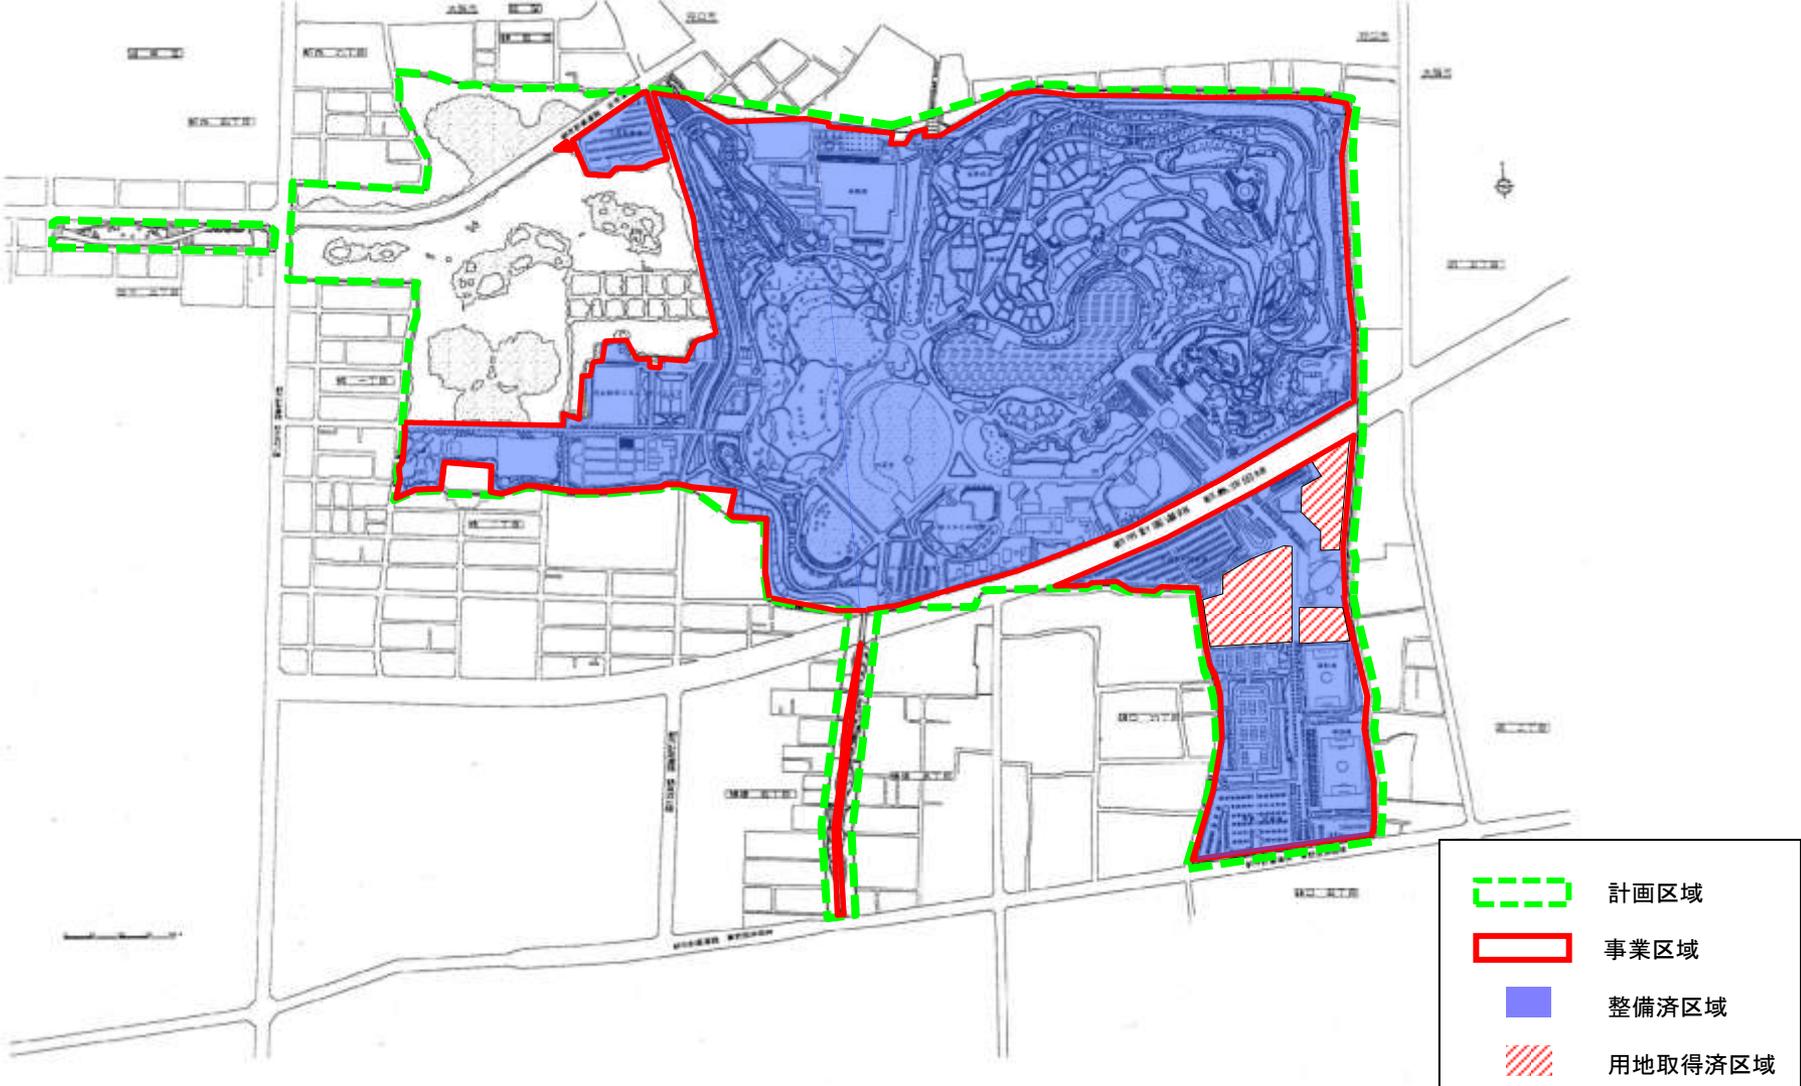

毛馬桜之宮公園事業の進捗

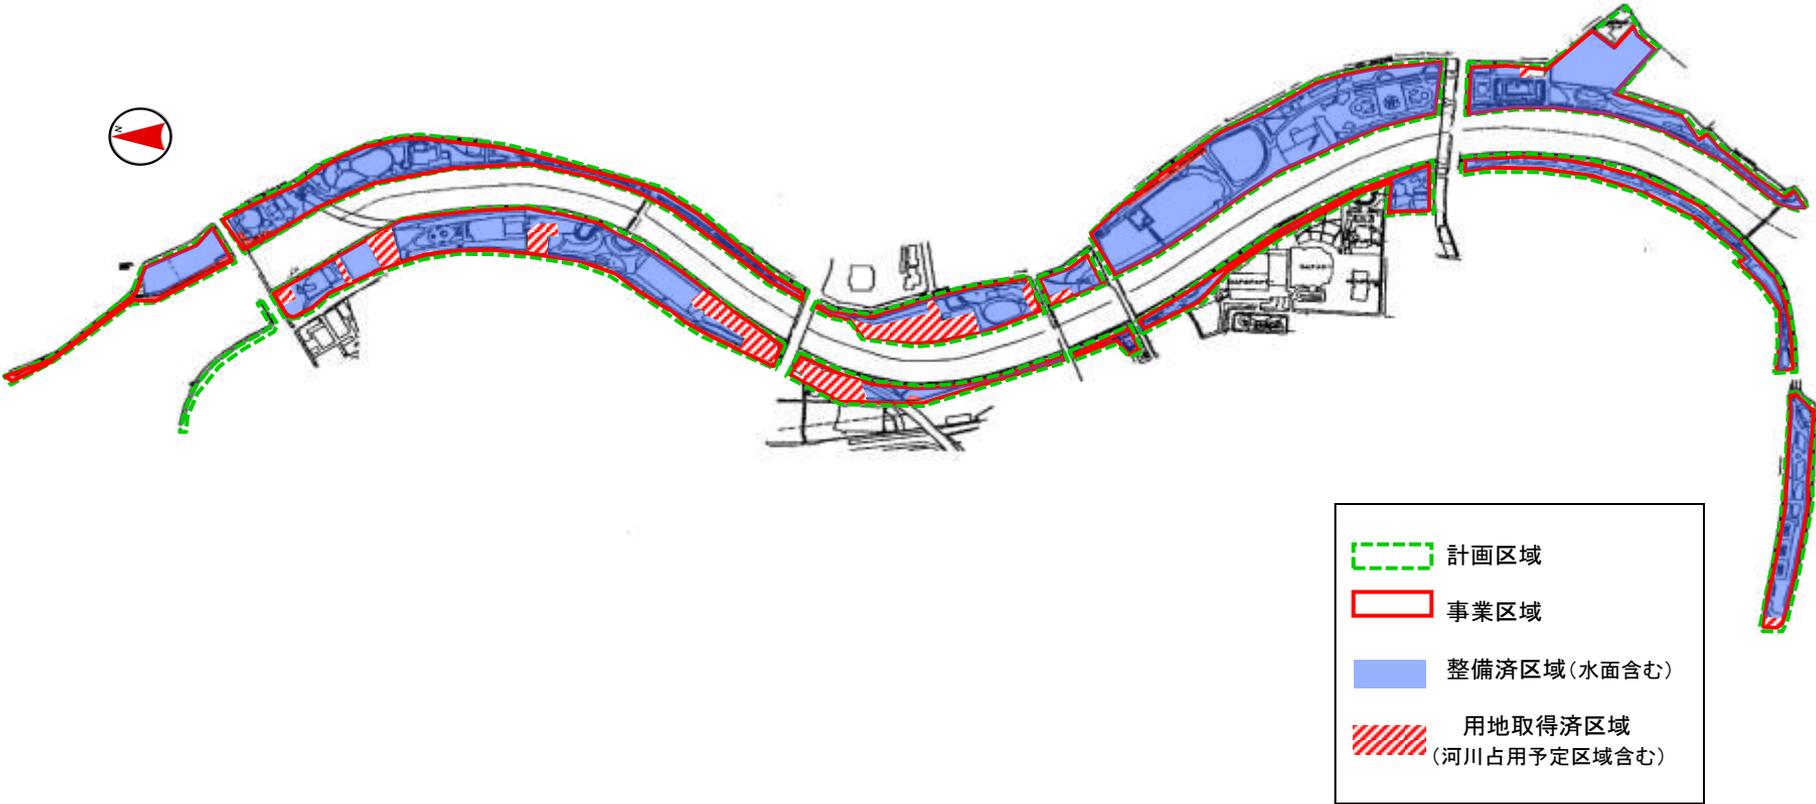


巽公園事業の進捗

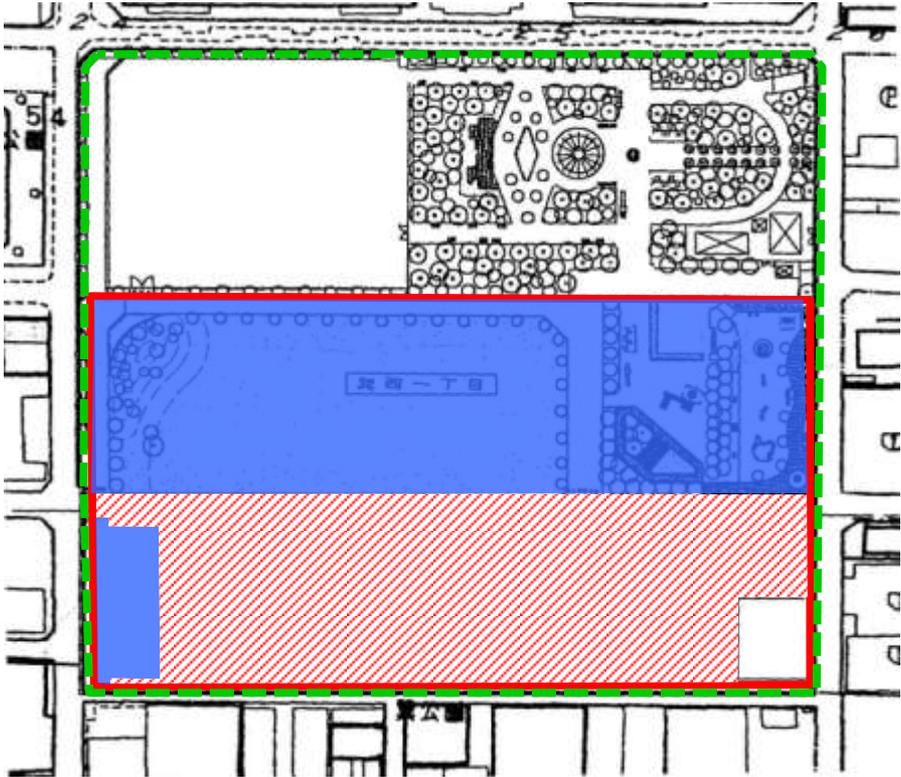

- 計画区域
- 事業区域
- 整備済区域
- 用地取得済区域

中之島西公園事業の進捗

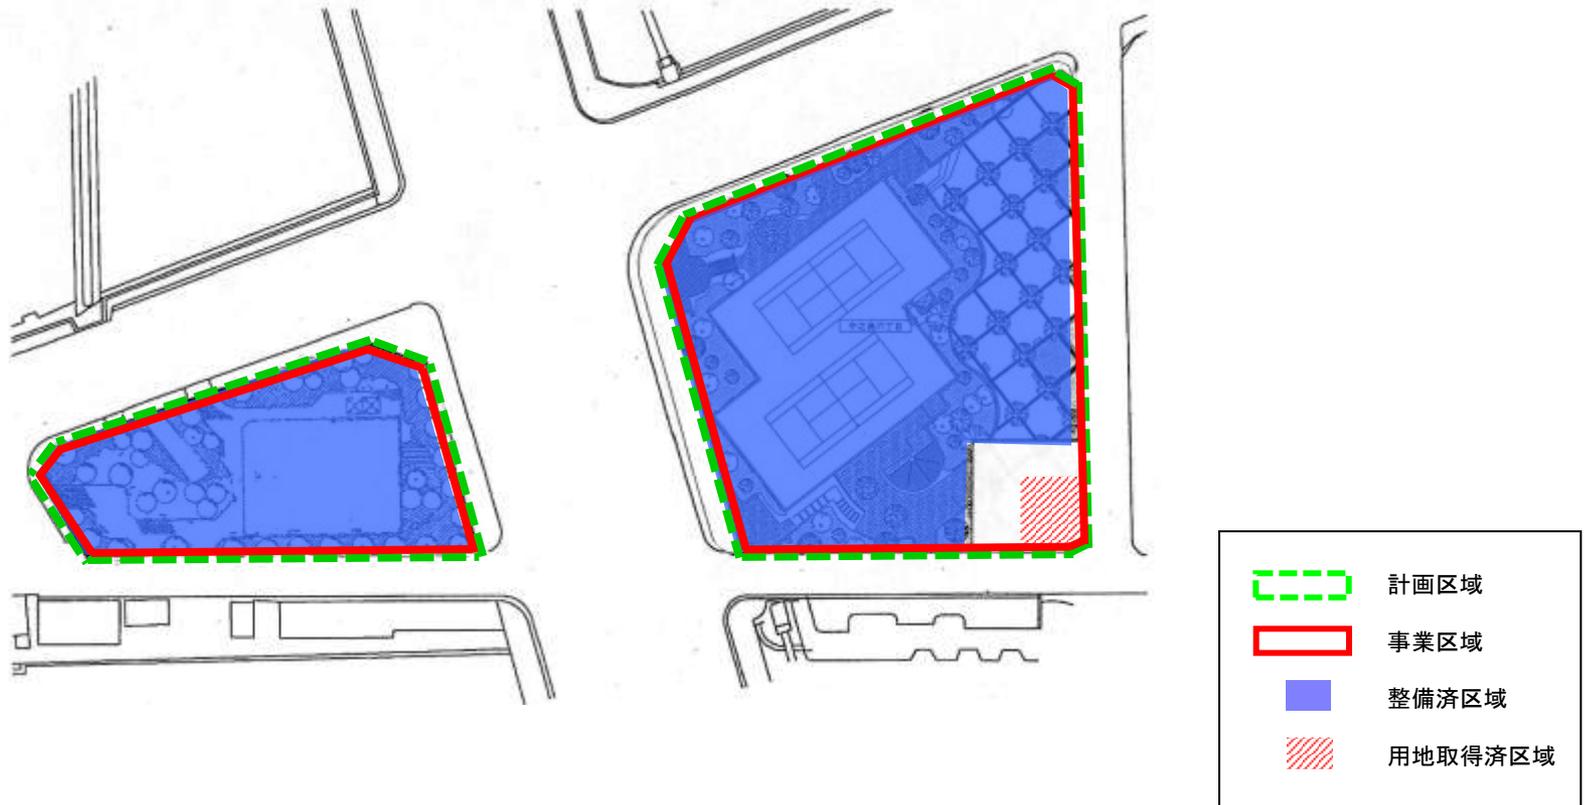


事業費の推移

新設関連事業費は平成9年度が約329億円であったのに対し、平成24年度は約14億円と、約1/23に激減している。

本市の財政状況は非常に厳しい状況ではあるが、今後も公園事業費を確保できるよう努めていく。

新設公園関連事業費の推移(億円)

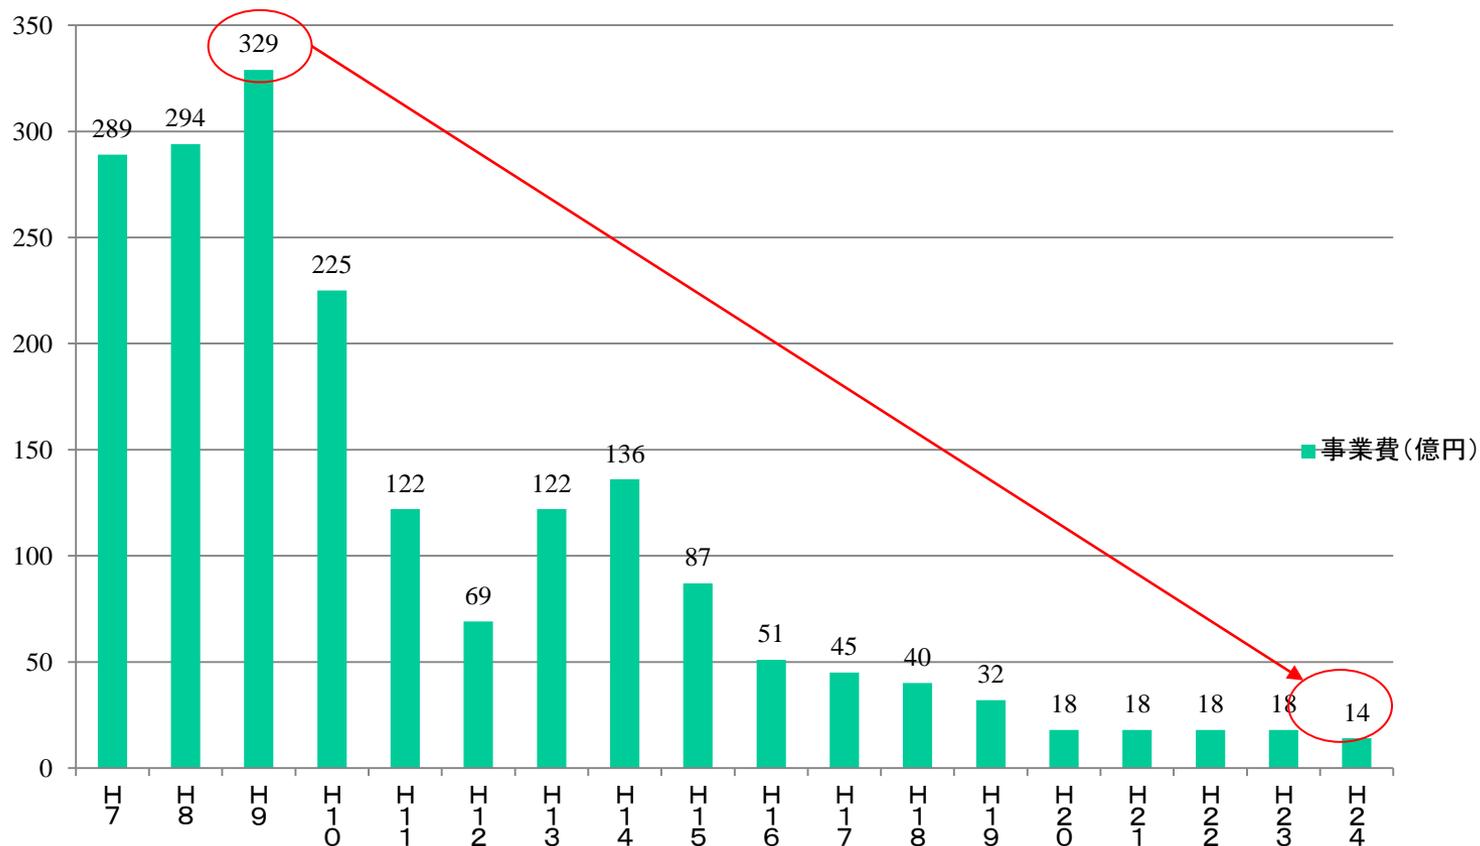

(見込) (予算)

選択と集中の考え方等

局運営方針に照らした事業の位置づけ

【鶴見緑地に関して】

・局運営方針(平成24年度)

「大公園への指定管理者制度の導入など新たな管理手法の検討」において、大公園における園内各施設の効果的な活用や管理の効率化・市民サービスの向上をはかるため、民間活力の活用など、より効率的な事業手法への転換を図る、としている。特に、鶴見緑地駅前エリアについては、平成26年4月までの営業開始に向け、事業者選定から協議調整等を進めていく、としている。

※鶴見緑地事業に関して、順次運営方針に従って事業進捗しており、完了の見通しがたっているため、平成25年度局運営方針からは除外

事業の選択と集中の考え方

- ・既に事業認可を取得するなど、事業着手している公園について優先的に実施。
 - ・既に公園用地として取得済みで、未整備である公園の早期開設に向け、優先的に実施。
- ※以上2点を限られた財源の中で調整し、実施して公園事業の推進を図る。
- ※大阪府市が連携して取組むような市の政策レベルでの事業に関しては、別途必要に応じ、実施に努める。

実施中事業一覧

公園・緑地名	全体事業費 (百万円)	進捗率 (%) 整備面積ベース	完了予定 年度	備考	重点	実施状況・予定										
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
南生野公園事業	1,220	0.0	H31										○	○	○	○
中之島西公園事業 ※今回対象	54	93.7	H29	大阪市緑の基本計画に 位置づけあり							○	○	○	○		
淡路2号公園事業	1,509	0.0	H32			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
海老江東公園事業	1,730	0.0	未定	H28までに用地再取得必要		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
天王寺公園事業	10,760	92.1	H27	局運営方針(H25)、大阪市緑の基 本計画に位置づけあり	●			●	●	●	○					
御幣島中央公園事業	1,710	0.0	未定													
南港東公園事業	3,298	0.0	未定													
阿倍野再開発2号公園事業	234	48.2	H25	大阪市緑の基本計画に 位置づけあり						●						
高見公園事業	3,695	97.0	未定	正蓮寺川公園完成まで 事業中断				●								
津守中央公園事業	19,718	95.7	H27			●				●	○	○				
巽公園事業 ※今回対象	16,300	60.0	H29								○	○	○	○		
毛馬桜之宮公園事業 ※今回対象	16,600	87.4	H35	大阪市緑の基本計画に 位置づけあり		●	●	●		●	○	○	○	○	○	○
大和川公園事業	27,700	68.7	未定													
大阪城公園事業	2,357	86.1	H27	局運営方針(H25)、大阪市緑の基 本計画に位置づけあり	●	●	●	●	●	●	○	○				
鶴見緑地事業 ※今回対象	127,500	96.9	H29	局運営方針(～H24)、大阪市緑の 基本計画に位置づけあり		●	●	●	●	●	○	○	○	○		
正蓮寺川公園事業	6,890	0.0	H32			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
三国東6号公園事業	683	0.0	H32					●	●	●	○					
三国東1号公園事業	345	0.0	H32				●	●			○					
幸町公園事業	36	0.0	H25					●		●						
山王太子公園事業	106	26.0	H25							●						
阪和線緑地公園事業	35,999	0.0	H34			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
