

事業再評価調書（2回目以降）


事業種別 事業名	歌島豊里線整備事業	
担 当	建設局道路部街路課（電話番号：06-6615-6745）	
1 再評価理由	国庫補助事業以外で事業再評価した年度から5年以上が経過し、なお継続中のもの（国庫補助事業であったが平成16年度より交付金化）	
2 事業概要	所在地 図1参照	東淀川区西淡路2丁目～菅原6丁目
	事業目的	<ul style="list-style-type: none"> ・本路線は、大阪北部を東西に連絡し、大阪の玄関口であるJR新大阪駅にアクセスする幹線道路であり、当該区間の整備により大阪北部から都心部を経由せず、大阪東部への道路ネットワークを形成し、鉄道駅へのアクセス性の向上や交通の円滑化を図るものである。 ・また、電線類の地中化による防災機能の向上や歩道整備による安全性の向上を図る。 ・さらに、本路線周辺で進めている、阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業や淡路駅周辺地区土地区画整理事業及び新庄長柄線、淀川北岸線の都市計画道路事業整備と一体的に整備を進める必要がある。
	事業内容	延長 L=1,470m 幅員 W=30m（道路新設） 車線数（片側 2車線、歩道あり）
3 事業の必要性の視点	事業を取り巻く社会経済情勢等の変化	<ul style="list-style-type: none"> ・本路線の整備により大阪北部から都心部を経由せずに大阪東部への道路ネットワークが形成されるとともに、本線周辺で進められている連続立体交差事業や区画整理事業、他の都市計画道路事業と一体的に整備を進めることで、さらなるアクセス性の向上や歩行者等の安全・安心な通行空間の確保及び、緊急時の避難路等の確保が図られることから、ますます必要性が高まっている。 ・なお、本路線は、用地取得率が高く整備効果が早期に発現できる路線として重点整備路線に位置付け、重点的に事業を実施し、平成28年度に阪急電鉄京都線・千里線交差点以東区間の部分開通を行っており、残りわずかな用地取得および、阪急電鉄との交差点部分の整備を残すのみとなっている。
	定量的効果の具体的な内容	<p>[効果項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通円滑化効果 <ul style="list-style-type: none"> 走行時間短縮便益 走行経費減少便益 交通事故減少便益 ・歩行の安全性と快適性の向上 <p>[受益者]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民 ・道路利用者 ・地域経済 ・地域社会
	費用便益分析 図2参照	<p>[算出方法]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用便益分析マニュアル（平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局）に示された手法に準じて実施 ・道路投資の評価に関する指針（案）（平成12年1月 道路投資の評価に関する指針検討委員会）に示された手法に準じて実施 <p>[分析結果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用便益比 B/C=2.76（総便益B：1,653.11億円、総費用C：599.8億円）
	定性的効果の具体的な内容	<p>[効果項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機能的な道路ネットワークの充実 ・交通流の円滑化に伴う周辺環境の改善 ・災害時における避難路及び延焼遮断帯などの防災空間の確保 ・安全で快適な歩行者空間の確保 ・沿道土地利用の高度化 ・供給処理施設（水道、ガス、電気、下水等）の収容空間の確保 <p>[受益者]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民 ・道路利用者 ・地域社会 ・地域経済
事業の必要性の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・本路線の整備により、大阪北部から都心部を経由せずに大阪東部への道路ネットワークが形成されるとともに、本線周辺で進められている連続立体交差事業や区画整理事業他の都市計画道路事業と一体的に整備を進めることで、さらなるアクセス性の向上や歩行者等の安全・安心な通行空間の確保及び、緊急時の避難路等の確保が図られることから、必要性が非常に高い。 	<p>評価</p> <p>A～C</p>

	事業開始時点 (平成49年3月)	前回評価時点 (平成25年3月)	今回評価時点 (平成30年3月)
経過及び完了予定	事業開始年度 昭和48年度 着工年度 昭和48年度 完了予定年度 昭和52年度	事業開始年度 昭和48年度 着工年度 昭和48年度 完了予定年度 平成30年度	事業開始年度 昭和48年度 着工年度 昭和48年度 完了予定年度 平成39年度
事業規模	用地取得必要面積 36,913㎡ 整備必要面積 44,100㎡	用地取得必要面積 39,114㎡ 整備必要面積 44,100㎡	用地取得必要面積 39,114㎡ 整備必要面積 44,100㎡
うち完了分	-	用地取得済面積 38,379㎡ 整備済面積 26,055㎡	用地取得済面積 38,876㎡ 整備済面積 39,600㎡
進捗率 図3参照	-	用地取得率 98% 工事進捗率 59%	用地取得率 99.4% 工事進捗率 89%
総事業費	46億円	247億円	247億円
うち既投資額	-	232億円	241億円
進捗率 図4参照	-	94%	98%
事業内容の変更状況とその要因	<ul style="list-style-type: none"> ・経済状況の変化 ・事業費の精査 		
未着工あるいは事業が長期化している理由	<ul style="list-style-type: none"> ・用地取得において、近年の下落傾向にある土地価格での売買に難色を示されていることなどで、用地取得が難航し、事業が長期化していた。 ・財政状況が非常に厳しいため、事業中路線においては、選択と集中の観点から、重点的に投資を行う路線として優先的に進め、平成28年度に部分開通を行った。残る、阪急電鉄との交差部の整備には、阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業の高架化が必要である。 		
コスト縮減や代替案立案の可能性	-		
事業の実現見通しの評価	<ul style="list-style-type: none"> ・阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業の高架切り替え後、整備効果の早期発現にむけて、重点的に予算を確保し、集中的に交差部分の整備工事を実施することとしており、平成39年度の完成を見込んでいる。 		評価 A
5 事業の優先度の視点の評価	<p>[重点化の考え方]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得率が高く、阪急電鉄京都線・千里線との交差部を除いては概成済みであり、整備効果の早期発現が見込める路線であることから、「都市計画道路の整備プログラム(H28.9)」において、優先的に整備を進める路線として位置付けている。 <p>[事業が遅れることによる影響]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成39年度の完成に向け計画的に事業実施しており、事業が遅れることはないと考えられる。 ・大阪北部から都心部を経由しない大阪東部への道路ネットワークの形成や、歩行者等の安全安心な通行空間の確保、緊急時の避難路等の確保などの整備効果の発現が遅れる。 		評価 A
6 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度の事業再評価における対応方針は「事業継続(A)」であり、現在、その方針に沿って事業を進め、平成28年度に概成した。 		
7 対応方針(案)	事業継続(A)		
(理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・本路線は、大阪北部から東部への機能的な道路ネットワークを形成し、アクセス性の向上や歩行者等の安全・安心な通行空間及び、緊急時の避難路等の確保が図られることから、事業実施の必要性が高く、事業遅延による影響が大きい。 ・また、周辺では阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業や淡路駅周辺地区土地区画整理事業等を進めており、本路線は、阪急電鉄京都線・千里線との交差部を除いて、概成済みである。 ・阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業による高架切り替え後、速やかに整備効果を発現するためにも、残る用地取得に努め、高架切り替え後、集中的に整備を行い、完了へむけて重点的に事業を実施することとしているため、「事業継続(A)」とする。 		
8 今後の取組方針(案)	今後、阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業による高架切り替え後の、速やかな交差部の整備へ向けて、重点的に事業を実施し、平成39年度の事業完了をめざす。		

図1位置図

対象事業 位置図

凡 例	
■■■■■■■	当該路線
====	事業中区間
————	完成区間
=====	未整備区間
=====	未拡幅区間

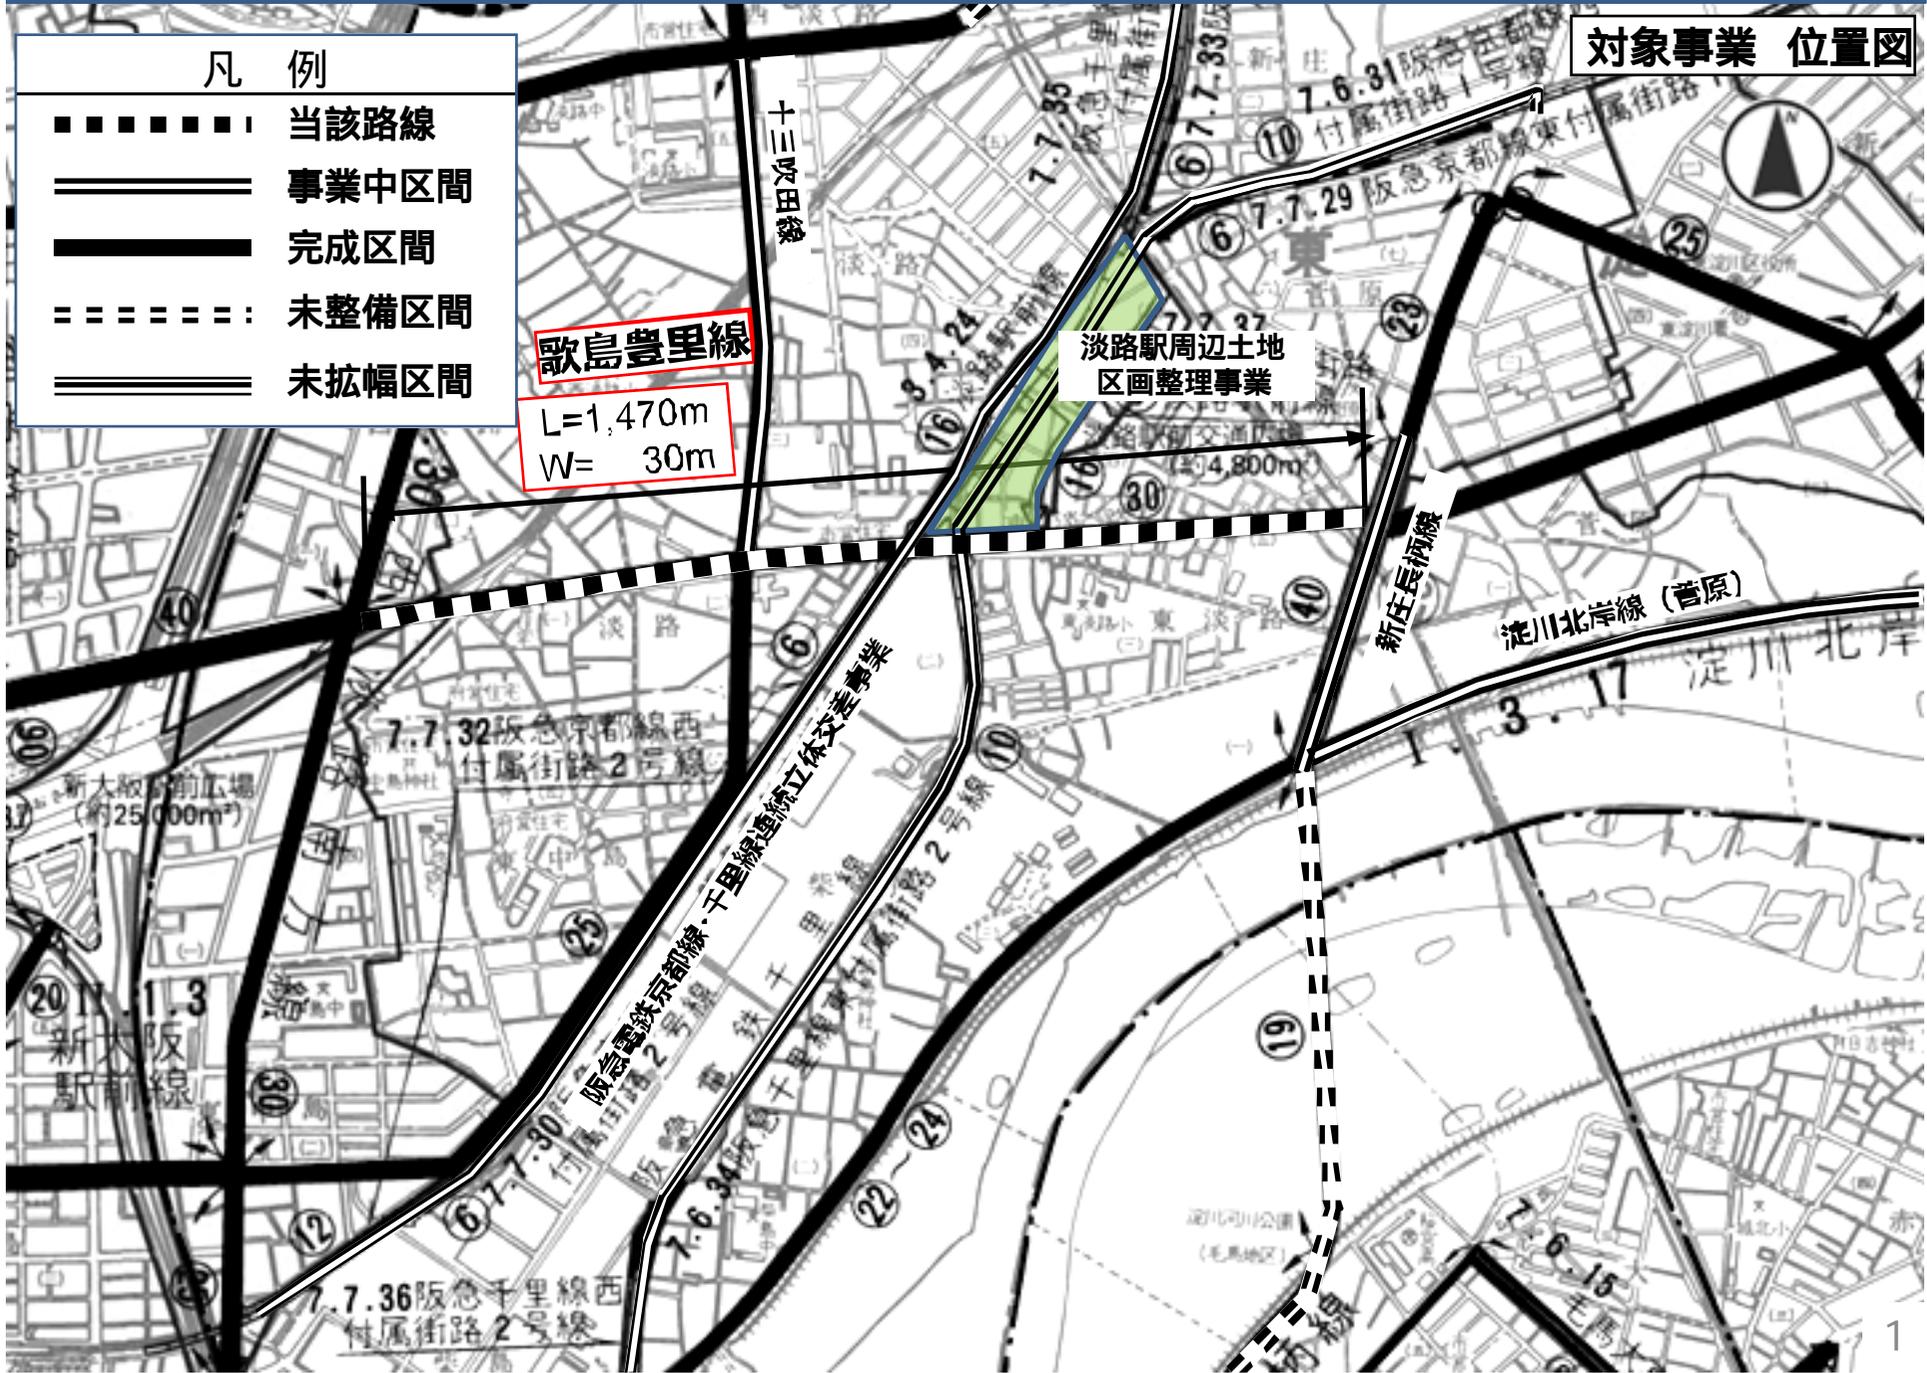


便益 (単位：億円)

走行時間短縮	116.0
走行経費減少	5.0
交通事故減少	-0.1
歩行者快適性向上	1.9
合計(初年度便益)	122.8
便益総額の 現在価値	1,653.1

費用 (単位：億円)

事業費 (単純合計)	247.4
維持管理費 (単純合計)	2.5
投資総額の 現在価値	599.8

社会費用便益比B/C	2.76
------------	------

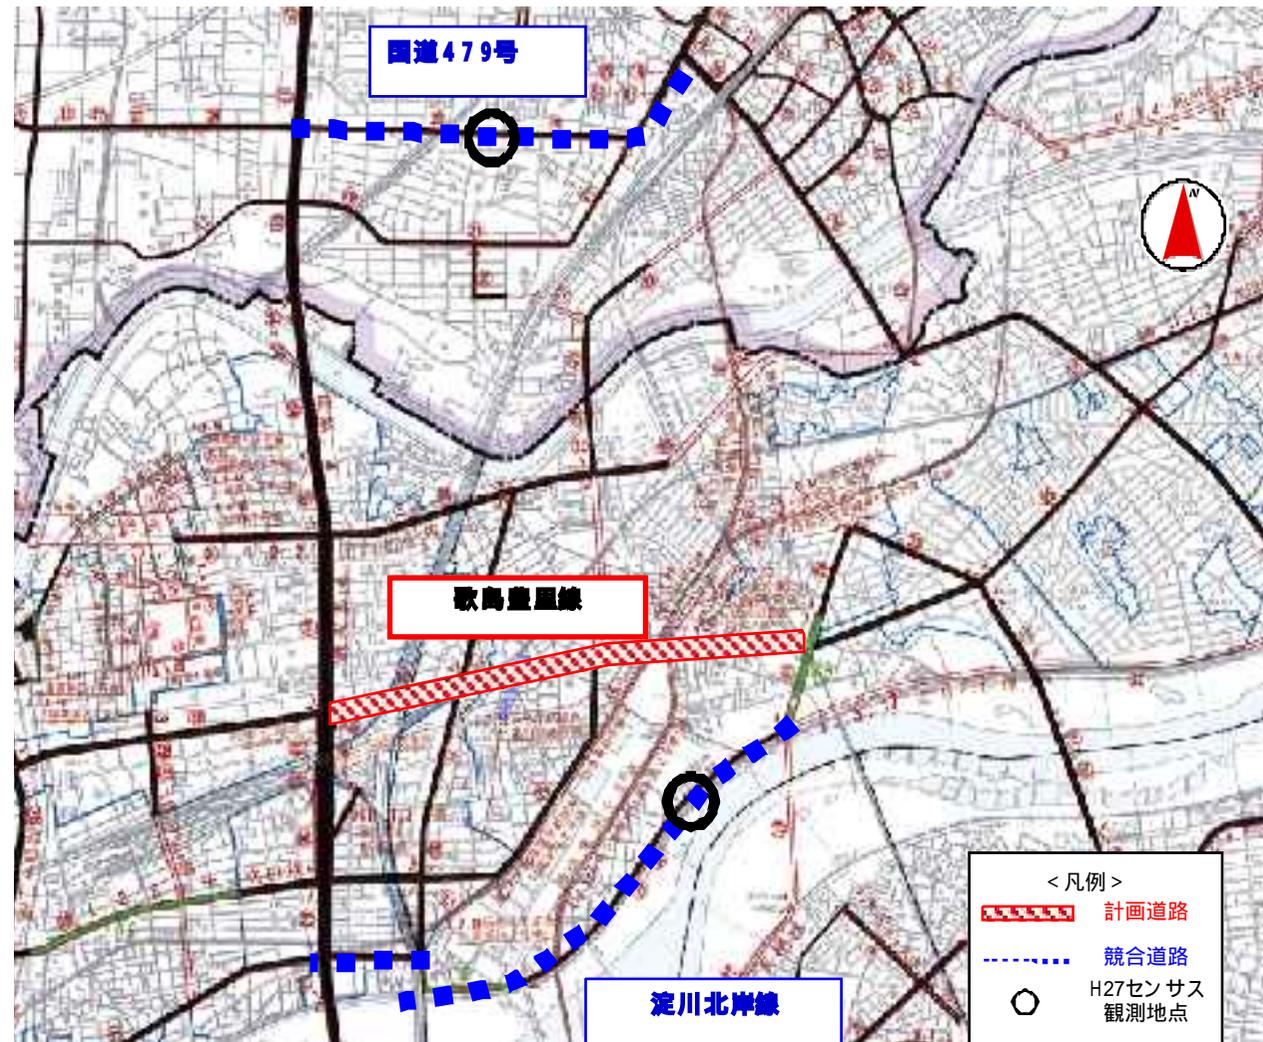


注)便益額、費用額については単位(億円)下一桁を四捨五入しているため、合計値の端数が合致しない場合もある。


図 - 歌島豊里線と競合路線



歌島豊里線 事業中箇所 L=1,470m W=30m

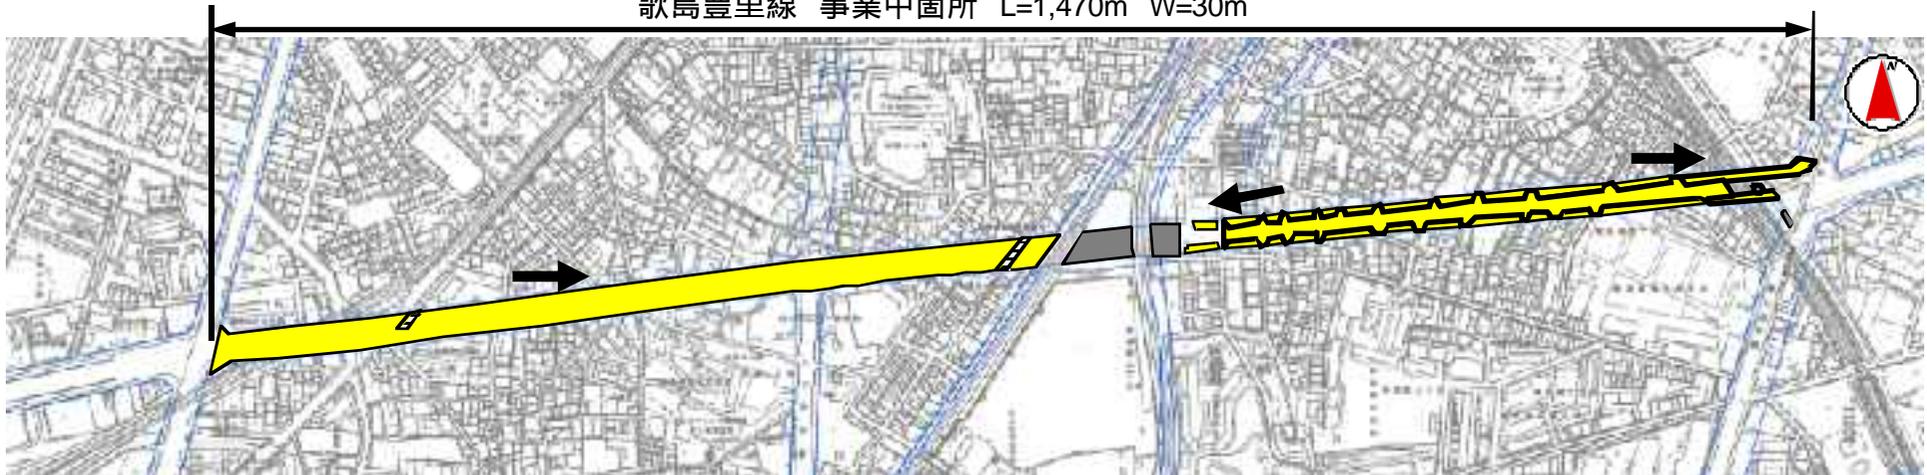


歌島豊里線 標準断面図

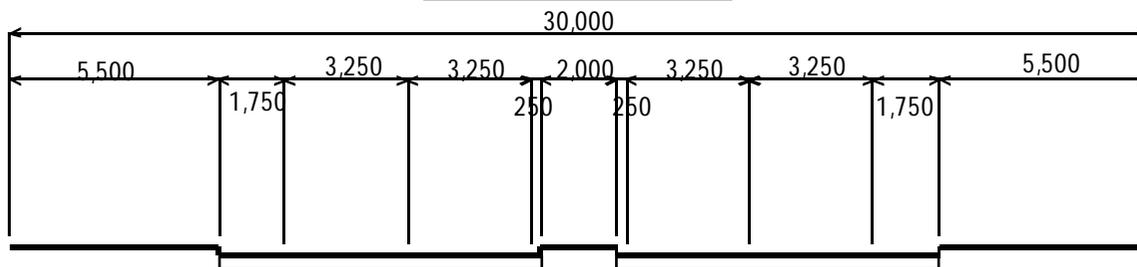

凡 例	
	用地取得済箇所
	整備済箇所
	残用地取得物件
	施工中箇所
	前回評価時(H25)からの進捗箇所

用地取得率：99% (面積ベース)
 工事進捗率：89% (面積ベース)
 事業費ベース進捗率：98%

進捗率の推移 (単位：%)

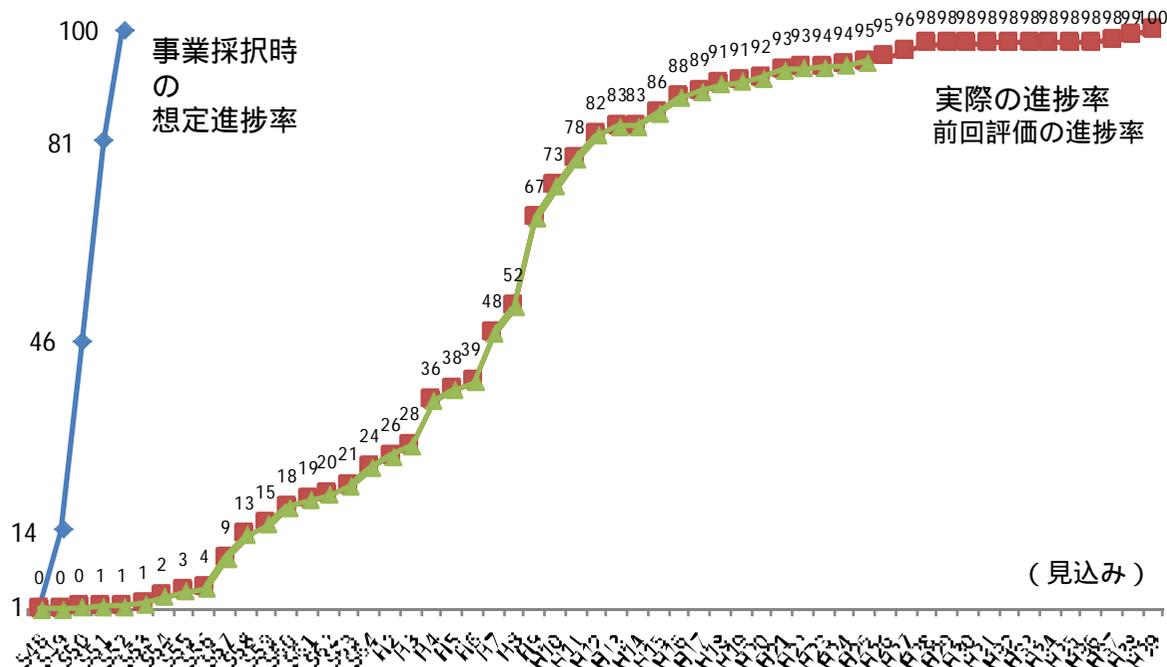

残事業の内容

- 用地取得 3件 (238㎡)
- 道路工事 (延長600m、面積18,045㎡)
- 残事業費約6億円

今後のスケジュール (見込み)

- 平成39年度 事業完了予定

事業が遅延した原因とその状況

- 用地取得において、近年の下落傾向にある土地価格での売買に難色を示されていることなどで、用地買収が難航し、事業が長期化していた。

対応と解消の目途及びその根拠

- 本路線は、用地取得の難航により事業が長期化していたが、用地取得の目途も立っており、局運営方針においても重点整備路線と位置付け、重点的に財源を確保している。そのため、用地取得が終われば集中的に工事を実施し、今年度での概成を見込んでいる。また、残る区間についても、連続立体交差事業の進捗に合わせ、平成39年度の完成を見込んでいる。
