

令和5年度大阪市建設事業評価有識者会議 事業再評価対象事業一覧表

【資料4-1】

番号	事業名	所管局	事業再評価理由 [回数] ※1	前回全体事業費 (億円) ※2	事業開始年度	前回対応方針	a	b	c		d	e	備考（a～eの補足等）
							対応方針 (案)	B/C	事業進捗率		全体事業費の増減の有無 (増減額)	完了年度延長の有無 (完了年度)	全体事業費の増減理由 完了年度の延長理由 対応方針の変更理由等
									前回評価時の事業進捗率 (事業費ベース)	現在の事業進捗率 (事業費ベース)			
1	[街路事業] 東野田河堀口線（大手前）整備事業	建設局	③ [5回目]	22	S56	継続B	第2回・第3回有識者会議にて公表		64%	61%	有 22億円⇒26億円	有 R6⇒R10	[全体事業費の増減理由] 道路工事における事業費の精査の結果 [完了年度の延伸理由] 用地取得の遅れのため
2	[街路事業] 尼崎平野線（山王）整備事業	建設局	③ [5回目]	47	S50	継続A			48%	50%	有 47億円⇒48億円	有 R7⇒R12	[全体事業費の増減理由] 道路工事における事業費の精査の結果 [完了年度の延伸理由] 用地取得の遅れのため
3	[街路事業] 豊里矢田線（鳴野・蒲生）整備事業	建設局	③ [5回目]	150	S61	継続B			67%	68%	無	有 R9⇒R11	[完了年度の延伸理由] 用地取得の遅れのため
4	[街路事業] 正連寺川北岸線（伝法・伝法東）整備事業	建設局	③ [5回目]	68	H1	継続C			41%	48%	有 68億円⇒61億円	無	[全体事業費の増減理由] 用地補償費及び道路工事費の精査の結果
5	[街路事業] 尼崎堺線（住之江）整備事業	建設局	③ [5回目]	12	H6	継続B			64%	59%	有 12億円⇒13億円	有 R6⇒R7	[全体事業費の増減理由] 道路工事における事業費の精査の結果 [完了年度の延伸理由] 用地取得の遅れのため
6	[街路事業] 正連寺川歩行者専用道整備事業	建設局	③ [3回目]	23	H15	継続B			62%	70%	有 22.9億円⇒22.4億円	有 R7⇒R12	[全体事業費の増減理由] 道路工事における事業費の精査の結果 [完了年度の延伸理由] 先行工事の遅れによる
7	[公園整備事業] 正連寺川公園整備事業	建設局	② [3回目]	67	S62	継続B			31.0%	39.0%	有 67億円⇒71億円	有 R7⇒R12	[全体事業費の変更理由] 正連寺川公園と交差する正連寺川の各橋梁について、橋梁構造から盛土構造に変更したため。 [完了年度の延長理由] 事業施工期間について下水道事業及び街路事業と一体で整備を行うものであるが、橋梁の盛土工事等によるポンプ場関連工事や基盤整備等に時間を要したために、当初計画していた事業計画全体の遅れに伴い、R7年度の完了が困難となったため。
8	[下水道事業] 大阪市公共下水道事業 （抜本的浸水対策事業）	建設局	③ [5回目]	9,600	S56	継続B			72%	74%	無	無	
9	[住宅事業] 市営住宅建替事業 （大阪市地区地域居住機能再生推進事業）	都市整備局	①③ [2回目]	1,880	H28	継続A			【前計画（H28～R7）】				令和3年3月に「大阪市営住宅ストック総合活用計画」の見直しを行っており、前回評価時（H30年度）の計画（H28～R7）と現行計画（R3～R12）それぞれの進捗状況等を示す。
									18.2%	57.8%	有 1,880億円 ⇒2,202億円	—	
									【現行計画（R3～R12）】				
								—	15.1%	有 2,665億円 ⇒2,824億円	—		
10	[新大学キャンパス整備事業] 新大学キャンパス整備事業	経済戦略局	⑤ [1回目]	918	R1	—	継続B			12%			

※1 再評価理由の番号については、次のとおり

【国庫補助事業】

①所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

【①以外で市が事業主体である事業】

- ②事業開始年度から起算して5年目の年度において、未着工または継続中の事業（令和元（平成31）年度に事業開始分）
③事業再評価を実施した年度から5年目の年度において、なお未着工または継続中のもの（平成30年度に事業再評価実施分）
④事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業（令和6年度に再開を予定している事業）
⑤その他市長が特に必要と認めるもの

※2 初回の再評価の場合は、事業開始時の全体事業費を表示しています

位置図
(番号①～⑦)



①[街路事業]
東野田河堀口線(大手前)整備事業
(所管局:建設局)


④[街路事業]
正蓮寺川北岸線(伝法・伝法東)整備事業
(所管局:建設局)

②[街路事業]
尼崎平野線(山王・山王西)整備事業
(所管局:建設局)

⑤[街路事業]
尼崎堺線(住之江)整備事業
(所管局:建設局)

③[街路事業]
豊里矢田線(鳴野・蒲生)整備事業
(所管局:建設局)

⑥[街路事業]
正蓮寺川歩行者専用道整備事業
⑦[公園整備事業]
正蓮寺川公園整備事業
(所管局:建設局)

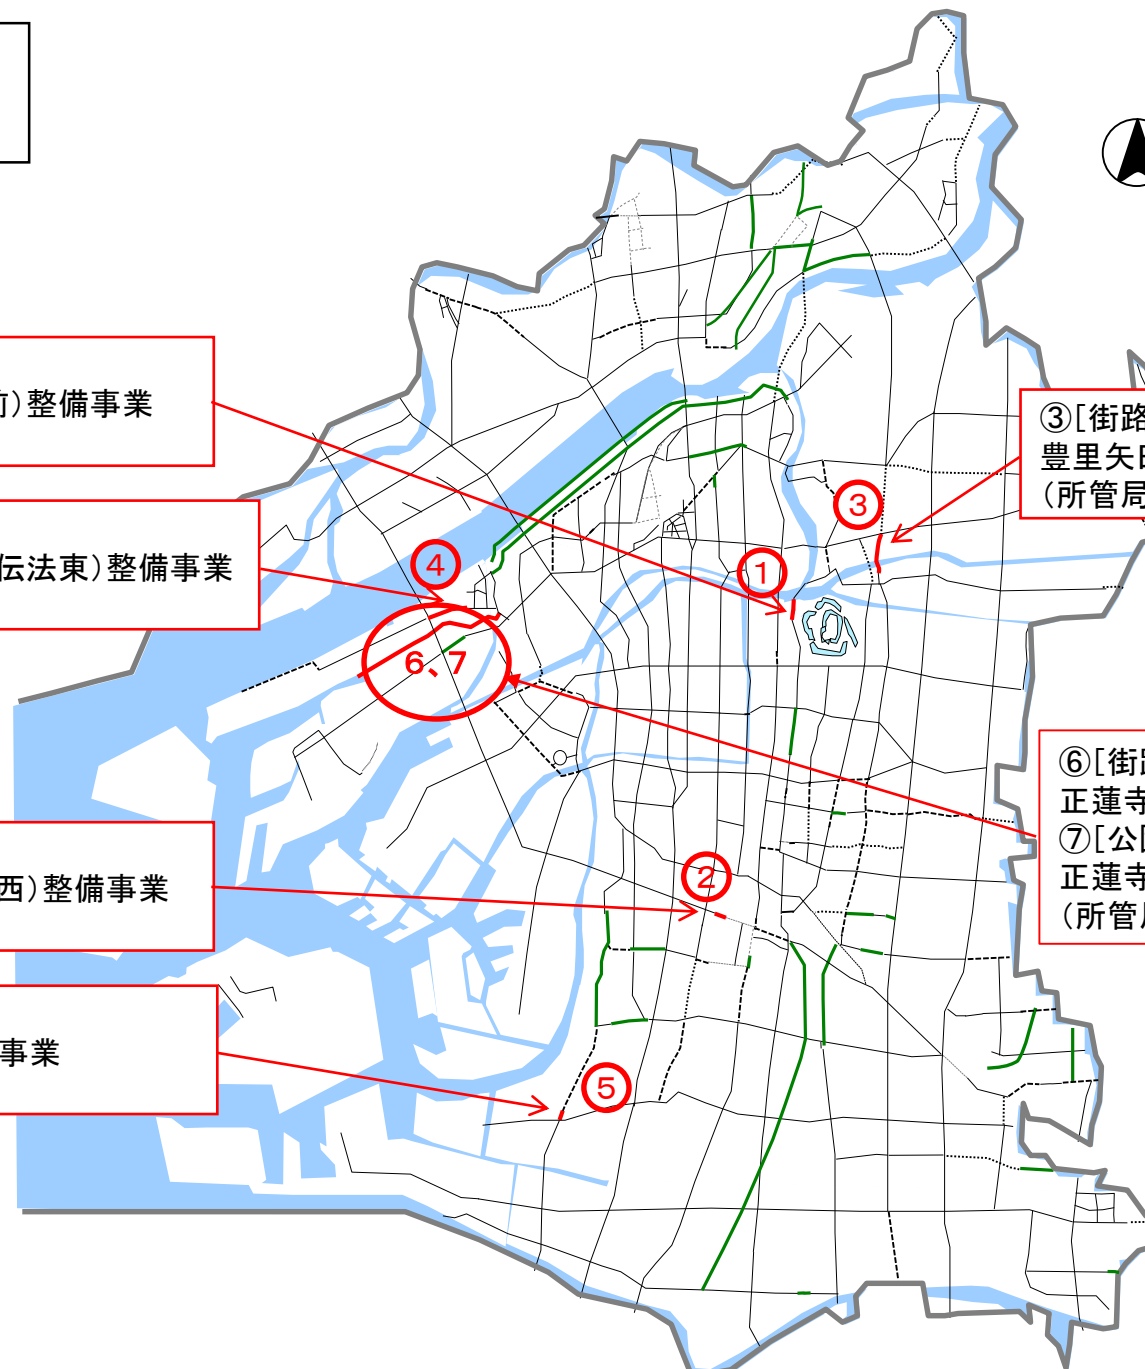

⑧[下水道]大阪市公共下水道事業（抜本的浸水対策事業）


主要下水道幹線 目標延長 約156km
 主要ポンプ場 目標排水能力 約770m³/s

位置図 (番号⑧)

	令和4年度末施工済み路線
	令和5年度以降施工路線
	河川地下放水路計画路線 ( 平野川調節池)



位置図 (番号⑨)

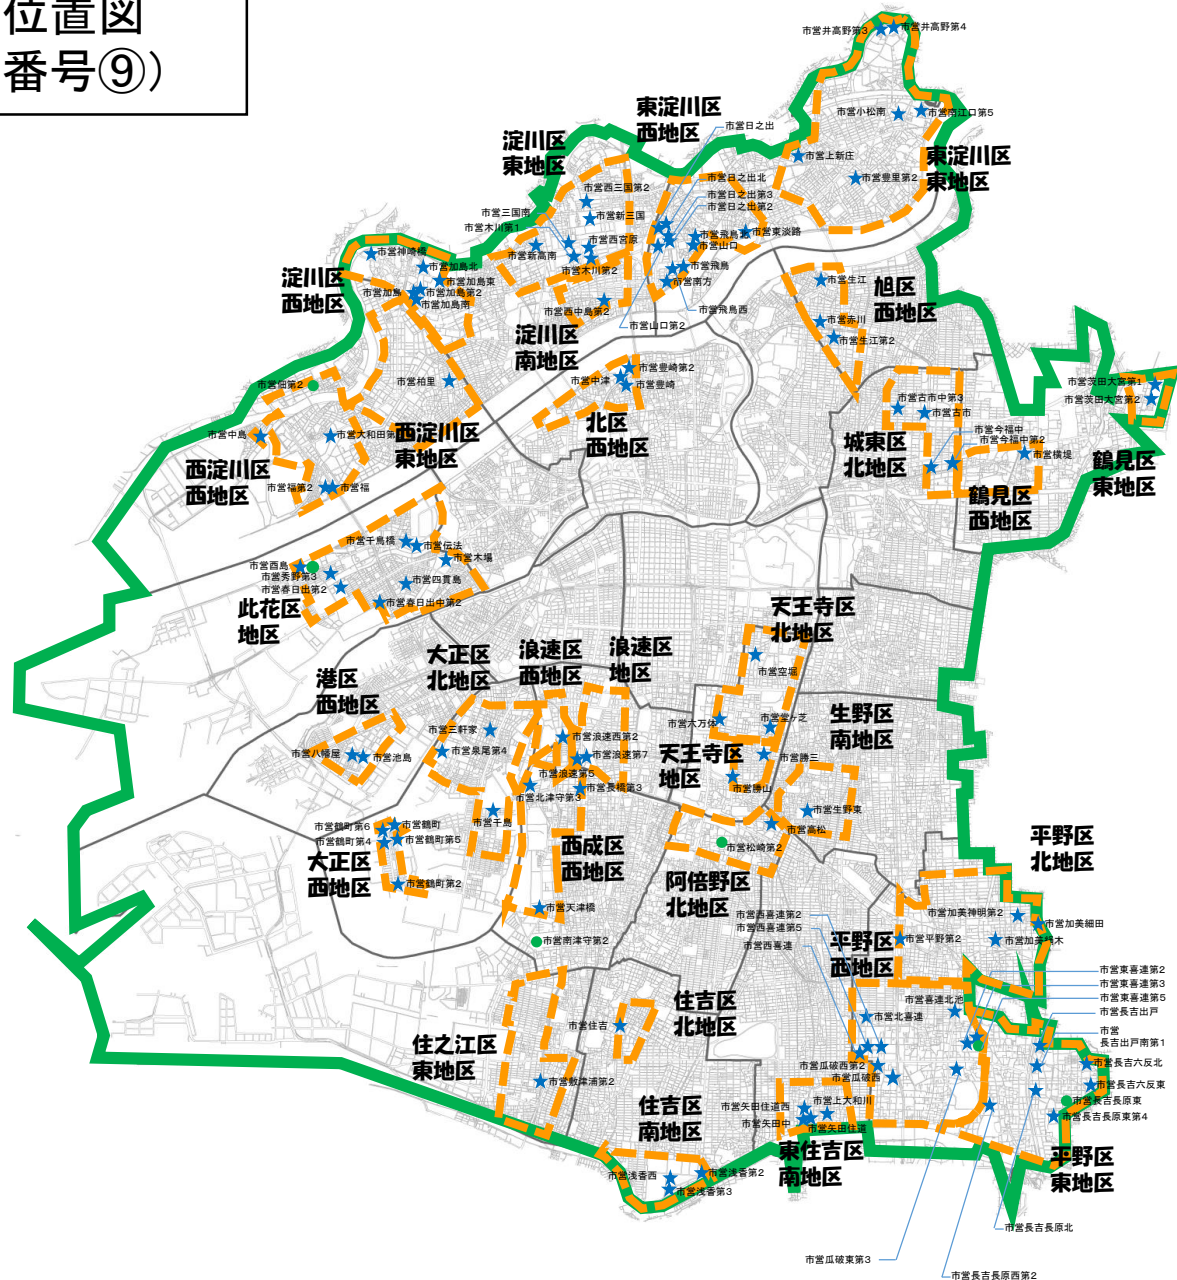

[住宅事業]

⑨

市営住宅建替事業

(大阪市地区地域居住機能再生推進事業)

地区凡例



整備地区



重点整備地区

住宅凡例



市営住宅(旧府営住宅を含む)
(建替)



市営住宅
(地域リノベーション)

※公営住宅等の建替に伴う
従前居住者向けの仮転用住宅

位置図
(番号⑩)

⑩[大学整備事業]
新大学キャンパス整備事業

森之宮キャンパス

阿倍野キャンパス

中百舌鳥キャンパス

杉本キャンパス

堺市

