

## 工事に係る環境モニタリング調査（騒音・振動・排水）結果について

## 1 工事騒音について

（単位：dB(A)）

	測定場所	東区画東面	東西間	測定日
作業内容	杭打工事	64～70	66～75	2月23・24日、3月10・16日
	掘削工事	64	70	3月22日
	躯体工事	60～62	62～63	4月15・27日、5月28日
	鉄骨、躯体工事	62～65	66～71	6月17日、7月15日、8月19日
	内外装工事・機器据付等	68	72	9月20日

騒音規制法特定建設作業騒音に係る規制基準：85dB(A)

約10分間の連続測定データから算出（90パーセントレンジの上端値）

## 2 工事振動について


（単位：dB）

	測定場所	東区画東面	東西間	測定日
作業内容	杭打工事	45～47	48～53	2月23・24日、3月10・16日
	掘削工事	43	50	3月22日
	躯体工事	31～36	36～39	4月15・27日、5月28日
	鉄骨、躯体工事	35～36	36～39	6月17日、7月15日、8月19日
	内外装工事・機器据付等	38	41	9月20日

振動規制法特定建設作業振動に係る規制基準：75dB

約10分間の連続測定データから算出（80パーセントレンジの上端値）


（測定位置図）

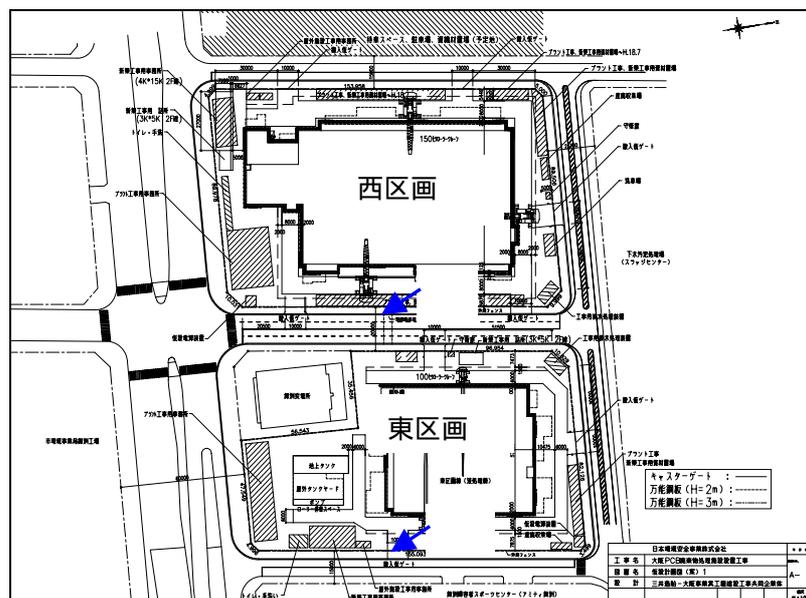



# 工事用車両予定・実績一覧表(1日平均台数)

H17年9月30日現在

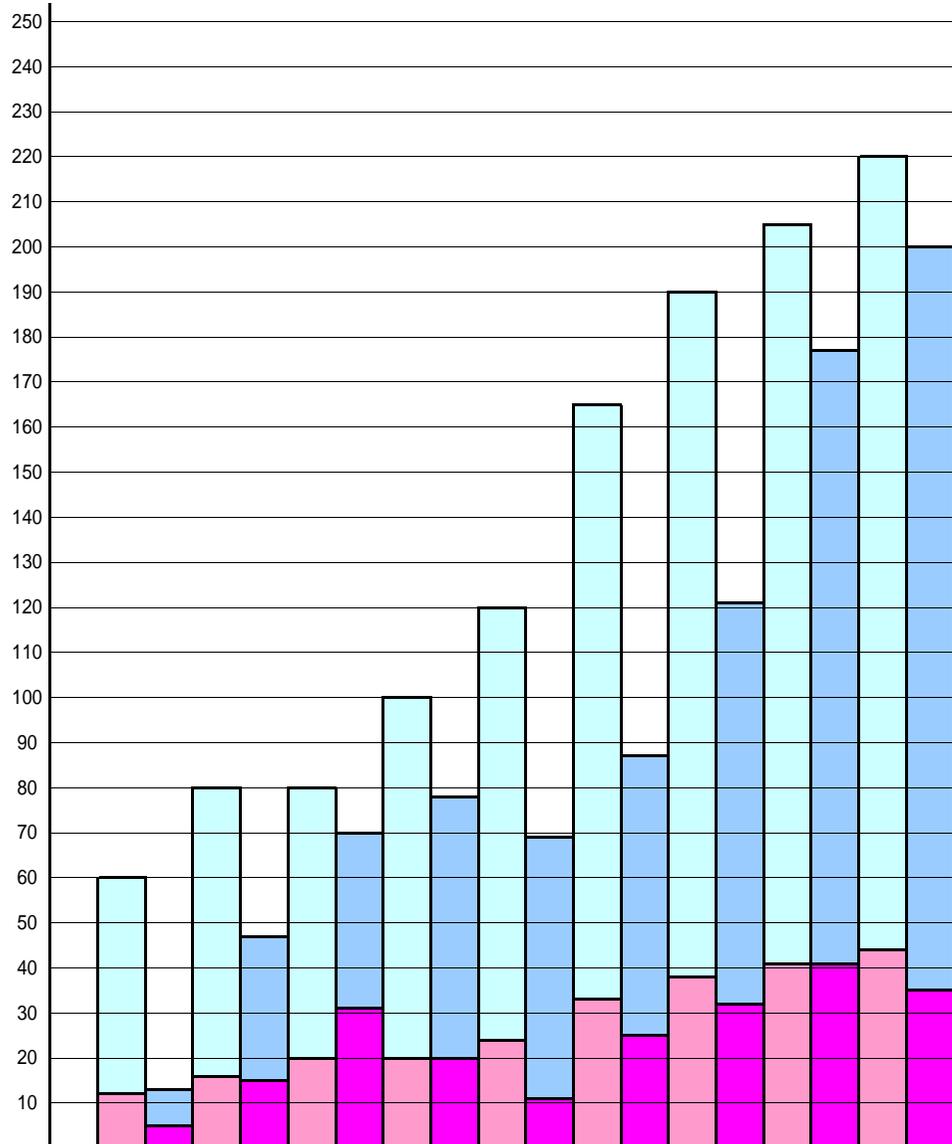

高速	48	8	64	32	80	39	80	58	96	58	132	62	152	89	164	135	176	165	168	156	152	108	88	48	40	40	28	28										
一般	12	5	16	15	20	31	20	20	24	11	33	25	38	32	41	41	44	35	42	39	38	27	22	12	10	10	7	7										
合計	60	13	80	47	100	70	100	78	120	69	165	87	190	121	205	176	220	200	210	0	195	0	190	0	135	0	110	0	60	0	50	0	50	0	35	0	35	0
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績		
	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月	
