

平成30・31年度 下水道工事計画について

1. 事業概要

【 島屋北幹線】

- 1 事業概要 本事業は、此花区の浸水対策の一環として、下水道幹線を新設するものである。
- 2 工事名称 島屋北幹線下水管渠築造工事
- 3 工事場所 此花区 島屋1丁目～2丁目
- 4 工 期 平成30年8月中旬～平成34年3月下旬(予定)
- 5 工事概要

<ol style="list-style-type: none"> 1) 推進工 内径3,000mm 延長約280m 2) 開削工 内径3,000mm 延長約 80m 3) 立坑工 発進立坑1箇所 4) 特殊マンホール工 1箇所 5) 工事車両搬入路設置 1箇所(北港新橋南東角) 図 参照 6) 汚染土対策工事 図 参照 	}	図 参照
--	---	------

【 桜島～西島幹線】

- 1 事業概要 本事業は、正蓮寺川総合整備事業計画の一環として、本市恩貴島抽水所の廃止に伴い下水道幹線を新設するものである。
- 2 工事名称 桜島～西島幹線下水管渠築造工事
- 3 工事場所 此花区 春日出北2丁目～3丁目
- 4 工 期 31年度 工事予定
- 5 工事概要


詳細については、実施計画決定後に説明します。

下水道工事計画 工程表

工事名称	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
平成30年度 工事 島屋北幹線 下水管渠築造工事	立坑工 (発進)				
	推進工(障害物切削含む)			特殊 マンホール工	後片 付け
	開削工				
平成31年度 工事予定 桜島～西島幹線 下水管渠築造工事		詳細未定			
島屋北幹線 桜島～西島幹線		工事車両搬入路設置 汚染土対策工事			
此花下水処理場 ポンプ場築造			土木・建築・設備工事		平成34年度末 通水予定 ●

2. 計画位置図

【資料5】
正蓮寺川・六軒家川環境整備推進協議会
平成30年5月30日(水)

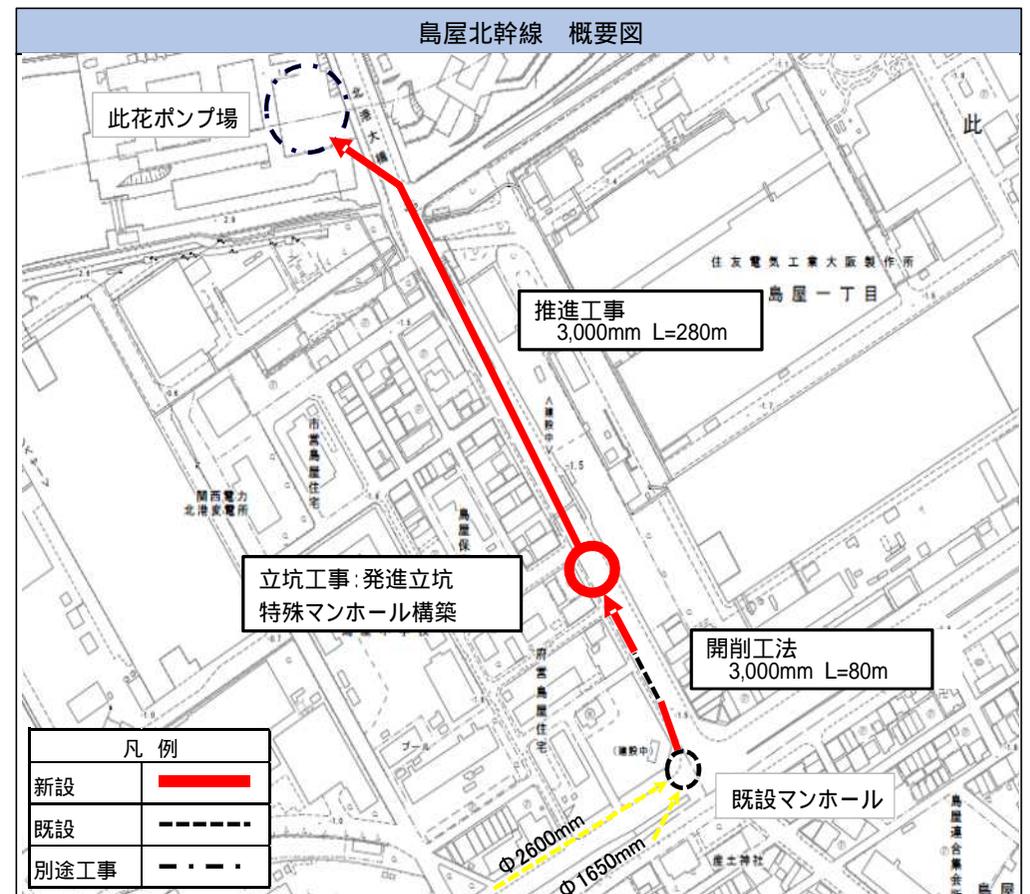


桜島～西島幹線 位置図




詳細については決定後説明

汚染土対策工事


封じ込め範囲 位置図

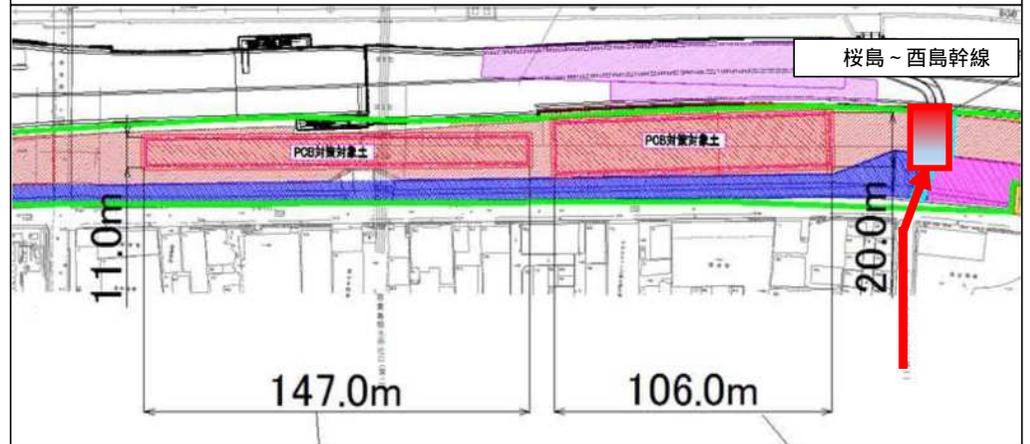

封じ込め断面図

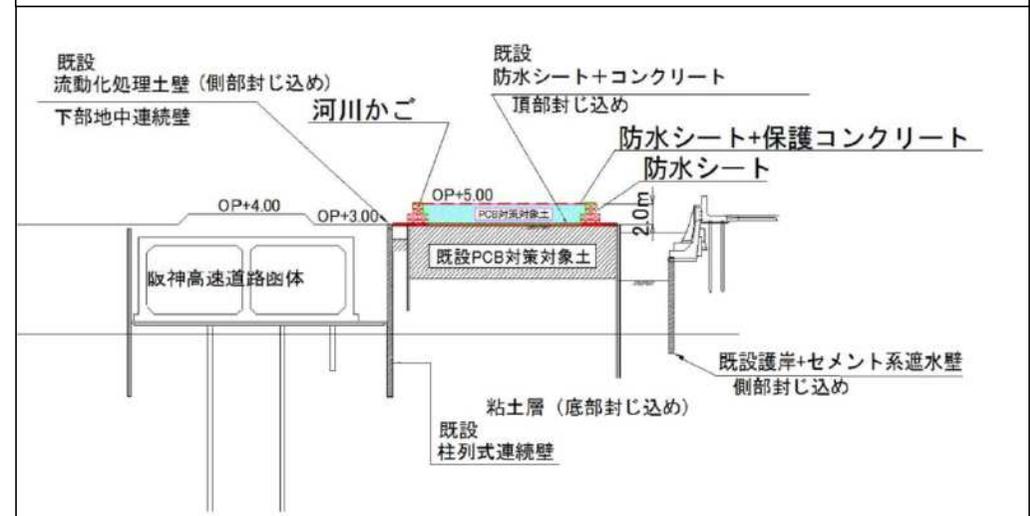

工事車両搬入路 概要図 (北港新橋)

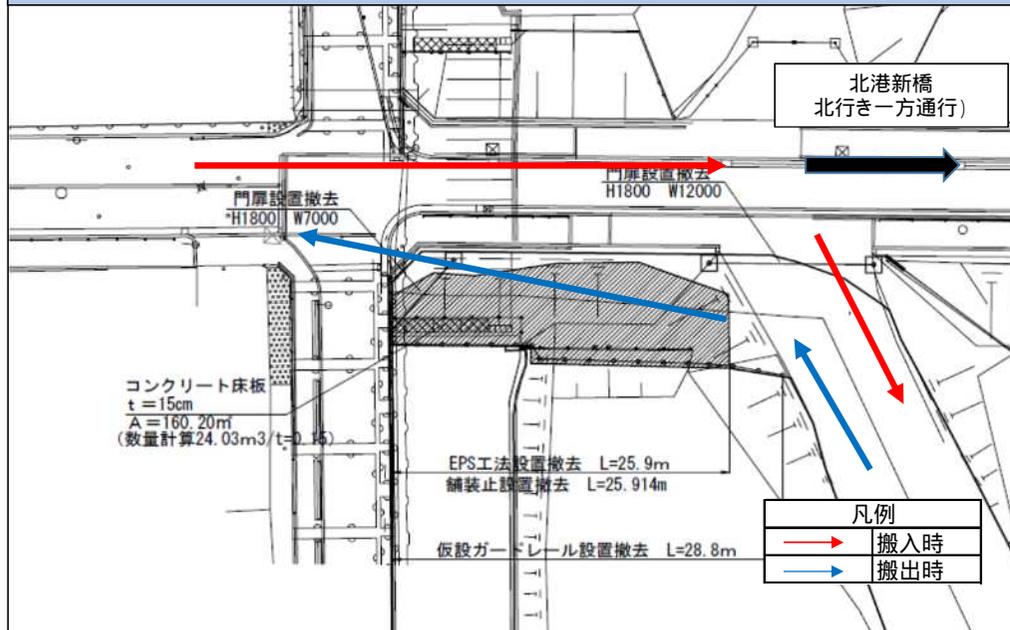

凡例

- 搬入時
- 搬出時

平成30～31年度下水道工事計画にて発生する汚染土については、桜島～西島幹線接続箇所付近に封じ込め施設を新たに設け汚染物質が拡散しないよう対策を講じる。対策方法は、これまでの正蓮寺川総合整備事業にて実施してきた封じ込め対策と同様とする。

上記方法での汚染物質の拡散を防止するとともに、工事実施時には環境監視として、河川水質調査・地下水調査・大気調査・水生生物調査を実施する。
