


表一3. 悪臭、騒音・振動

棟名		測定項目			結果		維持管理値		自主管理目標値	
東西棟	騒音	騒音レベル	東	朝	55	dB	60	dB	-	
				昼間	58		65			
				夕	57		60			
				夜間	46		55			
			西	朝	53		60			
				昼間	59		65			
				夕	52		60			
				夜間	49		55			
			南	朝	57		60			
				昼間	60		65			
				夕	56		60			
				夜間	50		55			
			北	朝	57		60			
				昼間	62		65			
				夕	54		60			
				夜間	51		55			
	振動	振動レベル	東	昼間	32	dB	65	dB	-	
				夜間	31		60			
			西	昼間	<30		65			
				夜間	<30		60			
			南	昼間	36		65			
				夜間	30		60			
			北	昼間	31		65			
				夜間	<30		60			
敷地境界 悪臭	臭気指数	東	<10		10		-			
		西	<10							
	アセトアルデヒド	東	0.003 ppm	0.05 ppm	-					
		西	<0.002 ppm							
	トルエン	東	<0.9 ppm	10 ppm	-					
		西	<0.9 ppm							
西棟	真空加熱分離装置	アセトアルデヒド			0.02 ppm	-	-	0.1 ppm		
	排気口	トルエン			0.1 ppm	-	-	0.1 ppm		
	西No.2(P0402)	臭気排出強度			220 m³N/min	25 × 10 ⁶ m³N/min		-	-	

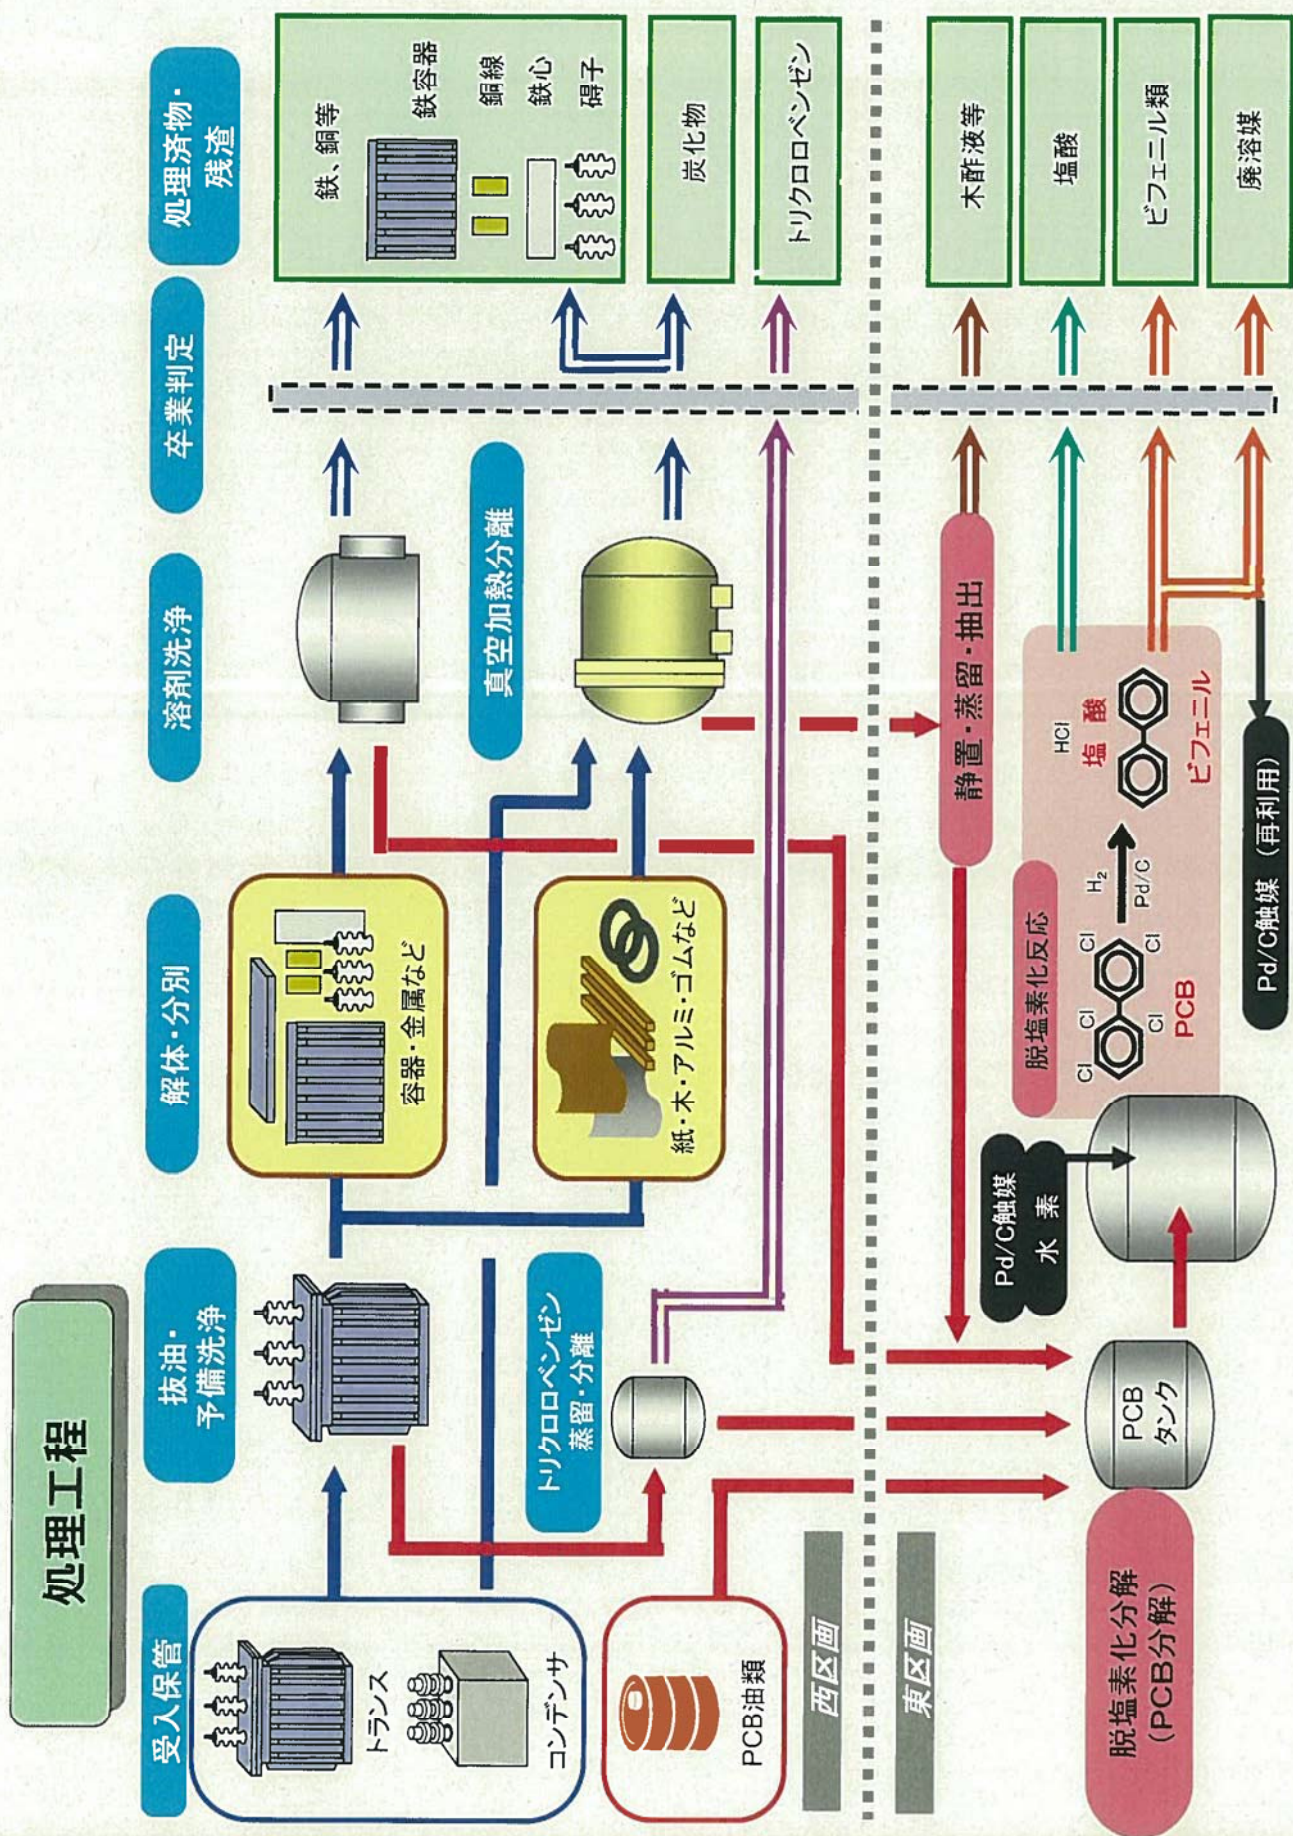

※Pd/C触媒とは活性炭の表面にパラジウムという金属を付着させたものです。

シンク、排水処理設備、雨水排水溝活性炭設置状況



シンク活性炭(250g)



シンク活性炭(500g)



排水処理設備活性炭(1Kg)
(設置前)



排水処理設備活性炭(1Kg)
(設置後)



雨水排水溝活性炭 (10Kg)



雨水排水溝活性炭 (10Kg)



雨水排水溝活性炭 (10Kg)



雨水排水溝活性炭 (10Kg)

設置の方法

1. 各シンクは活性炭を250g～500g設置した。
2. 排水処理設備は西棟、東棟共活性炭を1Kg設置した。
3. 雨水排水溝は油水分離槽手前の会所でそれぞれ活性炭を10Kg設置した。
