1回浸水した地区における進捗状況

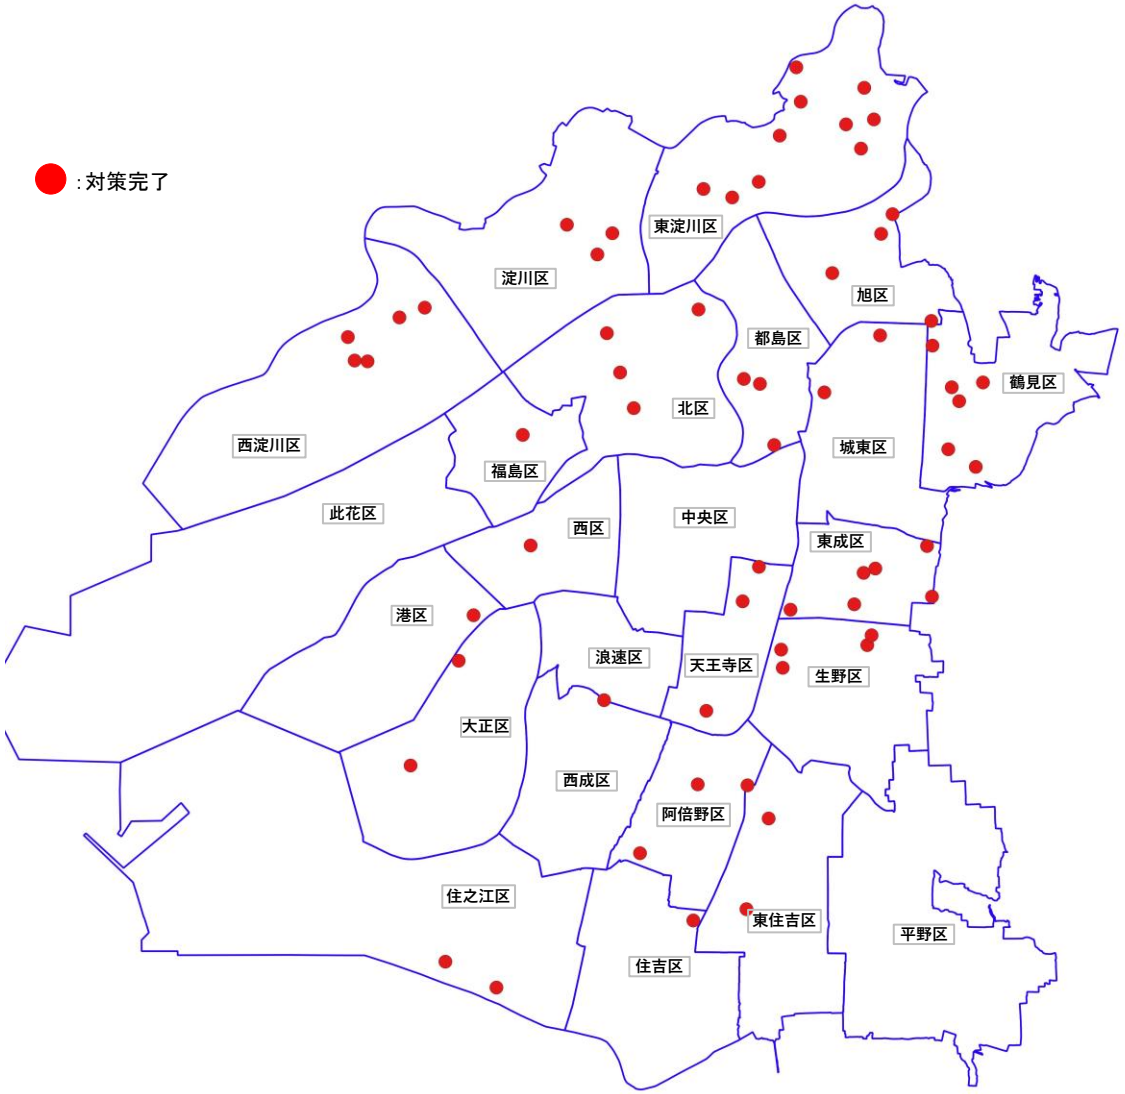

面の対策

行政区	対策地区	進捗状況			（単位：地区）
		完了	主な対策事業	事業中	主な対策事業
旭区	6	4	枝線管渠のネット化、逆止弁	2	貯留施設布設
城東区	2	2	枝線管渠のネット化、バイパス管の布設		
都島区	3	3	枝線管渠のネット化、分水人孔		
鶴見区	6	6	バイパス管の布設、逆止弁		
天王寺区	4	3	枝線管渠のネット化、バイパス管の布設	1	枝線管渠のネット化
東成区	8	6	枝線管渠のネット化	2	枝線管渠のネット化
西区	2	1	バイパス管の布設	1	バイパス管の布設
浪速区	3		バイパス管の布設	3	バイパス管の布設
西成区	2	1	バイパス管の布設	1	バイパス管の布設
港区	1	1	バイパス管の布設		
大正区	2	2	バイパス管の布設		
阿倍野区	2	2	貯留管布設		
東住吉区	4	3	バイパス管の布設	1	バイパス管の布設
住吉区	1	1	バイパス管の布設		
住之江区	2	2	パイパス管の布設、逆止弁		
北区	6	4	バイパス管の布設	2	枝線管渠のネット化
福島区	2	1	バイパス管の布設	1	バイパス管の布設
淀川区	4	3	バイパス管の布設	1	貯留施設布設
東淀川区	14	10	枝線管渠のネット化、バイパス管の布設	4	貯留施設布設
生野区	5	4	枝線管渠のネット化、逆止弁	1	増径布設替
西淀川区	9	5	バイパス管の布設	4	貯留施設布設
合計	88	64		24	

※地下埋設物の関係で、対策内容については変更になる場合があります。
※令和元年に発生した浸水地区1地区を含む
※令和元年までに対策が完了している9地区を含む

令和7年3月末現在

	～R1年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末（予定）
工事発注	9地区 / 9地区	1地区 / 79地区	10地区 / 79地区	30地区 / 79地区	75地区 / 79地区	79地区 / 79地区	79地区 / 79地区
工事完成	9地区 / 9地区	0地区 / 79地区	1地区 / 79地区	9地区 / 79地区	27地区 / 79地区	55地区 / 79地区	79地区 / 79地区
