
# 「なにわ大放水路」雨水ポンプ停止に関する取組について（案）

建設局
R8.11作成

## ○排水機能の回復

※水没したポンプ６台をオーバーホールにて復旧する取組工程を
示しており、今後の復旧状況等により、変更となる可能性がある。

緊急対策（本復旧までの大雨への備え）
本復旧（完全な排水機能の回復）
出水期（６/１－１０/３１）

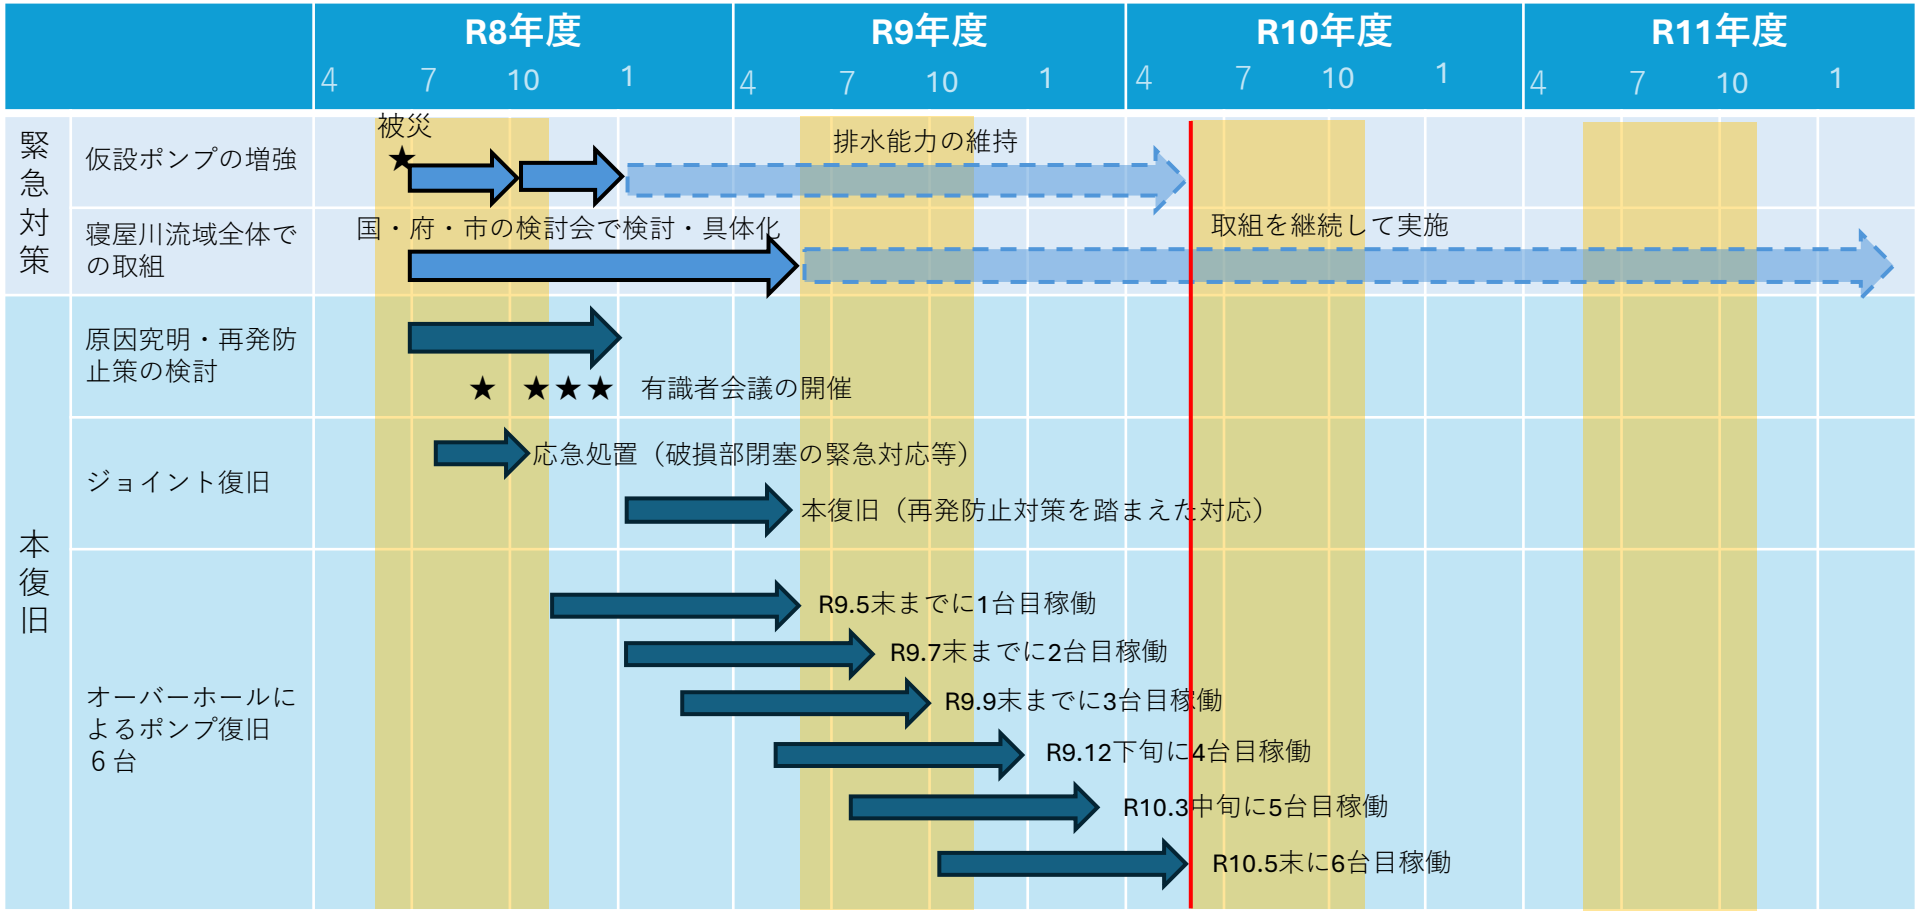


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水能力（m³/分） | ― | 32 | 118 | 138 | 874 | 1,609 | 2,323 | 3,059 | 3,794 | 4,500 |
| 30万m³排水日数 | | 約7日 | 約2日 | 約1.5日 | 約6時間 | 約3時間 | 約2時間 | 約1.6時間 | 約1.3時間 | 約1.1時間 |

※本工程は仮設・付帯設備の復旧は除く。
