〈令和４年度の実績〉

・埋設管工事(上下水道等のライフライン工事)や、使用収益開始に向けた整地工事等を行ないました。

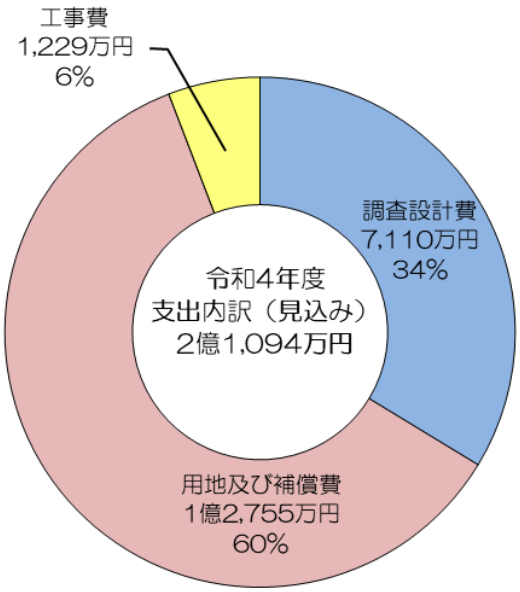

〈令和５年度の事業方針〉

・地区東エリアの使用収益開始の推進。

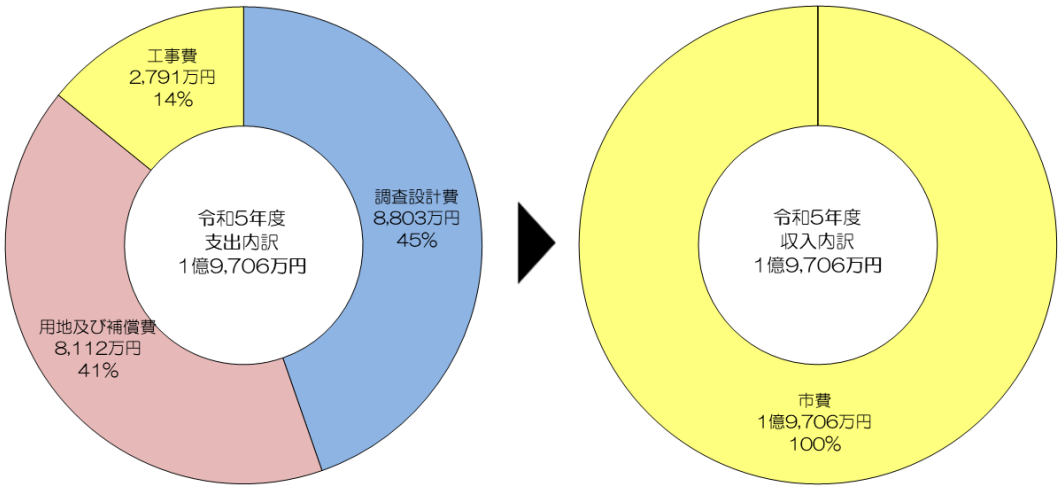

〈令和５年度の計画値〉

・埋設管工事：73m

〈主な取り組み〉

・地区東エリアのインフラ整備

＜令和５年度の整備等予定＞

大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業
令和５年度道路整備等工事予定箇所図

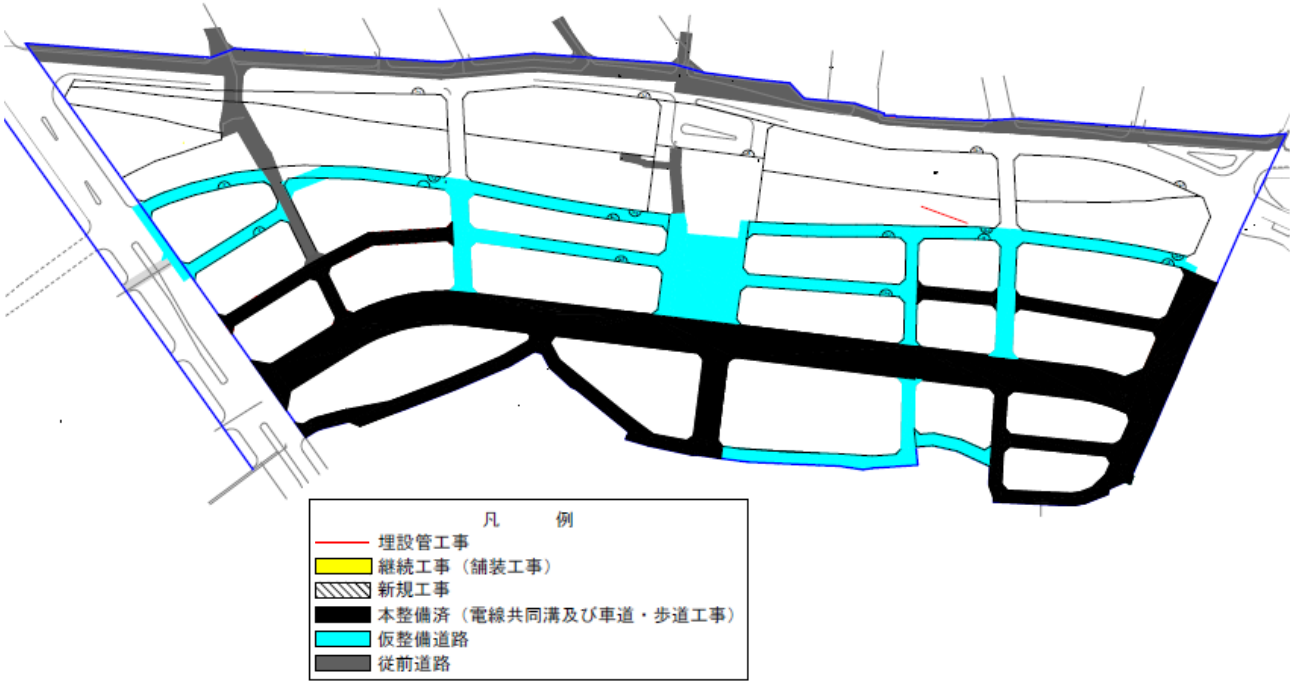

〈現況写真〉

①②　淡路駅前交通広場（H28 年度に仮舗装）
③　　東淡路商店街
④　　阪急付属街路淡路駅前線（H26 年度に仮舗装）
⑤⑥　都市計画道路淡路駅前線　舗装新設及び電線共同溝工事箇所（R 元年度完了）
⑦　　都市計画道路淡路駅前線　舗装新設及び電線共同溝工事箇所（H29 年度完了）
⑧　　区画道路 7 号線（R2年度完了）
⑨　　区画道路 9 号線（R 元年度完了）
⑩　　都市計画道路淡路駅前線　舗装新設及び電線共同溝工事箇所（R元年度完了）

① 平成 16 年３月現在の状況　駅前交通広場予定地

①’現在の整備状況（令和５年４月）　駅前交通広場仮整備

②’現在の整備状況（令和５年４月）　駅前交通広場への区画整理事業用掲示板の設置

②’現在の整備状況（令和５年４月）　駅前交通広場への区画整理事業用掲示板の設置

③ 平成２５年１０月時点の状況　　東淡路商店街

③’現在の整備状況（令和５年４月）　東淡路商店街

④ 平成 24 年９月現在の状況　阪急付属街路淡路駅前線予定地

④’現在の整備状況（令和５年４月）阪急付属街路淡路駅前線仮舗装

⑤ 平成 19 年 7 月現在の状況　都市計画道路淡路駅前線予定地

⑤’ 現在の整備状況（令和 5 年 4 月）　都市計画道路淡路駅前線
