


## 短期整備事業計画の進捗状況等について

資料2-1

## 委員意見と今後予定・所見

| 整備目的              |                          |                            |    | 整備内容               | 地区区分   | 進捗状況・所見（R7年度末）                                                                                              | 課題点等              | R8年度(2026)         | R9年度(2027)                                                      | 第2回会議意見                                                                                    | 今後予定・所見※今年度協議すべき課題追記                                           |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|----|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (1)               | 1) 特別史跡大坂城跡の本質的価値に関連する整備 | i) 豊臣期石垣公開に関連する            | ①  | 豊臣期石垣公開施設整備（観光課）   | 本丸地区   | ・令和7年4月 大阪城豊臣石垣館をオープン<br>・豊臣期石垣公開事業の事業報告書を作成（R7補助事業）<br>・豊臣石垣の保存管理について検討する「豊臣石垣保存管理検討会議」を立ち上げ今年度会議を開催       | ・豊臣石垣を適切に保存管理していく | 石垣モニタリング調査・来館者動向調査 |                                                                 | 【今後の豊臣石垣館の管理運営について】<br>・外国人を含めたPR強化<br>・運営上の課題や利用者ニーズなどをまとめておくこと                           | ・豊臣石垣の保存管理について検討する「豊臣石垣保存管理検討会議」の継続開催                          |
|                   |                          |                            | ②  | 金蔵に関連する徳川期遺構の整備    | 本丸地区   | —                                                                                                           | —                 | —                  | —                                                               |                                                                                            | —                                                              |
|                   |                          |                            | ③  | 馬印櫓、月見櫓間の雁木の整備     | 本丸地区   | —                                                                                                           | —                 | —                  | —                                                               |                                                                                            | —                                                              |
|                   |                          |                            | ④  | 金蔵の視認性の改善          | 本丸地区   | —                                                                                                           | —                 | —                  | —                                                               |                                                                                            | —                                                              |
|                   | 大阪城特有の価値・魅力を高める整備        | ii) 石垣等樹木の保存修復（危険等樹木の撤去含む） | ⑤  | 徳川期石垣の現況調査（公園課）    | 公園地区以外 | ・令和7年度までは高石垣を中心とした測量調査を実施した。                                                                                | —                 | 石垣カルテ作成・測量調査       | 石垣カルテ作成・測量調査                                                    | 【「石垣修復検討会議」で議論した主要な部分の共有】<br>・石垣調査の仕様や修復検討会議で議論した内容もこの会議で報告してもらうことで全体的に整合性のある整備を進めていく必要がある | ・R8年度実施内容に変更はないが、R9年度以降の事業内容の見直しを行った。<br>・継続事業となるため、資料4-2で詳細説明 |
|                   |                          |                            | ⑬  | 内堀北東部水鼓き石垣の修復（公園課） | 内堀地区   | R7.5に当該石垣の一部の落下を確認したことから、優先的に整備する必要があるが生じた。R2年度3次元データから変位がほぼないとみられるポイントが多いことから石垣そのものが沈下しているという状況ではないと考えられる。 |                   | ボーリング調査・発掘調査       | 解体設計・工事修復設計                                                     |                                                                                            | ・R8年度実施内容に変更はないが、R9年度以降の事業内容の見直しを行った。<br>・継続事業となるため、資料4-2で詳細説明 |
|                   |                          |                            |    |                    |        |                                                                                                             |                   |                    |                                                                 |                                                                                            |                                                                |
|                   |                          |                            | ⑥  | 一番櫓南雁木の修復（公園課）     | 二の丸南地区 | —                                                                                                           |                   | 方針確認               | 検討                                                              |                                                                                            | ・R8年度実施内容に変更はないが、R9年度以降の事業内容の見直しを行った。<br>・継続事業となるため、資料4-2で詳細説明 |
|                   |                          |                            |    |                    |        |                                                                                                             |                   |                    |                                                                 |                                                                                            |                                                                |
|                   |                          |                            | ⑦  | 玉造門西雁木の修復（公園課）     | 二の丸南地区 | —                                                                                                           |                   | —                  | —                                                               |                                                                                            | 検討                                                             |
| ⑧                 | 重要文化財等の消火設備の改修           | 本丸地区・二の丸南地区・二の丸北地区・二の丸西地区  | 完了 | —                  | —      | —                                                                                                           | —                 |                    |                                                                 |                                                                                            |                                                                |
| 2) 近代以降の歴史資産の保存活用 |                          |                            | ⑨  | 旧第四師団司令部庁舎の改修（公園課） | 本丸地区   | 計画通り                                                                                                        | —                 | —                  | 【改修内容について】<br>・改修内容については、基本的には評価する<br>・塗装や接着剤はオリジナル部分への影響が懸念される | —                                                                                          |                                                                |

| 整備目的                 |            |   | 整備内容                    | 地区区分            | 進捗状況・所見（R7年度末）                                                                                                                                                                                               | 課題点等                                                                        | R8年度(2026) | R9年度(2027) | 第2回会議意見                                                                                                                                                                                           | 今後予定・所見※今年度協議すべき課題追記                                     |
|----------------------|------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (2) 来訪者が安全かつ快適に利用できる | 1) 安全性の向上  | ⑩ | 通信環境の整備（観光課）            | 本丸地区            | ・通信環境改善の対象エリアや設備機器の規模を見直し、既存建物を活かした設備設置等、より史跡景観配慮した整備とした。<br>・現状変更承認と工事占用許可を得て、2月より着手し施工中。<br>・令和8年2月に整備が完了し、1キャリアの電波発信。                                                                                     | —                                                                           | —          | —          | 【通信環境の充実】<br>・景観への影響を抑えつつアンテナを設置し、通信環境を改善できている                                                                                                                                                    | ・他2キャリアの開通を引き続き進めていく。<br>・スケジュールの提示                      |
|                      | 2) 快適性の向上  | ⑪ | トイレの改修                  | 全域              | 完了                                                                                                                                                                                                           | —                                                                           | —          | —          |                                                                                                                                                                                                   | —                                                        |
|                      |            | ⑫ | 桃園・梅林の園路整備              | 外堀外縁北東地区・二の丸東地区 | 完了                                                                                                                                                                                                           | —                                                                           | —          | —          |                                                                                                                                                                                                   | —                                                        |
|                      | 3) 夜間景観の整備 | ⑬ | 大阪城ホール前の照明設備改修          | 公園地区            | 完了                                                                                                                                                                                                           | —                                                                           | —          | —          |                                                                                                                                                                                                   | —                                                        |
|                      |            | ⑭ | 極楽橋ライトアップ（観光課）          | 内堀地区            | ・整備内容、仕様について検討中。<br>・色温度3000K相当の単一色、石垣対岸からの投光器による照射で石垣から反射する光で橋の歩行面を照らすことなどを基本方針とする。                                                                                                                         | ・相当の整備コストが見込まれるため、規模や仕様など見直しが必要<br>・実地調査の結果、橋の歩行面に十分な光が届かなければ、スポットライトも検討する。 | 検討・整備      |            | 【極楽橋など主要ルートのライトアップの考え方について】<br>・ライトアップの考え方に異論はない。<br>・照度を補完するスポットライトなどの照明を別途設置する場合は再度メンバーに諮らねたい<br>・今後の公園灯の更新時に色温度、照度、調光、施設景観を損なわない等検討する必要がある<br>・設置後も、社会状況、ライトアップ技術、人々の行動様式などの視点からライトアップ効果の検証が必要 | ・課題を踏まえ整備内容、仕様、極楽橋の石垣から反射する光で、橋の歩行面を照らす基本方針の転換も含めて検討を続ける |
| (3) 効果的な情報発信         |            | ⑮ | 大阪城の見どころ解説資料の作成         | 全域              | ・大阪城公園のホームページに園内の見どころ情報や指定文化財をめぐるルートについて解説とともに作成し掲載公開を実施。<br>・「大阪城ゆかりの地マップ」として、①大坂の陣編、②幕末・維新編、③大阪城の石垣編の3種を作成し、大坂城とその周辺のゆかりの場所やその歴史について解説したリーフレットを作成し発行。（HPにも掲載）<br>・大阪城 豊臣石垣館の開館に合わせ、案内リーフレットを作成し発行。（HPにも掲載） | —                                                                           | —          | —          |                                                                                                                                                                                                   | —                                                        |
|                      |            | ⑯ | 特別史跡標識・説明板の設置（観光課、公園課）  | 外堀外縁南西地区        | ・史跡標識、説明板の設置場所、基本的な仕様の検討                                                                                                                                                                                     | ・詳細仕様、整備スケジュール、各部署の役割分担の検討                                                  | 検討         | 調査・検討      | 【園内全体のサイン計画の必要性】<br>・既存サインの整理に向け、まず動線を確認したうえで、サイン設置場所の妥当性、デザインコードの統一などの園内全体のサイン計画が必要<br>・専門家の意見を聴取しながら進められたい                                                                                      | ・整備イメージ案を作成し整備内容を推進会議で検討していく。<br>・継続事業となるため、資料4-2で詳細説明   |
|                      |            | ⑰ | 史跡等解説における多言語化・デジタル技術の活用 | 全域              | ・園内の史跡解説板に、多言語に対応する二次元コードを掲出。関心が高い重要文化財建造物の解説板に二次元コードを掲出し、動画による解説サービスを提供。（史跡スポット20か所、その他スポット18か所）<br>・大阪城天守閣所蔵品の魅力や大阪城の歴史を伝える高精細の映像コンテンツを作成し映像設備の改修を実施。                                                      | —                                                                           | —          | —          |                                                                                                                                                                                                   | —                                                        |
|                      |            | ⑱ | 大手口における園内情報の発信（観光課）     | 外堀外縁南西地区        | ・園内案内所に必要な機能を整理した上で、場所や仕様を検討していく。設置場所は大阪城の景観を害さない場所を選定する。                                                                                                                                                    | —                                                                           | 検討・整備      |            | 【設置場所・サービス内容について】<br>・ワーキングで専門家からの意見も聞くようにしてはどうか<br>・他の城跡の案内施設の調査も必要ではないか<br>・案内所設置は必要であるが、サービス面の整理も必要である                                                                                         | ・園内案内所の機能、場所、仕様等を整理し、推進会議で検討していく。<br>・設置場所の決定            |

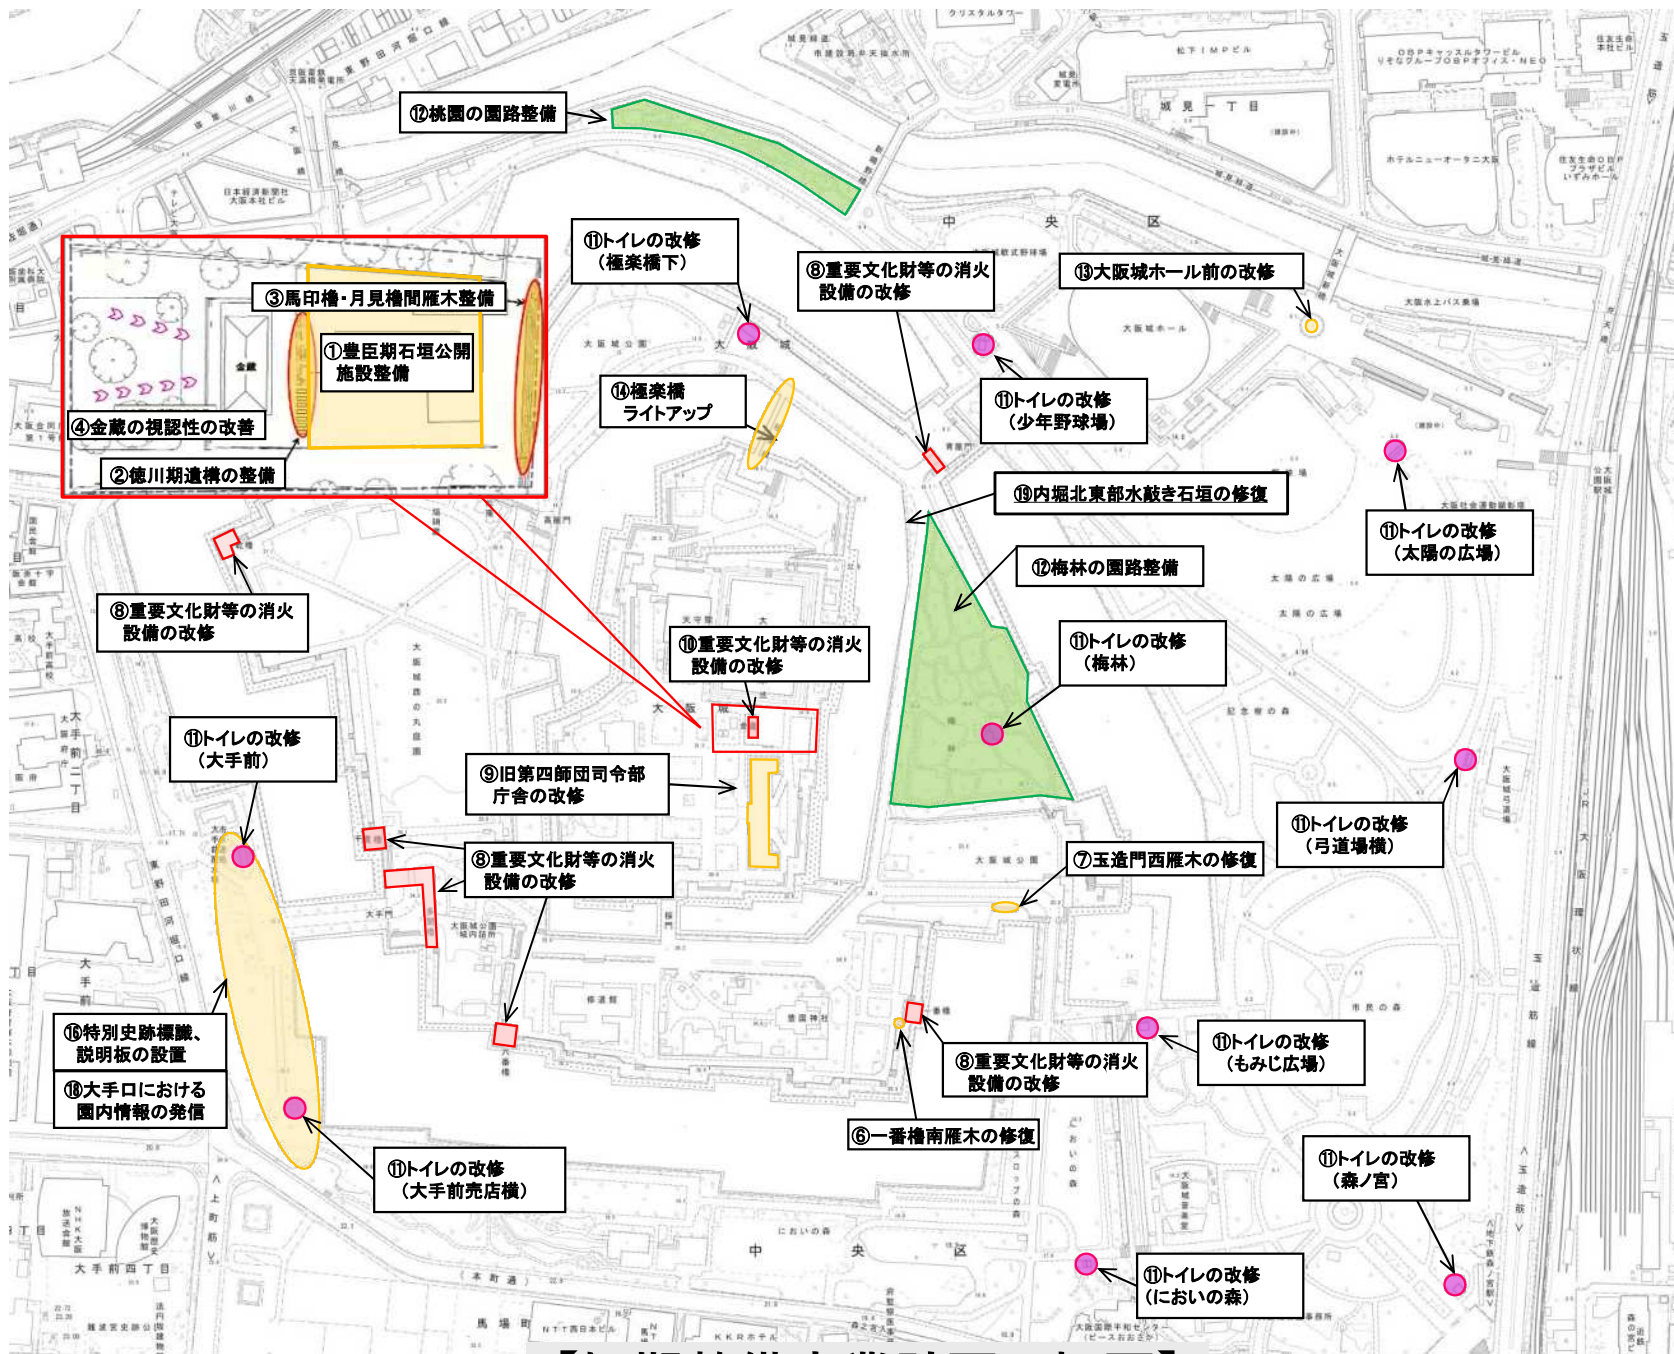

## 【短期整備事業計画の概要】
