

令和 6 年度第 1 回（第 1 4 回） 大阪市大規模事業リスク管理会議

議題 リスク管理の改善にかかる取組について

- ・ リスク顕在化事例等を踏まえた他事業への影響確認


第13回会議での委員意見

- ・令和4年度に淀川左岸線（2期）の事業費について、地盤変状に伴う地盤改良工法の変更と物価高騰の話をさせていただいた。
- ・（淀川左岸線（2期）の）物価高騰の際は8%としたが、その8%を出した時に、万博の会場建設費は大丈夫かという部分をどれだけチェックしていたか

<課題>一つの事業でリスクが顕在化した（する恐れ）際、他事業をどうチェックするか

<方針案>リスク顕在化（の恐れ）や社会情勢等の新たなリスク変化について、事務局から各事業所管所属に影響の有無等を確認し、必要に応じて会議で報告を行う

【会議前】

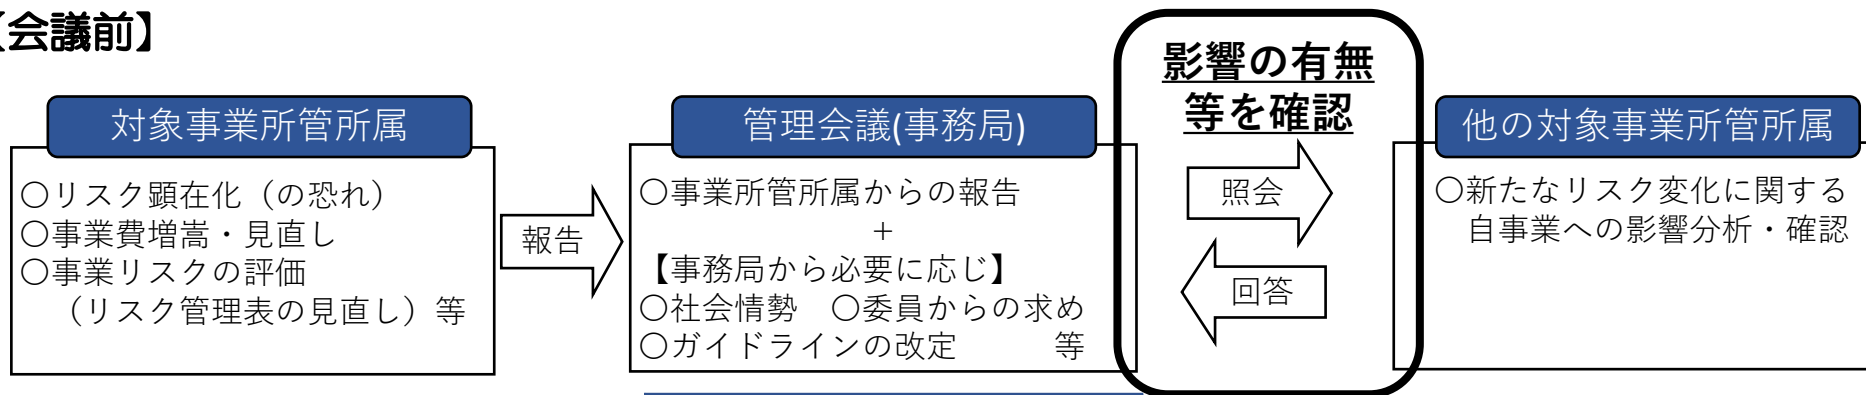

【会議時】

