

入札不調に関するアンケート調査結果について

近年、大阪市が行う工事請負契約の入札において不調（入札者なし）が増加傾向にあることから、その原因を把握し、より効果的な入札不調対策の検討資料とするため、入札不調件数が多い希望種目（02建築工事、07橋梁・鋼管工事、09諸設備工事）に登録を行っている方を対象に、アンケートを実施しました。

お忙しい中、ご協力いただき誠にありがとうございました。


アンケート概要

- a) アンケート調査の方法・・・大阪市電子申請・オンラインアンケートシステムを活用
 - b) アンケート調査実施期間・・・平成26年6月27日（金）から平成26年7月31日（木）まで
 - c) 調査客体・・・・・・・・・・大阪市入札参加有資格者のうち、希望種目（02建築工事、07橋梁・鋼管工事、09諸設備工事）に登録している事業者（対象事業者1,228者）
 - d) アンケート回答者数・・・・・・・・120名
 - e) アンケート結果取りまとめ・・・下記のとおり
- なお、一部設問にのみ回答された方も1人と集計しているため、各設問の回答者数の合計と「d）アンケート回答者数」とは一致しません。

アンケート結果（※主な項目の結果）

1 回答者の属性について

1 現在登録している希望種目について教えてください




希望種目の内訳	
02建築工事	59
07橋梁・鋼管工事	40
09諸設備工事	64
合計（延べ数）	163

回答者数（実数）	120
----------	-----

■【大阪市への入札参加を見合わせる理由等】

■Q1：大阪市が平成25年度（2013.4～2014.3）にかけて発注した工事の入札において、入札参加資格を有する案件で入札参加を見合わせたこと、又は再入札で入札辞退をしたことがありますか。

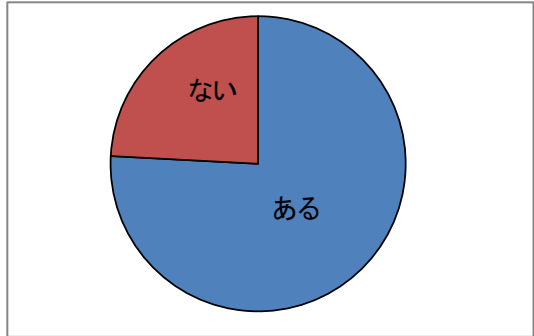


ある	91
ない	29

■ Q2：Q1で「1. ある」と答えた方に伺います。大阪市の入札参加を見合わせたり辞退した理由について、次の(1)～(30)のそれぞれの項目ごとに、その度合いとしてあてはまるものを選んでください。

	深刻な課題	課題	少し懸念があった	特に問題なし
(1) 資材価格の高騰				
(2) 人件費の高騰				
(3) 技術者（監理技術者・主任技術者等）の不足				
(4) 職人・作業員の不足				
(5) 下請け企業が見つからないため				
(6) 生コン、鋼材などの資材が調達できないため				
(7) ダンプ車・重機等が調達できないため				
(8) 建具、設備機器が品薄で、納期がこれまで以上に必要なため				
(9) 工事内容の専門性が高いため				
(10) 工事内容が困難で、施工条件が悪いため				
(11) 工期が短かく、工期内に適正な履行完了が見込めないため				
(12) 工期が長く、技術者を配置できないため				
(13) 規模の割に工期が長い				
(14) 施工場所が複数あり移動等で手間がかかるため				
(15) 営業所又は資材置き場から施工場所が遠方であるため				
(16) 発注ロットが小さく、利益が少ないため				
(17) 工事に関する手続等が煩雑で手間がかかるため				
(18) 発注時期や工期が重複・集中したため				
(19) 施工実績に関する参加条件を満たさないため				
(20) 技術者に関する参加条件を満たさないため				
(21) 民間・他自治体発注の工事を優先したため				
(22) 積算できる技術者（担当者）が不足しているため				
(23) 他者から入札への参加を見合わせるように勧められたため				
(24) 積算（官積算）が実勢価格と乖離しており、利益が見込めないため				
(25) 大阪市の過去の入札結果から見て、落札できる金額（率）では利益が見込めないと判断したため				
(26) 予定価格が事後公表となったため				
(27) 入札公告などの入札情報が入手しにくい				
(28) 公告期間が短く、入札を知らなかったため				
(29) 設計図書・仕様書に、積算するための情報が十分に記載されていないため				
(30) 工事費内訳書の数量が公開されていないため				
(31) その他				

■ 【入札不調対策について】

■ Q3：入札不調や円滑な施工確保の対策の重要性についてお伺いします。次の(1)～(23)のそれぞれの項目ごとに、その度合いとしてあてはまるものを選んでください。

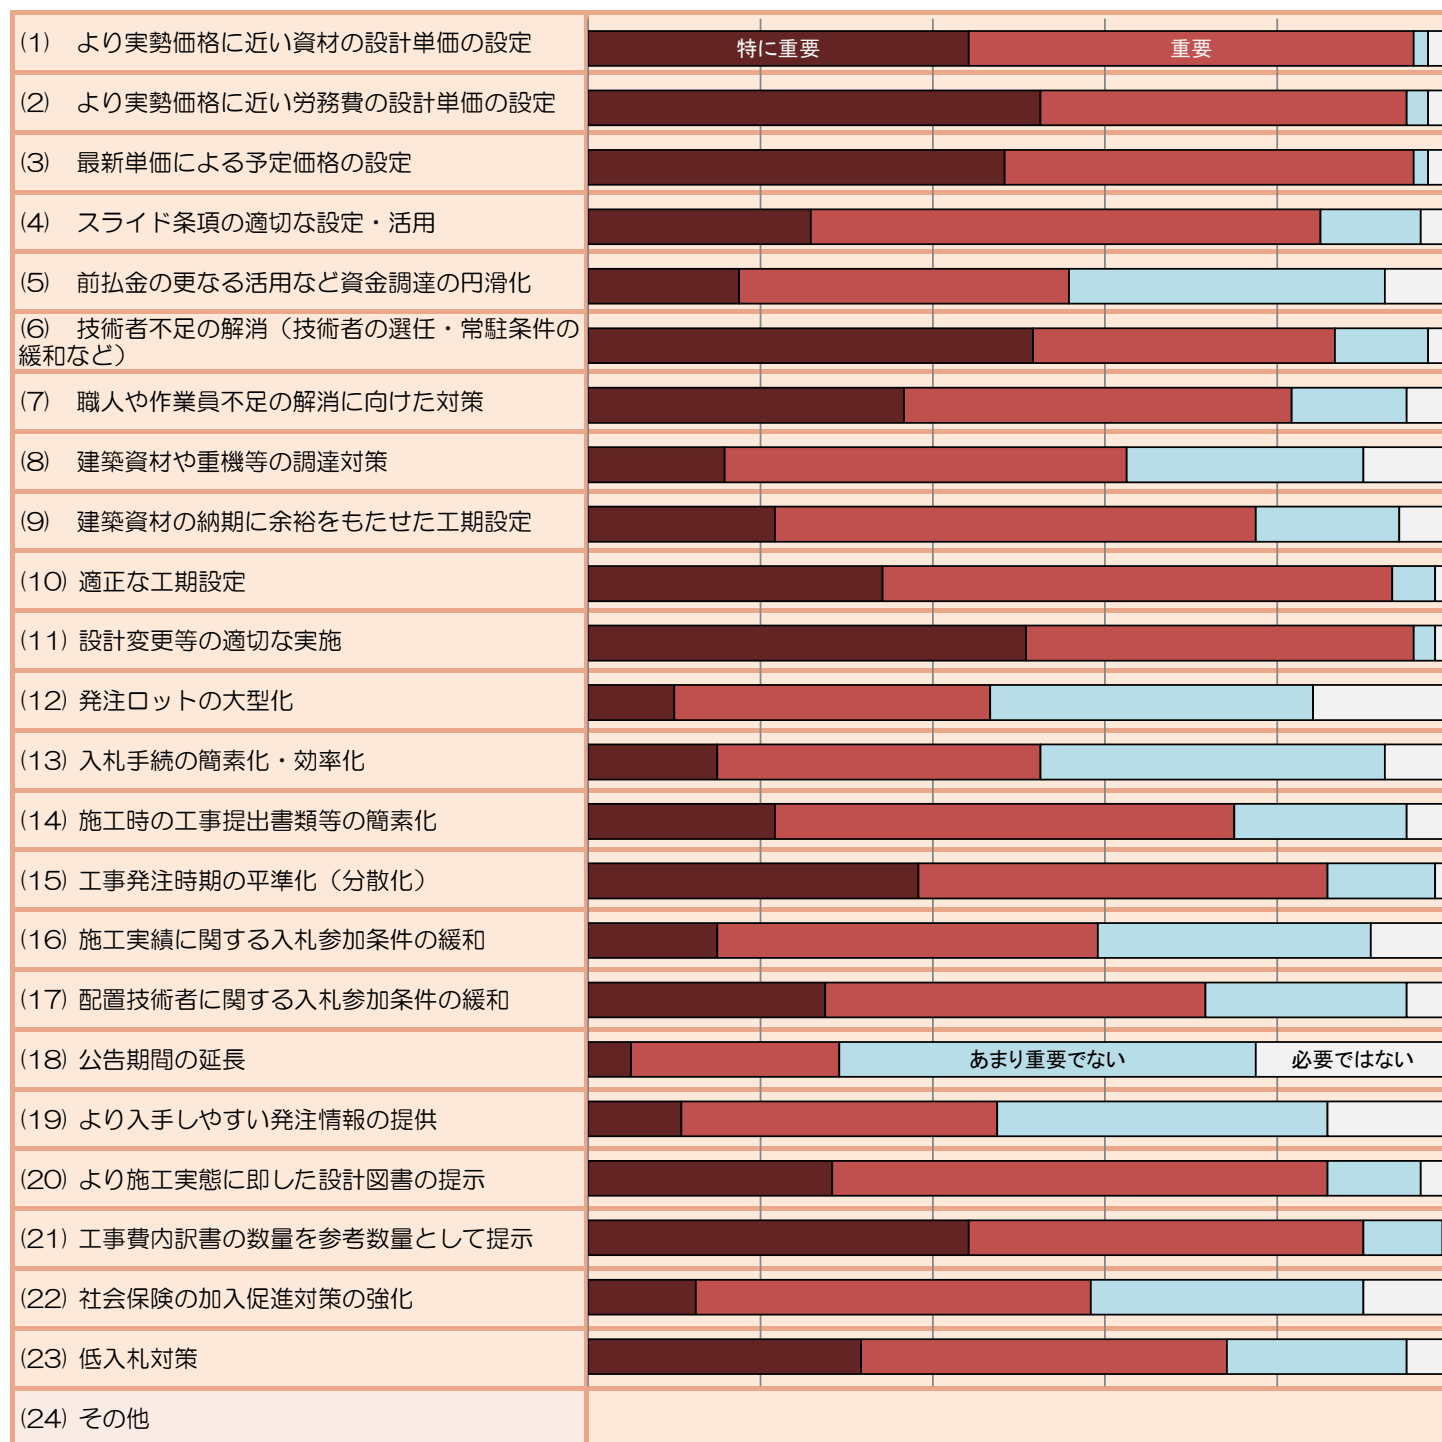


■ 【経営状況】

■ Q4：官庁発注、民間発注に関わらず、貴社が直面している経営上の問題点について、次の(1)～(15)のそれぞれの項目ごとに、その度合いとしてあてはまるものを選んでください。

(1) 競争激化	深刻な問題あり	多少の問題あり		
(2) 人手不足				
(3) 受注の減少				
(4) 若者の入職者減少				
(5) 従業員の高齢化				
(6) 熟練工不足				
(7) 下請の確保難				
(8) 資材単価の上昇				
(9) 下請代金の上昇				
(10) 諸経費の増加				
(11) 人件費の上昇				
(12) 資材の確保難				
(13) 資金の借入が困難				
(14) 金利負担の増加				
(15) 代金回収難		少し懸念がある	特に問題なし	
(16) その他				


【その他】

■ 国と大阪市の同種同規模工事の入札時期が重なった時は、どちらの入札を優先していますか。

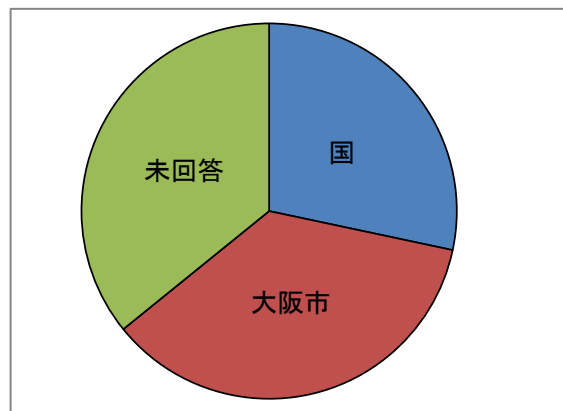


発注者名	
国	34
大阪市	43
未回答	43
合計	120

■ 国の入札を優先した理由（複数回答）

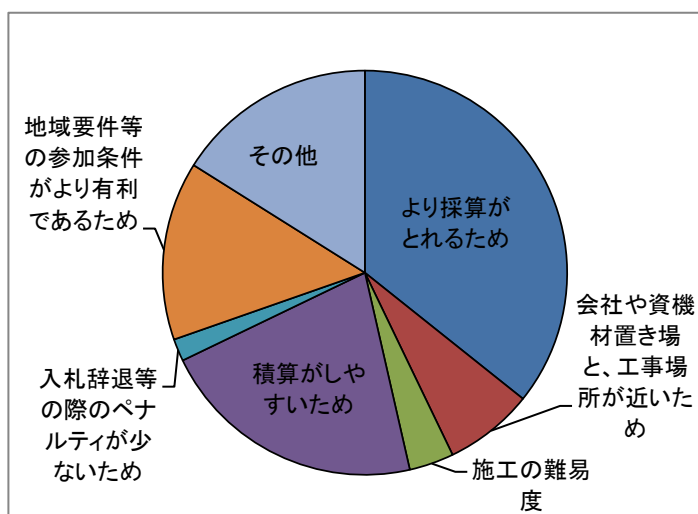


理由	
より採算がとれるため	20
会社や資機材置き場と、工事場所が近い	4
施工の難易度	2
積算がしやすい	12
入札辞退等の際のペナルティが少ない	1
地域要件等の参加条件がより有利であるため	8
その他	9
合計（延べ数）	56

■ 大阪市の入札を優先した理由（複数回答）

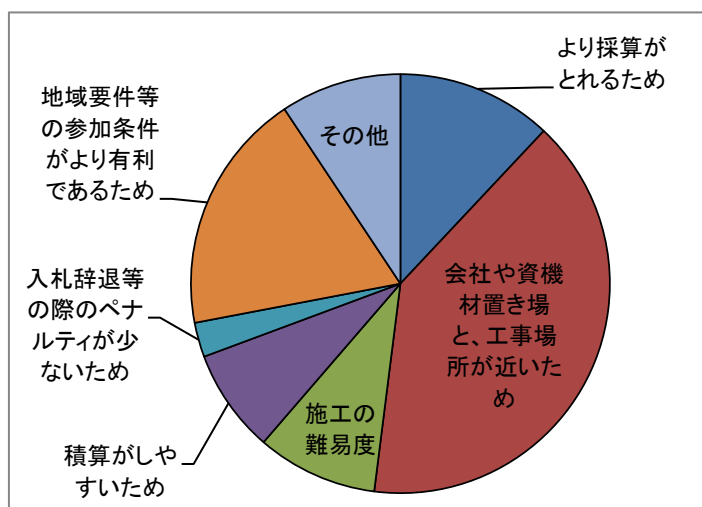


理由	
より採算がとれるため	9
会社や資機材置き場と、工事場所が近い	30
施工の難易度	7
積算がしやすい	6
入札辞退等の際のペナルティが少ない	2
地域要件等の参加条件がより有利であるため	14
その他	7
合計（延べ数）	75

■ 大阪府と大阪市の同種同規模工事の入札時期が重なった時は、どちらの入札を優先していますか。

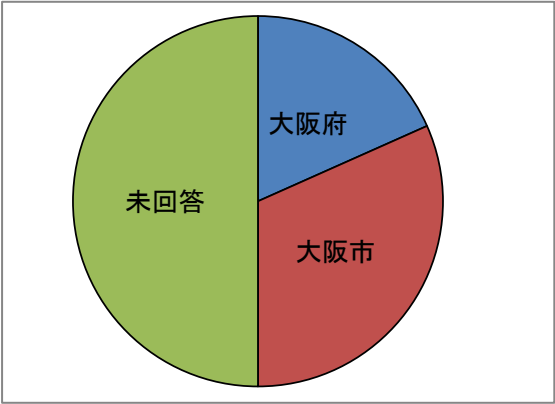


発注者名	
大阪府	22
大阪市	38
未回答	60
合計	120

■ 大阪府の入札を優先した理由（複数回答）

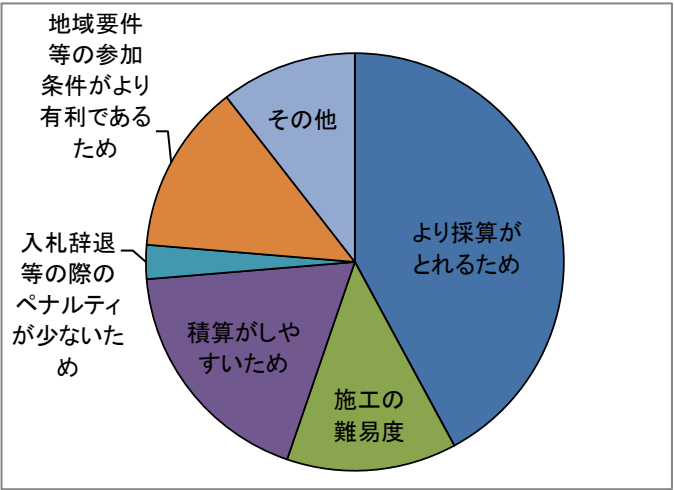

理由	
より採算がとれるため	16
会社や資機材置き場と工事場所が近いため	0
施工の難易度	5
積算がしやすいため	7
入札辞退等の際のペナルティが少ないため	1
地域要件等の参加条件がより有利であるため	5
その他	4
合計（延べ数）	38

■ 大阪市の入札を優先した理由（複数回答）

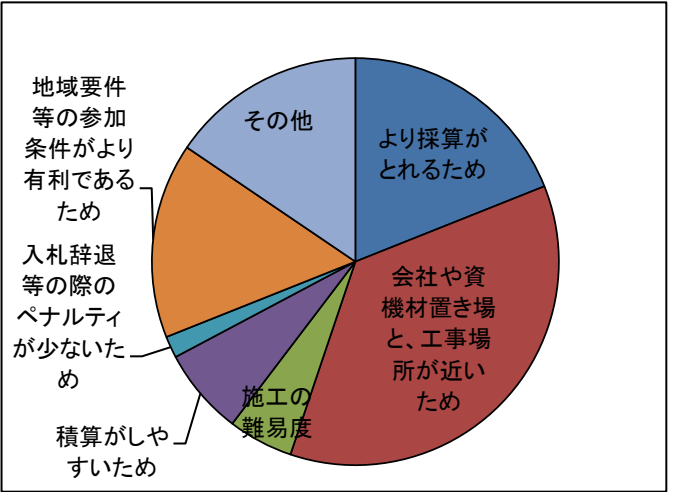

理由	
より採算がとれるため	11
会社や資機材置き場と工事場所が近いため	21
施工の難易度	3
積算がしやすいため	4
入札辞退等の際のペナルティが少ないため	1
地域要件等の参加条件がより有利であるため	9
その他	9
合計（延べ数）	58
